





Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr M F	mayo P M F	junio P M F	julio P M F	agosto P M F	septien P M F	octubre P M F	no P
1			PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DEL ISA	145 días	lun 04/29/19	sáb 09/21/19								
2			PRELIMINARES	36 días	lun 04/29/19	mar 06/04/19								
3			Bono de garantía, cumplimiento y pólizas	5 días	lun 04/29/19	sáb 05/04/19								
4			Diseños	31 días	sáb 05/04/19	mar 06/04/19								
5			Diseño Estructural	7 días	sáb 05/04/19	sáb 05/11/19								
6			Planta arquitectonica	7 días	sáb 05/11/19	sáb 05/18/19								
7			Diseño Electrico	7 días	sáb 05/18/19	sáb 05/25/19								
8			Diseño Hidraulico	7 días	sáb 05/18/19	sáb 05/25/19								
9			Diseño Sistemas especiales	7 días	sáb 05/18/19	sáb 05/25/19								
10			Permiso de construcción, salud, ocupación,bomberos,	10 días	sáb 05/25/19	mar 06/04/19								
11			ORDEN DE PROCEDER	0 días	mar 06/04/19	mar 06/04/19								
12			AGENCIA	109 días	mar 06/04/19	sáb 09/21/19								
13			Letrero	7 días	mar 06/04/19	mar 06/11/19								
14			ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	15 días	mar 06/04/19	mié 06/19/19								
15			FUNDACIONES	47 días	mar 06/04/19	dom 07/21/19								
16			Excavación	3 días	mar 06/04/19	vie 06/07/19								
17			Base corrido de hormigón reforzado # 4	8 días	vie 06/07/19	sáb 06/15/19								
18			Bloques de 6" rellenos	8 días	lun 06/10/19	mar 06/18/19								
19			Relleno de material compacto	4 días	mar 06/18/19	sáb 06/22/19								
20			Piso de concreto de 0.10 de espesor y acera de 3000	6 días	sáb 06/22/19	vie 06/28/19								
21			Columnas de Hormigón (0,1*0,3) 3000 PSI	5 días	vie 06/28/19	mié 07/03/19								



Proyecto: PNC-LV-004006-AGE	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

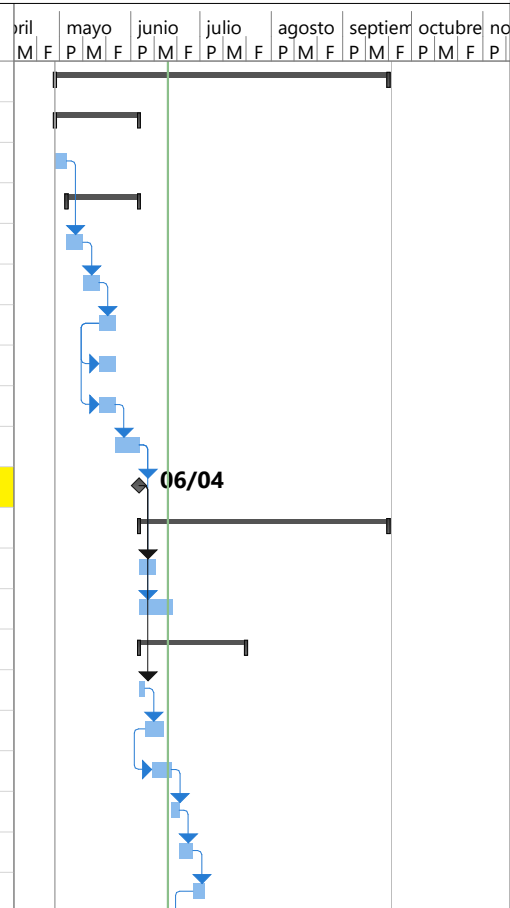


















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart														
							abr	may	junio	julio	agosto	septiem	octubre	nov							
							M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P
22			Columnas de Hormigón (0,3*0,3) 3000 PSI	5 días	vie 06/28/19	mié 07/03/19															
23			Paredes, mojinetes y retáqueo con bloques de 4"	4 días	mié 07/03/19	dom 07/07/19															
24			Mochetas de puertas y ventanas	3 días	dom 07/07/19	mié 07/10/19															
25			Vigas de concerto	3 días	mié 07/10/19	sáb 07/13/19															
26			Repello liso	8 días	sáb 07/13/19	dom 07/21/19															
27			Repello Rustico	8 días	sáb 07/13/19	dom 07/21/19															
28			CUBIERTA	10 días	dom 07/21/19	mié 07/31/19															
29			Estructura y cubierta de tech con zinc trapezoidal. Cal 26	10 días	dom 07/21/19	mié 07/31/19															
30			VENTANAS	8 días	mié 07/31/19	jue 08/08/19															
31			Suministro e instalación de ventana de celosía de vidrios	8 días	mié 07/31/19	jue 08/08/19															
32			Ventanas de ornamentales	8 días	mié 07/31/19	jue 08/08/19															
33			Verjas tipo francesa según diseño	8 días	mié 07/31/19	jue 08/08/19															
34			PUERTAS	6 días	mié 07/31/19	mar 08/06/19															
35			Suministro e instalación de puerta sólida con sus paneles	6 días	mié 07/31/19	mar 08/06/19															
36			Suministro e instalación de puerta de plywood de 1/4	6 días	mié 07/31/19	mar 08/06/19															
37			Suministro e instalación de puerta de metal. P 3	6 días	mié 07/31/19	mar 08/06/19															
38			Suministro e instalación de puerta de metal. P 4	6 días	mié 07/31/19	mar 08/06/19															
39			Construcción de macetero ver detalle	6 días	mié 07/31/19	mar 08/06/19															
40			ACABADOS	27 días	mié 07/31/19	mar 08/27/19															
41			Baldosas Prepulidas	6 días	mié 07/31/19	mar 08/06/19															
42			Baldosas Antiresbalantes	6 días	mar 08/06/19	lun 08/12/19															



Proyecto: PNC-LV-004006-AGE	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin														
							abr	mayo	junio	julio	agosto	septiem	octubre	no						
							M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P		
43			Azulejos	6 días	lun 08/12/19	dom 08/18/19														
44			Zócalo	3 días	dom 08/18/19	mié 08/21/19														
45			Corniza sobre pared de lafachada	3 días	mié 08/21/19	sáb 08/24/19														
46			Solapa 6" x 6" cal. 24	3 días	sáb 08/24/19	mar 08/27/19														
47			CIELO RASO	25 días	mar 08/06/19	sáb 08/31/19														
48			Láminas de Skyline de 2' x 2' con entramado de aluminio	8 días	mar 08/06/19	mié 08/14/19														
49			Sobre de concreto de 0.60 x 2.45 revestido de de	4 días	mar 08/27/19	sáb 08/31/19														
50			PINTURA	16 días	mar 08/27/19	jue 09/12/19														
51			Pintura base	8 días	mar 08/27/19	mié 09/04/19														
52			Pintura acrílica antihongos	8 días	mié 09/04/19	jue 09/12/19														
53			ASTA DE BANDERAS	12 días	dom 07/21/19	vie 08/02/19														
54			ELECTRICIDAD	5 días	jue 09/12/19	mar 09/17/19														
55			Suministro en instalación de A/C	5 días	jue 09/12/19	mar 09/17/19														
56			PLOMERIA	20 días	mié 08/21/19	mar 09/10/19														
57			CERCA PERIMETRAL	4 días	mar 09/17/19	sáb 09/21/19														
58			ENTREGA DEL PROYECTO	0 días	sáb 09/21/19	sáb 09/21/19												09/21		

09/21

Proyecto: PNC-LV-004006-AGE

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
