




DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PEDASÍ-LOS ASIENTOS-CAÑAS

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	enero 2019		junio 2019			noviembre 2019			abril 2020			septiembre 2020			febrero						
						1 enero 24	28	4	8	13	17	22	26	30	4	9	13	17	23	27	1	6	10	14	19	23
1	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PEDASÍ-LOS ASIENTOS-CAÑAS	540 días	vie 19/7/19	vie 8/1/21																						
2	PRELIMINARES	150 días	vie 19/7/19	lun 16/12/19																						
3	Casetas Tipo D	45 días	vie 1/11/19	lun 16/12/19	5CC+5 días																					
4	Topografía	25 días	vie 19/7/19	mar 13/8/19																						
5	Movilización y Traslado	5 días	dom 27/10/19	vie 1/11/19	7																					
6	Diseño del Camino	60 días	mar 13/8/19	sáb 12/10/19	4																					
7	Permiso de Construcción	15 días	sáb 12/10/19	dom 27/10/19	6																					
8	Polizas y Fianzas	30 días	mar 13/8/19	jue 12/9/19	6CC																					
9	Estudio de Impacto Ambiental Tipo II	60 días	jue 15/8/19	lun 14/10/19	8CC+2 días																					
10	LIMPIEZA Y DESRAIGUE O DESMONTE	45 días	vie 1/11/19	lun 16/12/19																						
11	Limpieza y Desraigue	45 días	vie 1/11/19	lun 16/12/19	24CC+5 días																					
12	Remoción de Árboles	15 días	lun 11/11/19	mar 26/11/19	11CC+10 días																					
13	DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN Y REUBICACIÓN DE ESTRUCTURAS Y OBSTRUCCIONES	75 días	dom 1/12/19	vie 14/2/20																						
14	Remoción de tuberías (incluyendo cabezales, de existir) de:	25 días	dom 1/12/19	jue 26/12/19	11FC-15 días																					
15	Remoción de Cuneta Pavimentada	40 días	jue 26/12/19	mar 4/2/20	14																					
16	Remoción de Barrandas de Protección	20 días	sáb 25/1/20	vie 14/2/20	15FC-10 días																					
17	DRENAJES TUBULARES	29 días	sáb 21/12/19	dom 19/1/20																						
18	Tubería de Hormigón Ref. de 0.60m. De Ø	20 días	lun 23/12/19	dom 12/1/20	22CC+2 días																					
19	Tubería de Hormigón Ref. de 0.75m. De Ø	15 días	lun 23/12/19	mar 7/1/20	18CC																					
20	Tubería de Hormigón Ref. de 0.90m. De Ø	12 días	mar 7/1/20	dom 19/1/20	19																					
21	Tubería de Hormigón Ref. de 1.20m. De Ø	10 días	mar 7/1/20	vie 17/1/20	20CC																					
22	Material para lecho	15 días	sáb 21/12/19	dom 5/1/20	14FC-5 días																					
23	EXCAVACIÓN	103 días	dom 27/10/19	vie 7/2/20																						
24	Excavación de Corte	45 días	dom 27/10/19	mié 11/12/19	7																					
25	Excavación para Relleno	35 días	mié 11/12/19	mié 15/1/20	24																					
26	Excavación de Desperdicio	23 días	mié 15/1/20	vie 7/2/20	25																					




DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PEDASÍ-LOS ASIENTOS-CAÑAS

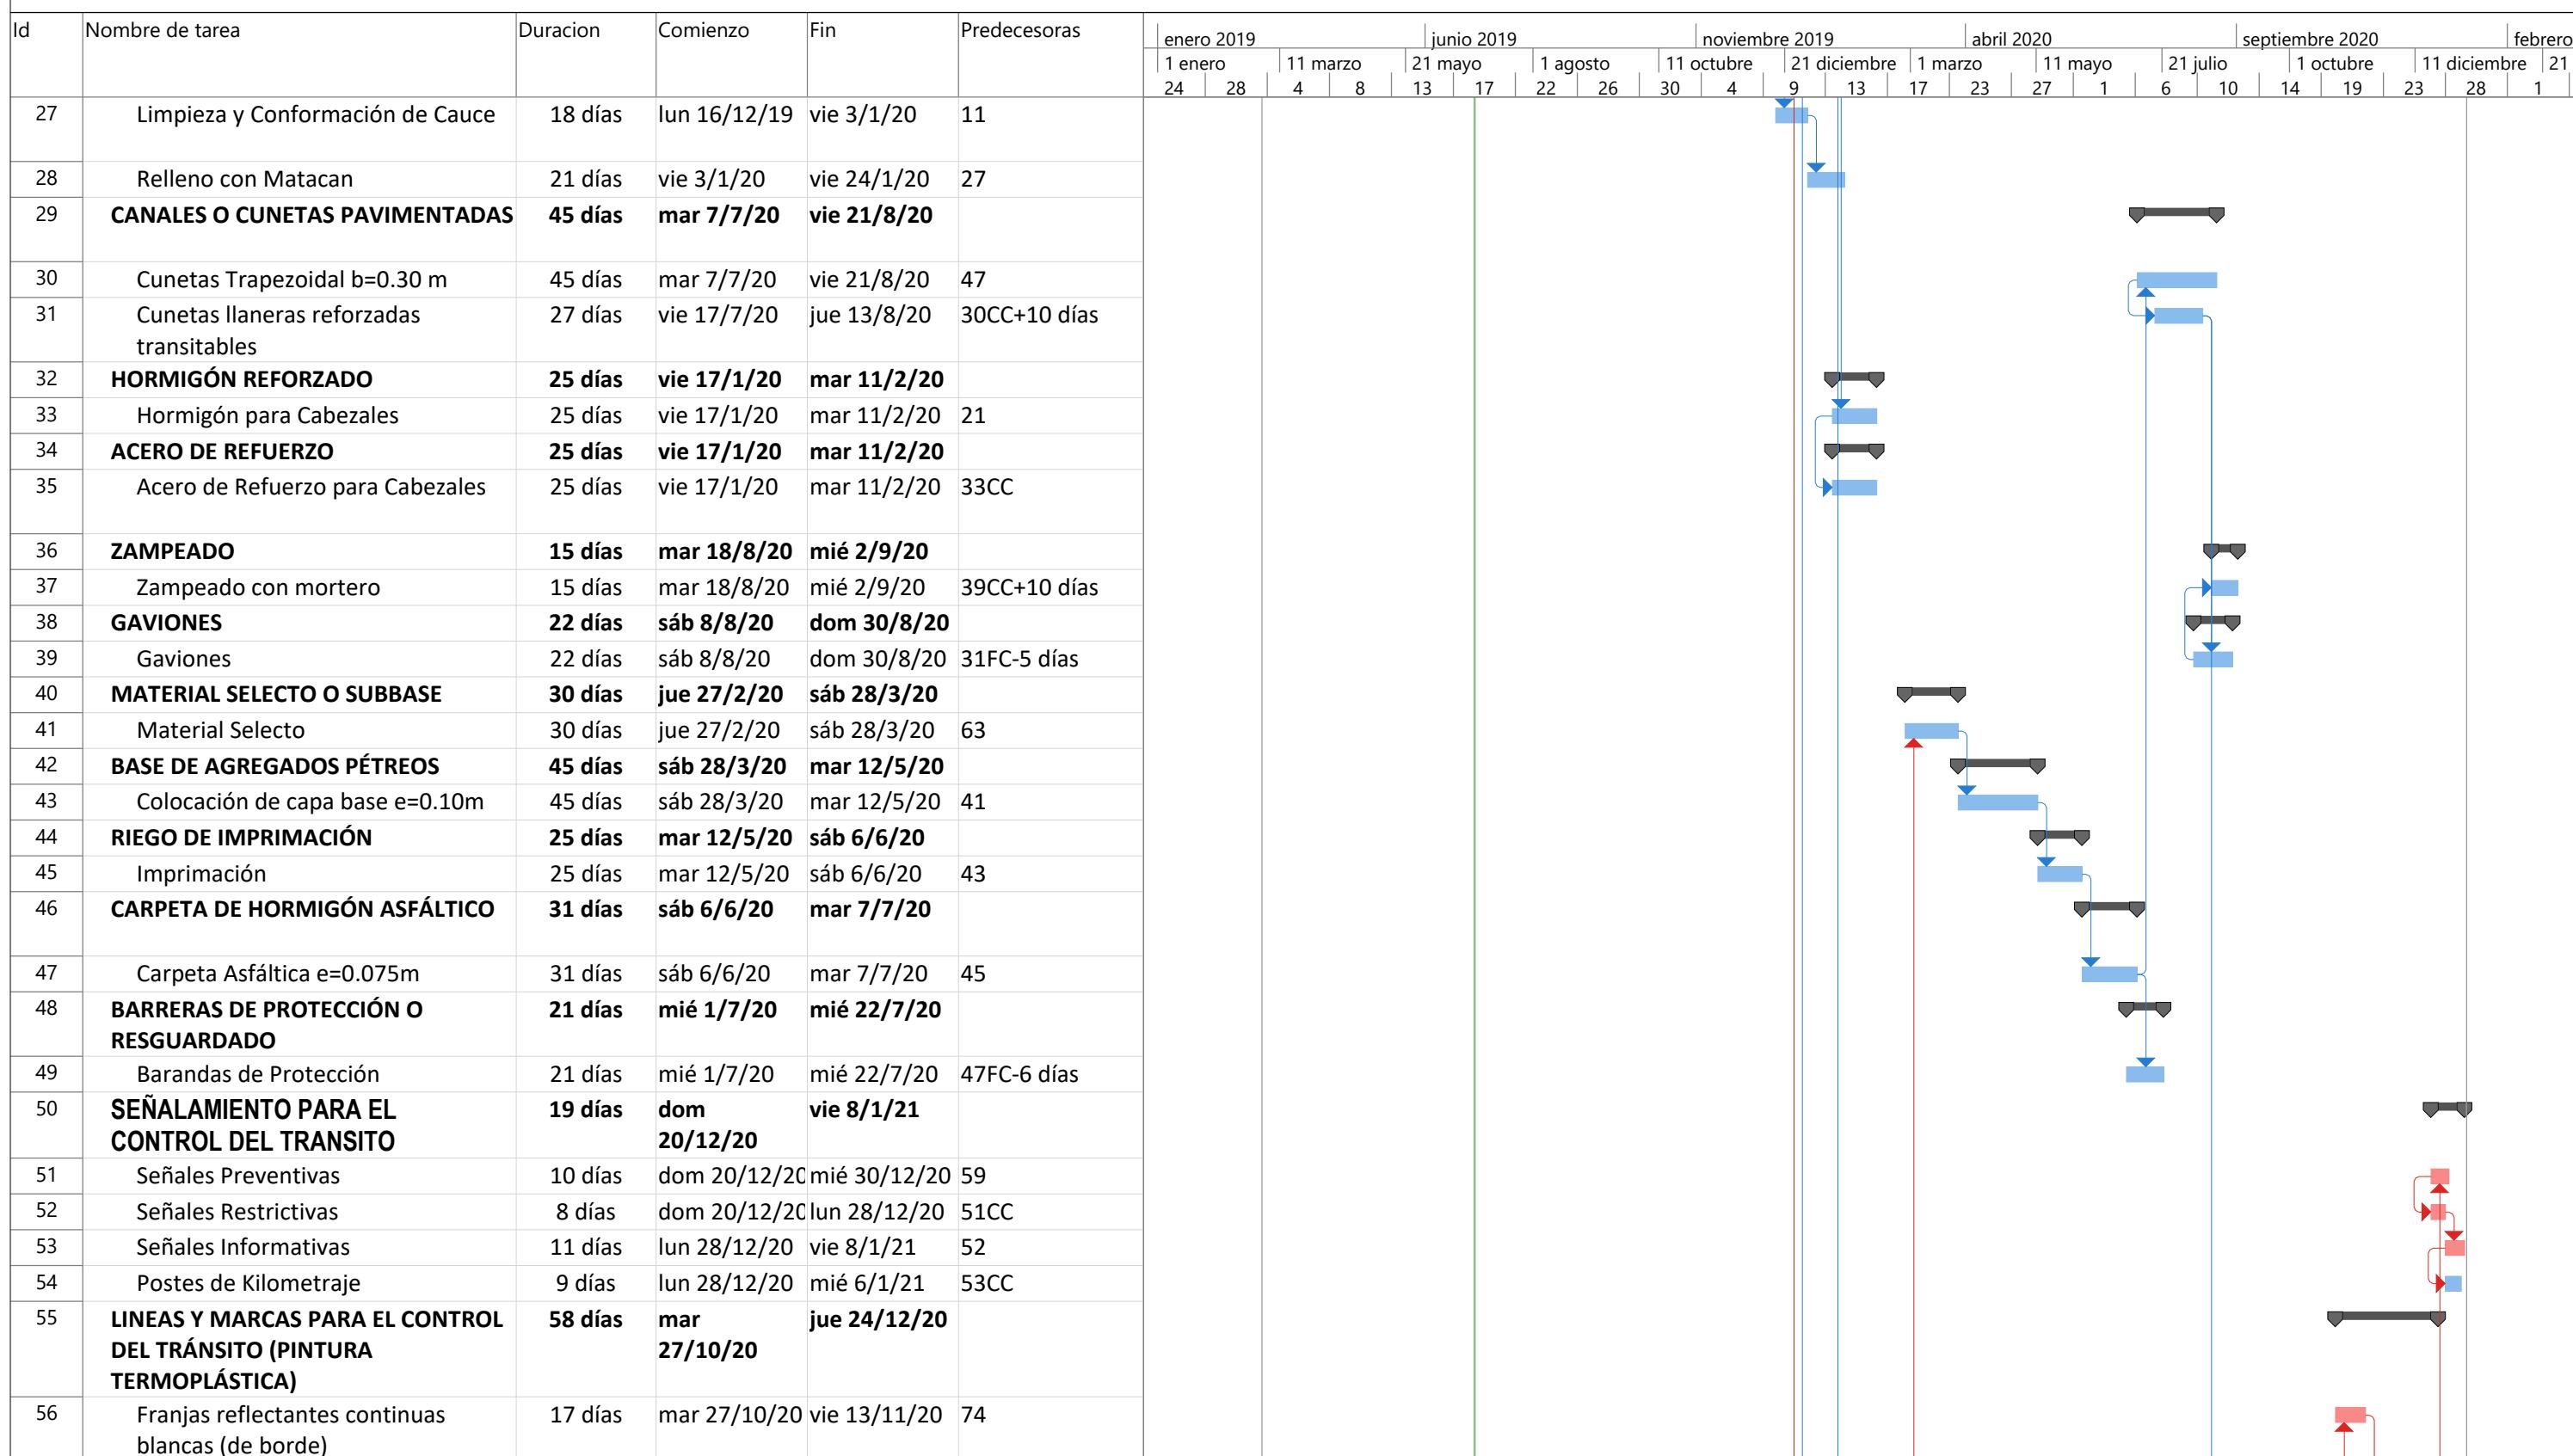

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PEDASÍ-LOS ASIENTOS-CAÑAS

Id	Nombre de tarea	Duracion	Comienzo	Fin	Predecesoras	enero 2019		junio 2019			noviembre 2019			abril 2020			septiembre 2020			febrero							
						1 enero 24	28	4	8	13	17	22	26	30	4	9	13	17	23	1	27	1	6	10	14	19	23
57	Franjas Reflectantes Continuas Amarilla	15 días	vie 13/11/20	sáb 28/11/20	56																						
58	Franjas Reflectantes Segmentada Amarilla	13 días	sáb 28/11/20	vie 11/12/20	57																						
59	Franjas Reflectantes para Cruce Peatonal	9 días	vie 11/12/20	dom 20/12/20	58																						
60	Marcadores Reflexivos Tipo Tachuela o Ojo de Gato	8 días	mié 16/12/20	jue 24/12/20	59CC+5 días																						
61	ESCARIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALZADA	53 días	dom 5/1/20	jue 27/2/20																							
62	Escarificación de Calzada	33 días	dom 5/1/20	vie 7/2/20	25FC-10 días																						
63	Conformación de Calzada	20 días	vie 7/2/20	jue 27/2/20	62																						
64	PASOS ELEVADOS PEATONALES, CAJONES Y PUENTES	243 días	jue 27/2/20	mar 27/10/20																							
65	SECCION B - ALCANTARILLAS DE CAJONES	243 días	jue 27/2/20	mar 27/10/20																							
66	Alcantarilla de Cajon de	41 días	jue 27/2/20	mié 8/4/20	63																						
67	Alcantarilla de Cajon de	41 días	dom 8/3/20	sáb 18/4/20	66CC+10 días																						
68	Alcantarilla de Cajon de	41 días	sáb 18/4/20	vie 29/5/20	67																						
69	Alcantarilla de Cajon de	41 días	mar 28/4/20	lun 8/6/20	68CC+10 días																						
70	Alcantarilla de Cajon de	41 días	lun 8/6/20	dom 19/7/20	69																						
71	Alcantarilla de Cajon de	41 días	jue 18/6/20	mié 29/7/20	70CC+10 días																						
72	Alcantarilla de Cajon de	41 días	mié 29/7/20	mar 8/9/20	71																						
73	Alcantarilla de Cajon de 3.05 x 3.05 Triple (ampliación), L=8.0 m	65 días	jue 13/8/20	sáb 17/10/20	72CC+15 días																						
74	Alcantarilla de Cajon de 3.05 x 2.44 (ampliación), L=3.0 m	65 días	dom 23/8/20	mar 27/10/20	73CC+10 días																						
75	SECCIÓN C - PUENTES	139 días	dom 9/2/20	sáb 27/6/20																							
76	Rehabilitación del Puente sobre el Río Oria	108 días	dom 9/2/20	mié 27/5/20	81																						
77	Rehabilitación del Puente sobre Qda Los Ranchos	108 días	mié 11/3/20	sáb 27/6/20	76CC+31 días																						
78	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DE TUBO O CAJON, TRAGANTES, CORDON-CUNETA	45 días	jue 26/12/19	dom 9/2/20																							
79	Limpieza de Tubos de Hormigón de 0.30m @ 0.90m	18 días	jue 26/12/19	lun 13/1/20	14																						
80	Limpieza de Cunetas	15 días	mié 8/1/20	jue 23/1/20	79FC-5 días																						
81	Limpieza de Cajon	22 días	sáb 18/1/20	dom 9/2/20	80FC-5 días																						



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PEDASÍ-LOS ASIENTOS-CAÑAS

Id	Nombre de tarea	Duracion	Comienzo	Fin	Predecesoras	enero 2019		junio 2019			noviembre 2019			abril 2020			septiembre 2020			febrero	
						1 enero 24	28	4	8	13	17	22	26	30	4	9	13	17	23	27	1
82	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS	20 días	jue 13/8/20	mié 2/9/20																	
83	Construcción de Acera	20 días	jue 13/8/20	mié 2/9/20	31																
84	VARIOS	194 días	jue 30/1/20	mar 11/8/20																	
85	Solución Pluvial en Est. 39k + 700	45 días	sáb 27/6/20	mar 11/8/20	77																
86	Remoción de Escombros, Parada de Buses	10 días	jue 30/1/20	dom 9/2/20	16CC+5 días																
87	Remoción de Estructura de Concreto	14 días	mar 4/2/20	mar 18/2/20	86FC-5 días																
88	Hidrosiembra	25 días	lun 17/2/20	vie 13/3/20	63CC+10 días																

