

Planta Villas Del Norte



Hormigón Express

Planta Móvil

Dosificadora

Cap Carga 4.5mt<sup>3</sup>-7.5mt<sup>3</sup>

Cap Entrega 30-35 mt<sup>3</sup> hr

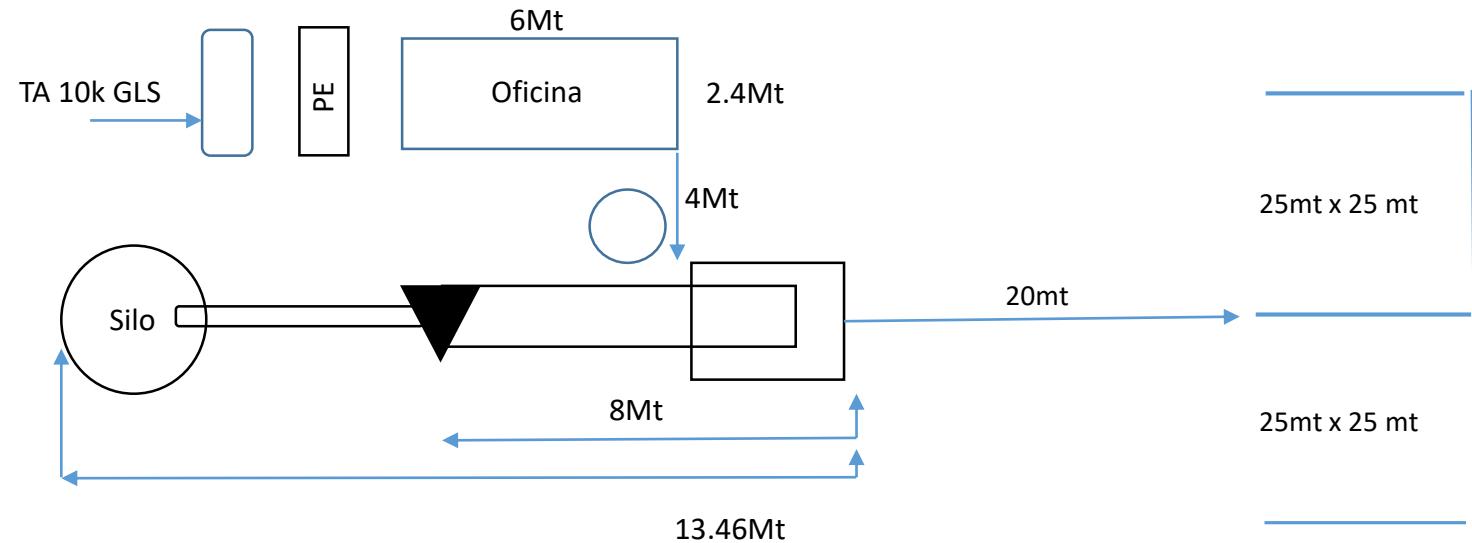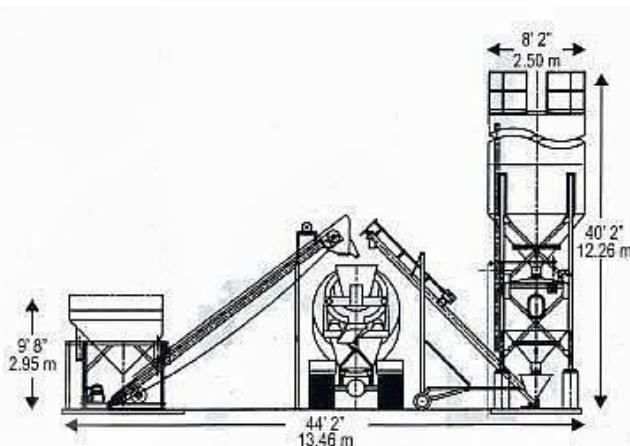

Perímetro de la planta de concreto  
Zona de trafico y trabajo, requerido 5000mt<sup>2</sup>  
2500Mt<sup>2</sup> Planta, 2500Mt Agregados

El croquis esta basado en almacenamiento para dos agregados en capacidad de 200mt<sup>3</sup>,  
lo que puede cubrir despachos de 100mt<sup>3</sup>

## Planta Villas Del Norte

Hormigón Express

Planta Móvil

Dosificadora

Cap Carga 4.5mt<sup>3</sup>-7.5mt<sup>3</sup>

Cap Entrega 30-35 mt<sup>3</sup> hr


### Losa de Planta de Concreto

1 parrilla de Acero #4 espaciado a 10cm

Losa de 3.00mtx3.00mtx0.20mt

Volumen de concreto a utilizar [1.8Mt<sup>3</sup> @ 4000psi](#)

EL anclaje de la planta es mediante pernos de Anclaje.

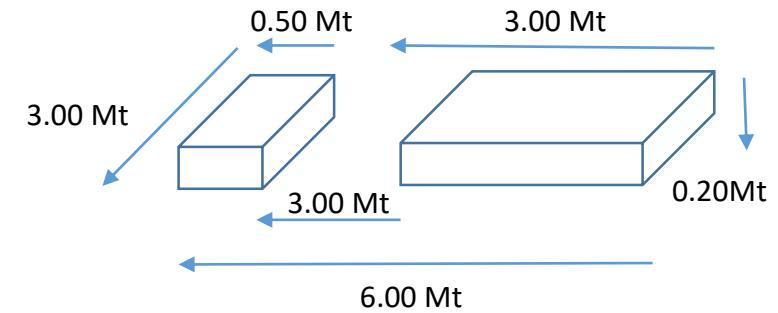

### Losa de Silo


1 parrilla de Acero #4 espaciado a 15cm

Losa de 3.00mtx3.00mtx0.30mt

Volumen de concreto a utilizar [2.7Mt<sup>3</sup>@4000psi](#)

Se colocaran 4 platos para soldar la base al silo.

Platos de 0.30x0.30x3/4" Acero A36.

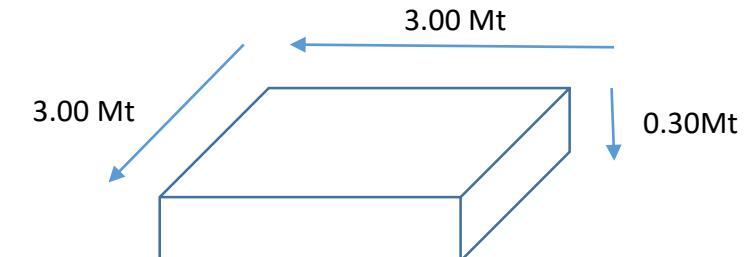

Hormigón Express

Planta Móvil Terex

Dosificadora

Cap Carga 4.5mt3-7.5mt3

Cap Entrega 30-35 mt3 hr



## Planta de Concreto Terex

Banda Inclinada de 24" con Motor de 10Hp

Bomba de Agua de 2" 10Hp Cap 250Gls/min

Celdas de Carga Tipos S 10K

Compresor de Aire IngerSoll Rand 10Hp

Lector de Peso Rice Lake

Tanque de Agua de 10k Gls

Compresor Portátil Sullivan

Planta Eléctrica olympian 100KVA @480V

