



Sexto Informe de Seguimiento sobre la Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación del Plan de Manejo Ambiental y la Resolución DIEORA-IA-132-16

**Proyecto
“Agro Playa Blanca Fase II”**

**Preparado para:
Agro Playa Blanca, S.A.**



Febrero – Julio, 2019

Sexto Informe de Seguimiento sobre la Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación
del Plan de Manejo Ambiental y la Resolución DIEORA-IA-132-16

Proyecto
“Agro Playa Blanca Fase II”





Sector de Buenaventura, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé

Preparado para:
Agro Playa Blanca, S.A.

Elaborado por:



Febrero – Julio, 2019

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| |  |  |  |
| Idoneidad DIVEDA-003-2012/ Act. 2018 | Responsable | Control de Calidad | Auditor Líder |
| | Roy Quintero DIPROCA-AA-031-2013/ Act. 2017 | Vilka Szobotka DIPROCA-AA-017- 2010/Act. 2017 | Ivette Herrera DIVEDA-AA-035- 2016/Act. 2018 |

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| 1. INFORMACIÓN GENERAL | 5 |
| 2. INTRODUCCIÓN | 6 |
| 3. ASPECTOS TÉCNICOS | 7 |
| 3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | 7 |
| 3.2. ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO | 7 |
| 3.2.1. PLANIFICACIÓN | 7 |
| 3.2.2. CONSTRUCCIÓN/ EJECUCIÓN | 8 |
| 3.2.3. OPERACIÓN | 10 |
| 3.2.4. ABANDONO | 10 |
| 3.3. EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | 11 |
| 3.4. PERSONAL LABORANDO EN EL PROYECTO | 11 |
| 3.5. AVANCE DEL PROYECTO | 11 |
| 3.6. DATOS DE PRODUCCIÓN O PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA OPERACIÓN DEL PROYECTO | 11 |
| 4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL | 11 |
| 5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | 12 |
| 5.1. MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA) | 13 |
| 5.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN EN LA RESPUESTA A LA NOTA DIEORA-DEIA-AC-0092-1504-16 | 44 |
| 5.3. MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN DIEORA-IA-132-16 | 48 |
| 6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PROMOTOR | 55 |
| 6.1. CONCLUSIÓN | 55 |
| 6.2. RECOMENDACIONES | 55 |
| 7. BIBLIOGRAFÍA | 55 |
| 8. ANEXOS | 58 |
| ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO | |
| ANEXO 2. INFORMES DE INSPECCIONES AMBIENTALES | |
| ANEXO 2.1. INFORME DE INSPECCIÓN DE RUIDO DE AMBIENTAL | |
| ANEXO 2.2. INFORME DE INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL | |
| ANEXO 2.3. INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD DE AIRE PARTÍCULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN (PTS) | |
| ANEXO 2.4. INFORME DE INSPECCIÓN DE VIBRACIONES | |
| ANEXO 3. OTROS ANEXOS | |
| ANEXO 3.1. CAPACITACIONES VARIAS | |
| ANEXO 3.2. RECOLECCIÓN DE DESECHOS DOMÉSTICOS | |
| ANEXO 3.3. MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS | |
| ANEXO 3.4. MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES | |
| ANEXO 3.5. ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | |
| ANEXO 3.6. RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| ANEXO 3.7. EVIDENCIA DE FUMIGACIÓN | |

ANEXO 3.8 INFORME DE EXPOSICIÓN VIBRACIÓN-RUIDO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO

ANEXO 3.9. EVIDENCIA DE ARBORIZACIÓN

ANEXO 3.10. FUERZA LABORAL Y PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

ANEXO 3.11. ACUSE DE ENTREGA ANTE MINISTERIO DE AMBIENTE DEL QUINTO INFORME DE SEGUIMIENTO

ANEXO 3.12. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, CATEGORIA III DEL PROYECTO AGRO PLAYA BLANCA FASE II

1. INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se presentan los aspectos generales relacionados al seguimiento del Proyecto:

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Nombre del Proyecto | Agro Playa Blanca Fase II | |
| Periodo de evaluación | Febrero – Julio, 2019 | |
| Alcance | Verificar el cumplimiento de los compromisos del PMA, la resolución que aprueba el EsIA y resolución de modificación aprobada. | |
| Promotor del Proyecto | Agro Playa Blanca, S.A. | |
| Domicilio del promotor | Plaza BMW. Calle 50, piso 10, oficinas Grupo Verde Azul | |
| Representante legal | Alberto Vallarino Clement | |
| Resolución que aprueba el proyecto | Resolución DIEORA-IA-132-16, del 4 de agosto de 2016. Modificación del PMA bajo Resolución IAM-015-2019 del 10 de mayo de 2019. | |
| Localización geográfica del proyecto | Sector de Buenaventura, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé. | |
| Persona de contacto de la empresa promotora | Miguel Pereira Gerente de Proyecto | |
| Teléfono de contacto | 6983-9191 | |
| Empresa Auditora | Corporación de Desarrollo Ambiental, S.A. (CODESA) | |
| No. de idoneidad | DIVEDA-003-2012/ Act. 2018 | |
| Personal Técnico de la empresa Auditora | | |
| Auditor Líder | Ivette Herrera (Lic. Biología Ambiental) | DIVEDA-AA-035-2016/Act. 2018 |
| Personal de apoyo | | |
| Componente Ambiental | Ada Carolina Díaz (Ing. Ambiental) | C.I.N° 2019-120-020 |
| Monitoreos de parámetros ambientales y ocupacionales | Yeleinshka Yaleman (Lic. Bióloga Ambiental) | - |

Fuente: CODESA, 2019.

2. INTRODUCCIÓN

El presente documento se elaboró de acuerdo con los lineamientos que establece el Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III del proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”, aprobado por el Ministerio de Ambiente mediante la Resolución DIEORA-IA-132-16, del 4 de agosto de 2016; para fiel cumplimiento de las formalidades y requisitos legales establecidos en la legislación panameña.

El artículo 4 de la Resolución antes citada, establece en su acápite “k” lo siguiente:

“Presentar ante la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Coclé, cada seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la presente resolución administrativa, durante la construcción y la etapa operativa del proyecto, un informe sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, un (1) ejemplar original impreso y tres (3) copias en formato digital (Cd), de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental, en las respuestas a las Ampliaciones y en esta Resolución. Este informe deberá ser elaborado por un profesional idóneo e independiente de EL PROMOTOR del Proyecto”.

Además de lo antes mencionado, el proyecto “Agro Playa Blanca Fase II” presenta mediante la Resolución IAM-015-2019 del 10 de mayo de 2019, la modificación del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, que consiste en excluir lo contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental, en cuanto al desvío de la quebrada Aguas Blancas (Aguas Claras), así como las medidas de mitigación relacionadas a este cuerpo de agua. Adicional se instalará una tubería pluvial paralela al borde Este y canal a la entrada de la marina (ver anexo 3.12).

Dicha resolución, cita en el artículo 1 lo siguiente:

*“**APROBAR** la solicitud de modificación del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, denominado **AGRO PLAYA BLANCA FASE II**, promovido por la sociedad **AGRO PLAYA BLANCA FASE II, S.A.**, y modificar el DATUM, que aparece en la Resolución **DIEORA-IA-132-16** de 4 de agosto de 2016 y en el Estudio de Impacto Ambiental de referencia, dado que las mismas corresponden a DATUM WGS84 y no a DATUM NAD 27 aprobado mediante la referida resolución”.*

Y en su artículo 2:

*“**MANTENER** en todas sus partes, el resto del contenido de la Resolución **DIEORA IA-132-16**, del 04 de agosto de 2016.”*

En cumplimiento a los artículos descritos, se presenta el Sexto Informe de Seguimiento sobre la Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación del Plan de Manejo Ambiental, la

Resolución DIEORA-IA-132-16 y Resolución DEIA-IAM-015-2019 del proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”, correspondiente a los meses febrero a julio, 2019.

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el desarrollo de un complejo residencial turístico sobre el litoral Pacífico, con el objetivo de contribuir al desarrollo de esta región del país.

La obra contará con los siguientes componentes: 11 lotes para uso residencial, 24 residencias unifamiliares tipo villas, 30 residencias unifamiliares adosadas, 64 apartamentos de mediana densidad, 98 apartamentos de alta densidad, 234 residencias marina village, club de playa residencial con piscina, bar y restaurante, zonas verdes, caminos y veredas, hotel con 614 habitaciones con facilidades como restaurantes y bares spa, gimnasio, guardería y locales comerciales, marina con facilidades como: zona de arribo, apartamentos, estación de servicio de combustible, plaza con locales comerciales para venta de productos y servicios ligados a actividades náuticas, muelle para embarcaciones para los residentes, huéspedes y otros usuarios, planta de tratamiento de aguas residuales; así como el resto de infraestructuras necesarias, como calles de acceso, acueducto, alcantarillado y todos los servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones, internet, cable tv y otros.

3.2. ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Actualmente el proyecto “Agro Playa Blanca Fase II” de Agro Playa Blanca, S.A., se encuentra en la etapa de construcción.

3.2.1. PLANIFICACIÓN

En esta etapa se definieron aspectos relacionados con el diseño del proyecto, sus características, las especificaciones técnicas y su relación con el entorno. Aunque esta etapa no genera impactos ambientales, tiene repercusiones que se pueden manifestar en las etapas siguientes.

Entre las actividades relacionadas a la fase de planificación, se encuentran:

- Estudio de factibilidad
- Diseño arquitectónico
- Estudio de suelo
- Estudio hidrológico
- Revisión y aprobación de planos a nivel de anteproyecto
- Elaboración y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, entre otros.

3.2.2. CONSTRUCCIÓN/ EJECUCIÓN

La fase de construcción la constituyen las actividades relacionadas al proceso constructivo de la edificación. En el caso específico del proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”, incluye actividades como:

- Rescate y reubicación de flora y fauna.
- Remoción de la vegetación.
- Movimiento de tierra y nivelación del terreno.
- Instalación del sistema sanitario.
- Construcción del sistema pluvial.

Este proyecto ha sido modificado en su diseño, por la Resolución DEIA-IAM-015-2019 del 10 de mayo de 2019; en la adición de una tubería pluvial paralela al borde Este y canal a la entrada de la marina, que cuenta con las siguientes coordenadas (ver tablas 2 y 3):

Tabla 2. Coordenadas del sistema pluvial 1

| Pluvial 1 | Coordenadas | |
|-------------------------------|-------------|-----------|
| | X | Y |
| Punto de descarga al Río Hato | 592101.23 | 921979.17 |
| 1 | 592119.94 | 922031.25 |
| 2 | 592133.06 | 922065.04 |
| 3 | 592158.00 | 922065.34 |
| 4 | 592203.83 | 922073.41 |
| 5 | 592222.71 | 922080.47 |
| 6 | 592251.51 | 922097.19 |
| 7 | 592284.09 | 922120.12 |
| Hacia ramales pluviales | 592297.05 | 922130.56 |

Fuente: Modificación del EslA mediante Resolución DEIA-IAM-015-2019 del 10 de mayo de 2019.

Tabla 3. Coordenadas del Sistema pluvial 2

| Pluvial 2 | Coordenadas | |
|-------------------------------|-------------|-----------|
| | X | Y |
| Punto de descarga al Río Hato | 592106.31 | 921977.45 |
| 1 | 592119.54 | 922009.87 |
| 2 | 592151.36 | 922020.13 |
| 3 | 592189.00 | 922028.11 |
| 4 | 592221.80 | 922034.81 |
| 5 | 592221.65 | 922032.11 |
| 6 | 592227.05 | 922027.01 |
| 7 | 592228.16 | 922024.55 |
| 8 | 592246.19 | 922033.64 |
| 9 | 592279.00 | 922049.23 |
| Hacia ramales pluviales | 592307.76 | 922065.71 |

Fuente: Modificación del EslA mediante Resolución DEIA-IA-015-2019 del 10 de mayo de 2019.

- Construcción de cimientos.
- Dotación para conducción de energía eléctrica.
- Instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales.
- Espigón.
- Construcciones en general:
 - Lotes para uso residencial.
 - Residencias unifamiliares tipo villas.
 - Residencias unifamiliares adosadas.
 - Apartamentos de mediana densidad.
 - Apartamentos de alta densidad.
 - Clubs de playa con piscina, bar y restaurante.
 - Zonas verdes, lagos, caminos y veredas.
 - Hotel con 614 habitaciones, con facilidades como restaurantes y bares, spa, gimnasio, guardería y locales comerciales.
 - Marina con facilidades como:
 - Zona de arribo.
 - Apartamentos.
 - Estación de servicio de combustible.
 - Plaza con locales comerciales, para venta de productos y servicios ligados a actividades náuticas.
 - Muelle para embarcaciones, para los residentes, huéspedes y otros usuarios.
- Construcción de obras de cerramientos.
- Construcción de obras muertas.
- Trabajo final de pintura y otros acabados.

- Revegetación.
- Limpieza del área.

Además, se instalará una planta móvil de concreto, mientras duren los trabajos de construcción. Para su instalación solo será necesario construir fundaciones y/o soportes para fijar las bases de esta.

Dentro de las unidades que conformarán la dosificadora, están las rampas de carga y estructuras alrededor; cuyas estructuras son independientes al de la propia dosificadora.

La materia prima que utilizará la dosificadora de concreto será: grava, arena, cemento, agua y retardante o reductores de agua de la marca Mirna 94 y/o Paracem 19, que es un súper plastificante. Uno de los principales componentes de este proyecto es la marina; la cual se construye mediante el método conocido como tablas con estacado de acero; que funciona como un muro de contención. Las tablestacas se colocan en el perímetro que forma la marina, y luego se procede a excavar el material excedente. Una vez que termine la excavación, se realizará la apertura del dique que permitirá la entrada del agua para crear el espejo de agua, que utilizarán las embarcaciones para la entrada y salida al sitio.

Para proteger las estructuras que formarán parte del proyecto, será necesario la adecuación y construcción de un espigón. En el anexo 14 del Estudio de Impacto Ambiental, se presenta el estudio realizado por la empresa Louis Berger, sobre este y otros temas relacionados.

3.2.3. OPERACIÓN

Una vez concluida la fase de construcción, y recibidas las autorizaciones y permisos necesarios para la ocupación del proyecto; se iniciará la fase de operación.

En general se realizarán trabajos de limpieza de áreas comunes, áreas verdes, mantenimiento de vías internas, entre otros. Además, se realizarán trabajos relacionados a la actividad hotelera, arribo de embarcaciones que utilizarán la marina, despido de combustible, actividades comerciales; entre otras.

3.2.4. ABANDONO

No se ha estimado una fecha de abandono de la obra; sin embargo, en la hipótesis de que se requiera el cierre de alguna de las actividades que forman el proyecto, el promotor deberá cumplir con todos los requisitos y normativas legales aplicables a la fecha en que se realice el abandono; procurando que el terreno quede en condiciones semejantes a como estaba antes de la construcción y ocupación del mismo.

3.3. EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

Actualmente las actividades de construcción se desarrollan, utilizando equipos como:

- Camiones volquetes
- Excavadoras hidráulicas
- Retroexcavadora
- Generadores eléctricos
- Máquinas de soldar
- Manipulador telescópico
- Cortadora circular
- Equipos de albañilería

3.4. PERSONAL LABORANDO EN EL PROYECTO

A la fecha, el proyecto cuenta con 220 trabajadores aproximadamente. Actualmente hay tres (3) frentes de trabajo, el primero Marina Village (119 trabajadores), Velamar (55 trabajadores) e Infraestructura (46 trabajadores); ver anexo 3.10.

3.5. AVANCE DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra en la etapa de construcción, específicamente en las actividades de construcción de sistemas de alcantarillados, calles y levantamiento de estructuras; con un avance de obra por parte de Marina Village de 65%, Velamar 55% e Infraestructura con 85%.

3.6. DATOS DE PRODUCCIÓN O PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA OPERACIÓN DEL PROYECTO

Según información suministrada por el promotor, durante este periodo de evaluación; no se presentaron problemas en las actividades de construcción.

4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Tabla 4. Programación de actividades 2019

| Actividades | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
|--|-------|--------|------------|---------|
| Inspección | | | | |
| Entrega de Evidencias | | | | |
| Aprobación del documento por el promotor | | | | |
| Entrega a MiAMBIENTE | | | | |

Fuente: CODESA, 2019.

5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

Para verificar la aplicación y eficiencia de las medidas de prevención y mitigación contenidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la Resolución que lo aprueba, se utilizó una plantilla con el listado completo de las medidas que se deben implementar en las distintas etapas del Proyecto. El Ing. Jorge Silva (coordinador de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente), facilitó la documentación necesaria para la elaboración del presente informe.

Para la presentación de los resultados se utilizó la siguiente metodología:

- Identificación de las medidas que se deben implementar durante la etapa de planificación, según el PMA y la Resolución de aprobación.
- Desarrollo de la inspección.
- Descripción y análisis de la ejecución de las medidas.
- Recopilación de evidencias para la clasificación de las medidas en: ejecutadas, en ejecución, no ejecutada o no aplica.

5.1. MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)

En la tabla 5 se puntualizan las medidas de mitigación que establece el Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III.

Tabla 5. Medidas que contempla el PMA

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|------------------------------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | |
| 1 | Prohibir el depósito de desperdicios y residuos sólidos en lugares no apropiados (canales pluviales, calles y/o vías). | ✓ | | | | 100% | <p>En ejecución.</p> <p>En el proyecto se implementan unas series de capacitaciones a los trabajadores, dentro de las cuales se aborda el manejo de los desechos y que está prohibido el depósito de desperdicio y de residuos sólidos en lugares inapropiados (ver anexo 3.1).</p> <p>Cabe mencionar, que durante la inspección se evidenció que los canales pluviales, calles y vías dentro del área de desarrollo del proyecto; se mantienen libres de desechos (ver imágenes 1 y 2).</p> |
| 2 | Depositar los desechos de tipo doméstico en bolsas plásticas resistentes o cestos de basura con tapa. | ✓ | | | | 60% | <p>En ejecución.</p> <p>Se han situado en distintas áreas del proyecto, recipientes identificados, con bolsas plásticas y tapa; para la disposición temporal de los desechos sólidos. Entre ellos se identificaron</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | | <p>recipientes para clasificación de vidrio, desechos orgánicos, desechos peligrosos, metal, plástico; entre otros (ver imágenes 3 y 4). Algunos contratistas que generan mucho volumen de desechos utilizan bolsas plásticas resistentes (ver imagen 5).</p> <p>Cabe mencionar que se evidenciaron algunos recipientes no contaban con, tapas (ver imagen 6).</p> |
| 3 | <p>Establecer un lugar de acopio en el área de construcción, donde se dispongan temporalmente los desechos sólidos, a fin de evitar la acumulación de desechos sólidos que queden a la intemperie.</p> | ✓ | | | | 100% | <p>En ejecución.</p> <p>Durante la inspección se evidenció que, en el área de proyecto, se tenía dos (2) áreas de acopio temporal para los desechos de construcción (ver imágenes 7 y 8).</p> <p>De acuerdo a información suministrada por la contra parte técnica, la frecuencia de recolección de estos desechos puede variar de acuerdo el volumen que se genere en el proyecto (ver imagen 9 y anexo 3.6).</p> <p>En cuanto a los desechos sólidos domésticos, cada subcontratista en su campamento, cuenta con recipientes para el acopio temporal de los mismos (ver imágenes 3 y 4); los cuales</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | | | | | | | posteriormente son retirados por una empresa autorizada (ver anexo 3.2). |
| 4 | Contratar a una empresa o entidad que preste los servicios de recolección y disposición final de desechos. | ✓ | | | | 75% | <p>En ejecución.</p> <p>La empresa promotora contrató los servicios de las siguientes empresas: Autoridad de Aseo, Prody Panamá, S.A. que son los encargados de la recolección y disposición final de los desechos domésticos (ver anexo 3.2); mientras LIONCIO L. PÉREZ realiza la recolección y disposición final de los desechos de construcción (ver anexo 3.6).</p> <p>Cabe señalar que no se suministró evidencia de la empresa encargada de la recolección de los residuos peligrosos.</p> |
| 5 | Realizar el mantenimiento de la maquinaria o equipos, en los sitios destinados para tal fin, en concordancia con un plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria y vehículos a utilizar. | ✓ | | | | 100% | <p>En ejecución.</p> <p>En concordancia con el Plan de Mantenimiento Preventivo de la Empresa Equitrans, se realizan los mantenimientos de las maquinarias y vehículos en un taller específico.</p> <p>En el anexo 3.3 se presentan los comprobantes de mantenimiento de la maquinaria Equitrans.</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| 6 | Contar con un kit para el control de derrames (paños, materiales particulados u otros); que permitan la fácil remoción y control de pequeñas fugas de combustible que puedan presentarse de la maquinaria que se utilice en el proyecto. | ✓ | | | | 100 % | <p>En ejecución.</p> <p>Durante la inspección se evidenció que el proyecto cuenta con paños absorbentes (ver imagen 12). Cabe indicar que se le solicitó el Kit antiderrame a uno de los operadores de una maquinaria, el mismo portaba un paño absorbente desgastado (ver imagen 13), el cual se procedió a reemplazar con uno nuevo.</p> |
| 7 | Contratar a una empresa que brinde el servicio de instalación y mantenimiento de sanitarios portátiles, que acredite la disposición final y segura de los desechos líquidos generados por las actividades fisiológicas de los trabajadores. | ✓ | | | | 100% | <p>En ejecución.</p> <p>El proyecto cuenta con los servicios de instalación y mantenimiento de sanitarios portátiles de las empresas RE-Renta equipos (ver imagen 12), SELEPSA (ver imagen 13) y Aluma Systems (ver imágenes 14 y 15).</p> <p>En el anexo 3.4 se adjuntan los comprobantes de mantenimiento y limpieza de los sanitarios portátiles presentes en el proyecto.</p> <p>De igual manera, en el anexo 3.9 del Quinto Informe de Seguimiento, se presentaron los permisos sanitarios de operación, los cuales acreditan que las empresas en mención realizan</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | | una disposición final segura. Cabe indicar que os permisos de operación y disposición final con vigencia de un (1) año, otorgados por el Ministerio de Salud a las empresas encargadas de brindar el servicio en el proyecto "Agro Playa Blanca Fase II" (Renta Equipos, SELEPSA y Aluma Systems). |
| 8 | Colocar cajones pluviales para que los líquidos, producto de las actividades de limpieza del área de construcción, no rieguen de manera descontrolada hacia las alcantarillas o vías más cercanas. | | | | ✓ | | No aplica. El proyecto no cuenta actualmente con cajones pluviales para movilización de las aguas generadas en la limpieza del área y maquinarias utilizadas, debido a que las actividades de construcción de infraestructura aún no finalizan. Cabe mencionar que el sistema de alcantarillado pluvial y sanitario del proyecto se ha estado construyendo durante este periodo de evaluación (ver imágenes 16 a 19). |
| 9 | Tramitar el permiso de obra en cauce correspondiente. | | | ✓ | | 100% | Ejecutada. Como se ha mencionado en anteriores informes, la empresa promotora tramitó los permisos de obra en cauces naturales de la quebrada Aguas Claras (Aguas Blancas) y el Río Hato. |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | | En el anexo 3.6 del Cuarto Informe de Seguimiento, se presentó la Resolución DRCC-AGICH N° 133-2017 y la Resolución DRCC-AGICH N° 132-2017; correspondientes a los permisos de obra en cauce de la quebrada Aguas Claras y el Río Hato. |
| 10 | Verificar que los trabajos de dragado u movimiento de tierra no abarquen más de la capacidad que se establece en el diseño para la marina. | ✓ | | | | 100% | En ejecución. Las imágenes 20 y 21, presentan el vado temporal construido durante las actividades de reforzamiento del margen de la desembocadura del Río Hato, hallándose dentro de la longitud de trescientos (300) metros lineales, establecido en el permiso de obra en cauce del Río Hato (ver anexo 3.6 del Cuarto Informe de Seguimiento). |
| 11 | Presentar ante el Ministerio de Ambiente, previo al inicio de los trabajos, el estudio hidrológico e hidráulico aprobado por las entidades competentes. | | | ✓ | | 100% | Ejecutada. Se adjuntó en el anexo 2.2 del Primer Informe de Seguimiento, agosto de 2016 – enero de 2017; el Estudio Hidrológico e Hidráulico aprobado por las entidades competentes. |
| 12 | Revegetar las zonas que queden desprovistas de vegetación, con especies de rápido crecimiento y | ✓ | | | | 100% | En ejecución. Para este periodo de evaluación, se dio inicio a la revegetación de las zonas desprovistas de |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| | de preferencia herbáceas. | | | | | | <p>vegetación, como se observa en las imágenes 22 y 23; con un porcentaje de avance de 30%, según información suministrada por la promotora.</p> <p>En el anexo 3.9, se adjuntan las órdenes de compra y cotizaciones de algunos de los materiales requeridos para efectuar la arborización en el proyecto; a fin de reducir el impacto paisajístico ocasionado por las actividades de construcción.</p> |
| 13 | Utilizar estructuras de contención de flujos de agua como zampeados y empedrados a las entradas y salidas de las estructuras de drenaje. | | | | ✓ | | <p>No aplica.</p> <p>Para este periodo se encuentran contruidos parcialmente, los drenajes de alcantarillado pluvial y sanitario (ver imágenes 16 a 19). Cabe agregar que debido a que no han finalizado las actividades de construcción y movilización de maquinaria pesada, que efectúa el transporte de material dentro del proyecto; no se cuenta con canales pluviales zampeados.</p> |
| 14 | Construir sistemas de drenaje y canalización de las aguas pluviales, que permitan la evacuación y reducción de la escorrentía superficial. | ✓ | | | | 100% | <p>En ejecución.</p> <p>Las imágenes 16 a 19, muestran las tuberías tragantes y el cabezal del drenaje pluvial, contruidos durante este periodo de evaluación; para la movilización de las aguas pluviales a</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | | | | | | | descargar en el Río Hato. |
| 15 | Instalar barreras de control de sedimentos en las márgenes de los cuerpos de agua superficial (Quebrada Aguas Blancas y Río Hato), principalmente durante el movimiento de tierra. | | ✓ | | | | <p>No ejecutada.</p> <p>El día de la inspección en el área del proyecto, no se observó la implementación de medidas de control de erosión en los márgenes del Río Hato. Además, actualmente se ha construido un vado para la movilización de material de un margen a otro; como se observa en las imágenes 24 y 25. Cabe señalar que, por las actividades de movimiento de tierra y precipitaciones,</p> <p>No se tomó en cuenta la evaluación de la Quebrada Aguas Blancas (Agua Claras), debido a que fue excluida del Seguimiento del proyecto "Agro Playa Blanca Fase II" a través de la Resolución de Modificación DEIA-IAM-015-2019 del 10 de mayo de 2019.</p> |
| 16 | Exigir a los contratistas que los camiones que transporten suelo y materiales como arena, o cualquier otro material particulado; utilicen lonas cuando circulen por las vías públicas. | | | | ✓ | | <p>No aplica.</p> <p>Durante la inspección se observó que los camiones volquetes para transporte de material, cuentan con lona de protección (ver imágenes 26 y 27); sin embargo, el tránsito de estos se da dentro del área del proyecto, por lo que no aplica esta medida.</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| 17 | Establecer un programa de mantenimiento periódico para la maquinaria y los equipos rodantes que se utilicen durante la construcción del proyecto. | ✓ | | | | 100% | <p>En ejecución.</p> <p>La empresa promotora suministró evidencias del programa de mantenimiento de la maquinaria de la subcontratista Equitrans (ver el anexo 3.8, específicamente cuadro 2).</p> <p>De igual manera en el anexo 3.3 se presentan los registros de mantenimiento correspondiente a la implementación del programa de mantenimiento establecido por Equitrans.</p> |
| 18 | Proporcionar mascarillas de seguridad adecuados al tipo de partículas, en los lugares donde se genere material particulado, que pueda afectar la salud de los trabajadores. | ✓ | | | | 50% | <p>En ejecución.</p> <p>La imagen 28 presenta al personal efectuando trabajo de carpintería en el área del proyecto, sin hacer uso de protección respiratoria. Cabe mencionar que uno de los contratistas, cuenta con equipos de protección respiratoria a disposición de los trabajadores que lo requieran (ver imagen 29). Del cual el subcontratista mantiene un registro de entrega (ver imagen 30).</p> <p>De igual manera, en el anexo 3.5 se presentó el registro de entrega de equipo de protección personal, donde se evidencia la entrega de mascarilla a solo un (1) trabajador del proyecto;</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | | | | | | | tomando en cuenta que durante la inspección se observaron siete (7) trabajadores expuestos a material particulado, por las actividades que efectuaban. |
| 19 | Efectuar monitoreos de calidad de aire en las residencias más próximas al sitio de construcción y en durante la jornada laboral en aquellos puntos donde se generen más partículas en suspensión. | ✓ | | | | 100% | En ejecución. Se adjunta en el anexo 2.3 el Informe de Calidad de Aire, efectuado en el área del proyecto (Frente a edificio 200) y en la vivienda más cercana (Familia De La Guardia), demostrando en ambas mediciones que se cumple con los valores de referencia; siendo estos los del Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT-43-2000 e índice de referencia ORAQI-ICAIRE, respectivamente. |
| 20 | Rociar con agua, principalmente durante la época seca, los terrenos que queden desprovistos de vegetación; para que no haya levantamiento de partículas que puedan causar molestias a los vecinos y afectaciones a la salud de los trabajadores. | | | | ✓ | | No aplica. Actualmente los trabajos de construcción se efectúan en época lluviosa, por lo que el suelo se mantiene húmedo periódicamente. |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| 21 | Implementar un plan de mantenimiento preventivo de las maquinarias y vehículos, con el respectivo registro de los mismos. | ✓ | | | | 100% | <p>En ejecución.</p> <p>Tal cual como lo indica la medida, la maquinaria y vehículos del proyecto se les efectúa mantenimiento periódico; sin embargo, no se suministró la evidencia para todas las maquinarias observadas en campo.</p> <p>En el anexo 3.3 se presentan los registros de mantenimiento de algunas de las maquinarias utilizadas en el proyecto correspondientes a la subcontratista Equitrans.</p> |
| 22 | Utilizar los vehículos y equipos únicamente cuando sean necesarios y durante la jornada laboral que se establezca, para la construcción del Proyecto. | ✓ | | | | 95% | <p>En ejecución.</p> <p>El día de la inspección se observaron las maquinarias siendo utilizadas durante la jornada laboral. Sin embargo, en el campamento del contratista Equitrans, se observó personal lejos de la maquinaria mientras esta se mantenía encendida (ver imagen 31).</p> |
| 23 | Prohibir el encendido de las máquinas, mientras no se utilicen. | ✓ | | | | 100% | <p>En ejecución.</p> <p>En el anexo 3.1 se adjunta el registro de capacitaciones, que incluye entre sus temas, el "Prohibir el encendido de maquinarias". Cabe mencionar que durante la inspección no se</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | | observaron letreros o medios informativos impresos que indicaran esta prohibición. |
| 24 | Prohibir el uso innecesario de bocinas, silbatos o cualquier otro dispositivo que genere ruido en el proyecto. Las bocinas para la comunicación entre la maquinaria deberán utilizarse solo cuando se requiera. | ✓ | | | | 100% | <p>En ejecución.</p> <p>A través de capacitaciones se les tramite a los trabajadores del proyecto que se prohíbe el uso de bocinas, silbatos o cualquier otro dispositivo que generen ruido en el proyecto (ver anexo 3.1).</p> <p>De igual manera, durante la inspección realizada al proyecto, no se percibió el uso innecesario de bocinas o silbatos. No obstante, el proyecto carece de letreros indicando "la prohibición del uso incensario de bocinas, silbatos o cualquier otro dispositivo que genere ruido en el proyecto".</p> |
| 25 | Realizar monitoreos de ruido ambiental y laboral, según el cronograma que se presenta en el EsIA o el periodo sugerido en la Resolución de aprobación del EsIA. | ✓ | | | | 100% | <p>En ejecución.</p> <p>El día de la inspección, el personal técnico de Corporación de Desarrollo Ambiental, S.A. (CODESA), efectuaron las inspecciones de Ruido Ambiental en la residencia más cercana al proyecto (Familia De La Guardia); permitiendo comparar los datos obtenidos por el equipo de medición, con el Decreto Ejecutivo 1 del 15 de enero de 2004; y en el área del proyecto (Frente</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | | al edificio 200), comparando el resultado con el Decreto Ejecutivo 306 del 4 de septiembre de 2002 (ver anexo 2.1). De igual manera, se efectuó el monitoreo de Ruido Laboral, al trabajador con mayor exposición al ruido generado por las actividades de construcción en el proyecto; lo que permitió comparar los valores obtenidos con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000 para una jornada de 6 horas continuas de exposición a ruido (ver anexo 2.2). |
| 26 | Mantener un registro de los tiempos de exposición de los operadores de equipos y maquinarias generadoras de ruido (con fecha y hora). | ✓ | | | | 100% | En ejecución. La promotora suministró evidencia de los tiempos de exposición a ruido y vibraciones del personal del proyecto (ver anexo 3.8). |
| 27 | Implementar un plan de mantenimiento preventivo de maquinarias y vehículos del proyecto. | ✓ | | | | 50% | En ejecución. Tal cual como lo indica la medida, la maquinaria y vehículos del proyecto se les efectúa mantenimiento periódico; sin embargo, no se suministró la evidencia para todas las maquinarias observadas en campo. En el anexo 3.3, se presentan los registros de |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | | | | | | | mantenimiento de algunas de las maquinarias utilizadas en el proyecto, correspondientes a la subcontratista Equitrans. |
| 28 | Realizar monitoreos de ruido laboral, según el cronograma que se presenta en el EsIA o el periodo sugerido en la Resolución de aprobación del EsIA. | ✓ | | | | 100% | En ejecución. Se realizó el monitoreo de Ruido Laboral, al trabajador con mayor exposición al ruido, siendo este el colaborador José Coronado (Carpintero y ayudante general); donde se comparó el resultado obtenido con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000 para una jornada de 6 horas continuas de exposición a ruido (ver anexo 2.2). |
| 29 | Desarrollar programas de trabajo para reglamentar los tiempos de operación. | ✓ | | | | 100% | En ejecución. Se presenta en el anexo 3.8, el registro de tiempo de operación del personal encargado del uso de maquinarias o equipos pesados y la cantidad de horas que efectúan esta labor. |
| 30 | Dotar y exigir a los trabajadores el uso de equipo de protección acústica (tapones u orejeras); cuando sea necesario, de acuerdo con la actividad. | ✓ | | | | 100% | En ejecución. Tal cual como se muestra en las imágenes 32 a 35, en las diferentes áreas del proyecto se han colocado letreros indicando el uso obligatorio de elementos de protección personal de acuerdo con la actividad. |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | | | | | | | De igual manera, durante la inspección se evidenció que algunos de los subcontratistas mantenían a disposición del trabajador, orejeras y tapones auditivos (ver imágenes 36 y 37). Sin En el anexo 3.5, se adjunta el registro de entrega de protección auditiva a uno de los trabajadores del proyecto. Además, en el anexo 3.8 se adjunta el informe del tiempo de exposición a ruido del personal que opera la maquinaria o equipo pesado. |
| 31 | Capacitar a los trabajadores sobre la importancia en el uso de los equipos de protección personal. | ✓ | | | | 50% | En ejecución. Durante la inspección, se observaron letreros en distintos puntos del proyecto, indicando la importancia y uso obligatorio del equipo de protección personal (ver imágenes 32 a 35). Además, el personal de algunas de las empresas subcontratistas, recibió capacitaciones en ruido laboral y uso obligatorio del equipo de protección personal (ver imagen 38 y anexo 3.1); sin embargo, no se suministraron evidencias de esta capacitación solicitada. |
| 32 | Realizar monitoreos de vibraciones durante la jornada laboral, para las personas que utilicen | ✓ | | | | 100% | En ejecución. La empresa promotora realiza semestralmente monitoreos de vibraciones durante la jornada |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | equipo pesado. | | | | | | <p>laboral, a aquellos trabajadores que utilizan equipo pesado.</p> <p>Cabe indicar que para el presente periodo de evaluación, se realizaron (3) tres mediciones de vibraciones a operadores de equipo pesado que laboran en el proyecto; cuyos resultados en los ejes (X), (Y) y (Z), muestran valores que sobrepasan los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 45-2000, lo que indica que las actividades que realizan los operadores pueden afectar la salud de los mismos (ver anexo 2.4).</p> |
| 33 | Programar los trabajos para regular los tiempos de exposición del personal. | ✓ | | | | 50% | <p>En ejecución.</p> <p>De acuerdo información suministrada por la contra parte técnica, se lleva un control de la exposición de vibración y ruido, de los trabajadores que utilizan la compactadora de impacto (sapo); en donde se programa que los trabajos se alternan a los colaboradores, para que estos tengan así un tiempo exposición de 3 horas por día (ver anexo 3.8).</p> <p>En lo que respecta a las maquinarias no se lleva un programa para regular los tiempos de exposición.</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| 34 | Capacitar a los trabajadores sobre la importancia en el uso de los equipos de protección personal. | ✓ | | | | 50% | <p>En ejecución.</p> <p>Durante la inspección, se observaron letreros en distintos puntos del proyecto, indicando la importancia y uso obligatorio del equipo de protección personal (ver imágenes 32 a 35). Además, el personal de algunas de las empresas subcontratistas, recibió capacitaciones en ruido laboral y uso obligatorio del equipo de protección personal (ver imagen 38 y anexo 3.1); sin embargo, otras no se suministraron evidencias de esta capacitación solicitada.</p> <p>Durante la inspección, se observaron letreros en distintos puntos del proyecto; indicando la importancia y uso obligatorio del equipo de protección personal (ver imágenes 32 a 35).</p> |
| 35 | Cumplir con los límites máximos establecidos en el Decreto Ejecutivo 5 de 4 de febrero de 2009; por el cual se dictan Normas Ambientales de Emisiones de Fuentes Fijas, para el caso de la planta móvil de concreto a utilizar. | | | | ✓ | | <p>No aplica.</p> <p>El Proyecto Agro Playa Blanca Fase II, no cuenta con una planta móvil de concreto; por lo que esta medida no aplica.</p> |
| 36 | Ejecutar medidas para el | | ✓ | | | | No ejecutada. |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | control de erosión, principalmente en el área colindante a los cuerpos de agua superficial. | | | | | | Las imágenes 26 y 27, presentan el área del Río Hato intervenida por las actividades del proyecto y donde no existen medidas para el control de la erosión. |
| 37 | Respetar el margen establecido por la Ley Forestal (Ley 01 de 03 de febrero de 1994), para realizar obras cerca de los cuerpos de agua superficial. | ✓ | | | | 100% | En ejecución. El proyecto cumple con las actividades dentro del alcance que aprueba el permiso de obra en cauce, que establece la Resolución N°. DRCC-004-2017; adjunta en el anexo 3.6 del Cuarto Informe de Seguimiento, febrero – julio de 2018. Además, se presentó en el anexo 2.3 del Primer Informe de Seguimiento, agosto de 2016 – enero de 2017, el pago en concepto de indemnización ecológica. |
| 38 | Revegetar las zonas que queden desprovistas de vegetación, con especies de rápido crecimiento y de preferencia herbáceas. | ✓ | | | | 100% | En ejecución. Para este periodo de evaluación, se dio inició a la revegetación de las zonas desprovistas de vegetación, como se observa en las imágenes 22 y 23; con un porcentaje de avance de 30%, según información suministrada por la promotora. En el anexo 3.9, se adjuntan las órdenes de compra y cotizaciones de algunos de los |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | | materiales requeridos para efectuar la arborización en el proyecto; a fin de reducir el impacto paisajístico ocasionado por las actividades de construcción. |
| 39 | Construir sistemas de drenaje y canalización de las aguas pluviales, que permitan la evacuación y reducción de la escorrentía superficial. | ✓ | | | | 100% | <p>En ejecución.</p> <p>Durante la inspección en el área del proyecto, se evidenció la construcción de los sistemas de drenaje y canalización de las aguas pluviales (ver imágenes 16 a 19), a través de una tubería de 66", que descarga en el cuerpo de agua más próximo; siendo este el Río Hato (ver imagen 21).</p> <p>En el próximo periodo de evaluación, se verificará el avance de esta medida.</p> |
| 40 | Utilizar estructuras de contención de flujos de agua como zampeados y empedrados a las entradas y salidas de las estructuras de drenaje. | ✓ | | | | 50% | <p>En ejecución.</p> <p>Durante este periodo de evaluación, que comprende los meses de febrero a julio de 2019; se inició la construcción y colocación de las tuberías, cámaras colectoras y zanjas para colocación de cunetas y/o medias cañas, que canalicen las aguas pluviales (ver imágenes 16 a 19). Cabe mencionar que aún no se han colocado zampeados y empedrados a las entradas y salidas de colectoras, tragantes,</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | | | | | | | entre otros; debido a que aún continúan los trabajos. |
| 41 | Realizar el pago de la indemnización ecológica establecida en la Resolución AG-0235-2004. | | | ✓ | | 100% | Ejecutada. En el anexo 2.3 del Primer Informe de Seguimiento, agosto de 2016 - enero de 2017; se adjuntó el comprobante de pago de la indemnización ecológica con número 2012387 del 10 de febrero de 2017, así como la Resolución de aprobación de la tala No. DRCC-004-2017 del 18 de enero de 2017. |
| 42 | Limitar en lo posible el desbroce de la capa vegetal. | ✓ | | | | 100% | En ejecución. Las actividades de desbroce de la capa vegetal que se realizan en el proyecto, se encuentran dentro del alcance del Estudio de Impacto Ambiental aprobado. Cabe mencionar, que el proyecto cumple con lo establecido en la Resolución N° DRCC-004-2017 (indemnización ecológica) y el pago de la indemnización ecológica (ver anexo 2.3 del Primer Informe de Seguimiento, agosto de 2016 – enero de 2017). |
| 43 | Respetar la servidumbre de los cuerpos de agua superficial, tal como lo | ✓ | | | | 100% | En ejecución. Actualmente, las actividades que realiza el |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | señala la Ley Forestal. | | | | | | proyecto en cuanto a la servidumbre del Río Hato se mantienen al alcance de lo que establece la Resolución N° DRCC-004-2017 e indemnización ecológica, presentadas en informes previos. |
| 44 | Ejecutar un plan de revegetación. | | | | ✓ | | <p>No aplica.</p> <p>El promotor ejecutará la revegetación al culminar con las actividades de construcción.</p> <p>Se adjuntó en el anexo 3.2 del Tercer Informe de Seguimiento, agosto de 2017 – enero de 2018, las notas de entrega y aprobación del Plan de Reforestación y Arborización ante el Ministerio de Ambiente.</p> |
| 45 | Realizar aporte técnico o apoyo en insumos, para el desarrollo de la Alianza por el Millón de Hectáreas. | | | | ✓ | | <p>No aplica.</p> <p>Esta medida fue eliminada por la Resolución DEIA-IAM-015-2019 del 10 de mayo de 2019, que modifica lo previamente establecido en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”.</p> <p>Cabe destacar que en el anexo 3.4 del Tercer Informe de Seguimiento, agosto de 2017 – enero de 2018, se adjuntó la participación de la empresa promotora en el desarrollo de la</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | | Alianza por el Millón de Hectáreas. |
| 46 | Coordinar con el Ministerio de Ambiente un Plan para reforestar el doble de la superficie intervenida (49.88 ha). | ✓ | | | | 100% | <p>Ejecutada.</p> <p>La empresa promotora efectuó la coordinación ante el Ministerio de Ambiente, para presentar el Plan de Reforestación, el cual fue aprobado mediante la nota de aprobación del No. DRPO-AG1CH-1339-2017 del 8 de noviembre de 2017 (ver anexo 3.2 del Segundo Informe de Seguimiento, febrero – julio de 2017).</p> <p>Cabe mencionar que de acuerdo información de la contra parte técnica, una vez finalicen con las actividades de construcción se implementará el plan de reforestación.</p> |
| 47 | Implementar un Plan de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna. | | | | ✓ | | <p>No aplica.</p> <p>Para este periodo de evaluación no se han realizado actividad que requieran la implementación del Plan de rescate y reubicación de Flora y Fauna.</p> |
| 48 | Ejecutar un programa de revegetación y barreras verdes; a fin de disminuir el impacto paisajístico que pueda presentarse. | ✓ | | | | 100% | <p>En ejecución.</p> <p>Durante la inspección se evidenció que para el presente periodo de evaluación, se dio inicio a la ejecución de la revegetación de algunas áreas del proyecto (ver imágenes 22 y 23). Cabe</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | | | | | | | señalar que la promotora indicó que se tiene un 30% de avance en la arborización del proyecto. De igual forma, se adjunta en el anexo 3.9 las órdenes de compra y cotizaciones de algunos de los materiales requeridos para efectuar la arborización. |
| 49 | Fumigar periódicamente para disminuir la presencia de vectores adultos en la zona. | ✓ | | | | 100% | En ejecución. Las imágenes 39 y 40 presenta el certificado de fumigación otorgado por la empresa Fumi Express, a una de las contratistas del proyecto (Ingeniería Lara), correspondiente a los meses de febrero y julio del presente año. Se adjunta en el anexo 3.7, evidencia de la fumigación efectuada en el área del proyecto, durante el periodo de evaluación. |
| 50 | Eliminar posibles criaderos de mosquitos y chitras (sitios con agua estancada). | ✓ | | | | 100% | En ejecución. En la inspección al proyecto, no se observaron áreas con agua estancada, que pudieran convertirse en criaderos de mosquitos y se evidenció, como se muestra en la imagen 38; el certificado de la fumigación efectuada en el mes de julio del presente año 2019. |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | | En el anexo 3.7, se adjuntan los certificados de las fumigaciones efectuadas durante el actual periodo de evaluación. |
| 51 | Fumigar en áreas donde se hayan cultivado plantas ornamentales de la familia Agavaceae o cualquier otra, que pueda retener agua entre sus hojas gruesas. | | | | ✓ | | No aplica. Durante este periodo de evaluación, no se han sembrado plantas ornamentales de la familia Argavaceae que pudieran retener agua entre sus hojas. Pese a esto, en las imágenes 39 y 40 se muestra el certificado de la fumigación efectuada por la empresa Fumi Express, en los meses de febrero y julio del presente año y los certificados de fumigación en el anexo 3.7. |
| 52 | Establecer lineamientos para que el personal foráneo mantenga prácticas de buena vecindad con las comunidades vecinas al proyecto. | ✓ | | | | 100% | En ejecución. En el anexo 3.1 se adjuntan los registros de las capacitaciones dictadas al personal en temas de buena conducta, comunicación inicial de medidas de seguridad, prohibido el uso de bocinas, entre otros; con la finalidad de evitar que las actividades de construcción afecten a la población colindante al proyecto. Para este periodo de evaluación, no se presentaron quejas por parte de los moradores colindantes al proyecto. |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| 53 | Asegurar que un arqueólogo inscrito en el INAC realice monitoreo en el área, durante los trabajos de movimiento de tierra. | | | | ✓ | | <p>No aplica.</p> <p>Para este periodo de evaluación, no se hallaron objetos de valor arqueológico.</p> <p>Cabe mencionar que en el Tercer Informe de Seguimiento, correspondiente al periodo de evaluación agosto de 2017 – enero de 2018; anexo 3.1, se presentó la Nota de entrega a la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico y la solicitud de certificación al Antropólogo Juan A. Ortega, quien realizará los trabajos de rescate arqueológico para la empresa Agro Playa Blanca, S.A.</p> <p>En el anexo 3.13 del Cuarto Informe de Seguimiento, febrero – julio de 2018, se adjunta la certificación otorgada por el Instituto Nacional de Cultura para la realización del monitoreo arqueológico.</p> <p>Se presentó en el anexo 3.14 del Cuarto Informe de Seguimiento, febrero – julio de 2018, se adjunta el Informe del Rescate Arqueológico efectuado en dicho periodo.</p> |
| 54 | Contratar a un arqueólogo para que | | | | ✓ | | No aplica. |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|---------------------------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | coordine con el INAC la recolección del material cultural observado en la superficie a intervenir. | | | | | | <p>Durante las primeras actividades de construcción la empresa promotora contrató a un arqueólogo para realizar la recolección de material cultural.</p> <p>En el anexo 3.13 del Cuarto Informe de Seguimiento, febrero – julio de 2018, se presentó la certificación otorgada por el Instituto Nacional de Cultura para la realización del monitoreo arqueológico.</p> |
| ETAPA DE OPERACIÓN | | | | | | | |
| 55 | Colocar recipientes con tapa, para el depósito temporal de desechos sólidos, en los distintos niveles y áreas de trabajo. | | | | ✓ | | <p>No aplica.</p> <p>Actualmente el proyecto se mantiene efectuando actividades de construcción.</p> |
| 56 | Establecer un área de acopio temporal de las bolsas y otros recipientes o contenedores de desechos sólidos no peligrosos, hasta que la empresa pública o privada contratada para la disposición final de estos, los retire o recoja y | | | | ✓ | | <p>No aplica.</p> <p>Para este periodo, el proyecto se mantiene realizando las actividades de construcción; por lo que esta medida no aplica.</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | traslade al vertedero o el sitio autorizado. | | | | | | |
| 57 | Cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT-35-2000, sobre descargas de efluentes líquidos directamente a cuerpos y masa de aguas superficiales y subterráneas. | | | | ✓ | | No aplica. Actualmente, el proyecto no realiza descargas de aguas residuales directamente a cuerpos y masa de aguas superficiales y subterráneas; debido a que se encuentra en fase de construcción. |
| 58 | Resolución AG-0026-2002. Por la cual se establecen los cronogramas de cumplimiento para la caracterización y adecuación a los reglamentos técnicos para descargas de aguas residuales DGNTI-COPANIT 35-2000 y DGNTI-COPANIT 39-2000. | | | | ✓ | | No aplica. Esta medida se hará efectiva al iniciar las descargas de aguas residuales; para este periodo solo se efectúan actividades de construcción. |
| 59 | Brindar mantenimiento preventivo a la planta de tratamiento de aguas | | | | ✓ | | No aplica. Esta medida aplicará una vez inicie la fase de |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| | residuales. | | | | | | operación. |
| 60 | Contar con barreras flotantes, disponibles para su uso en caso de ocurrir un accidente. | | | | ✓ | | No aplica. El proyecto actualmente se encuentra realizando actividades propias de la fase de construcción. |
| 61 | Capacitar al personal que labore en el área de despacho de combustible, en técnicas para la prevención de derrames y qué hacer en caso de que ocurran. | | | | ✓ | | No aplica. Esta medida podrá hacerse efectiva al iniciar los trabajos de operación del proyecto. |
| 62 | Adecuar el sistema de las aguas residuales, para permitir que las embarcaciones se conecten al mismo y puedan verter las aguas de sentina sin peligro de contaminación. | | | | ✓ | | No aplica. Durante este periodo de evaluación, se efectúan trabajos de construcción del sistema de alcantarillado sanitario; por lo que aún no se implementa esta medida. |
| 63 | Elaborar letreros de prohibición y colocarlos en puntos estratégicos del área, para que los usuarios sepan que no pueden disponer las | | | | ✓ | | No aplica. Esta medida podrá aplicarse al iniciar la fase de operación. |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | aguas de sentinas en los cuerpos de agua superficial de la zona. | | | | | | |
| 64 | Realizar monitoreos periódicos de los niveles de ruido, principalmente en zonas donde se realicen actividades con equipos de sonido. | | | | ✓ | | No aplica. Esta medida se ejecutará al iniciar la etapa de operación del proyecto. |
| 65 | Realizar fumigaciones periódicas para disminuir la presencia de vectores adultos en la zona. | | | | ✓ | | No aplica. El proyecto se encuentra en fase de construcción, por lo que esta medida no aplica para este periodo de evaluación. |
| 66 | Eliminar posibles criaderos de mosquitos y chitras (sitios con agua estancada). | | | | ✓ | | No aplica. Esta medida podrá aplicarse al iniciar las actividades de operación del proyecto. |
| 67 | Establecer los lineamientos de comportamiento que deberán seguir los colaboradores de la empresa, previo a la contratación del personal; principalmente para las actividades a | | | | ✓ | | No aplica. En este periodo de evaluación, se ejecutan las actividades de construcción; por lo que esta medida no aplica. |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| | realizar en el hotel y la marina. | | | | | | |
| 68 | Establecer un acuerdo, previo al inicio de operaciones de la marina, con los pescadores que actualmente utilizan la zona; sobre los derechos y deberes a cumplir por todas las partes involucradas. | | | | ✓ | | No aplica. Esta media aplicará en la etapa de operación. |
| 69 | Nombrar a un personal que se encargue de divulgar las actividades y dar respuesta a las inquietudes que surjan por parte de la población sobre las acciones y trabajos que se desarrollen en el proyecto. | | | | ✓ | | No aplica. Durante el periodo que abarca los meses de febrero a julio de 2019, se realizan actividades de construcción. |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| 70 | Mantener un registro de atención de quejas, donde se describan los datos más relevantes de la atención brindada para la resolución de los posibles conflictos. | | | | ✓ | | No aplica. Esta medida aplicará al dar inicio la etapa de operación. |

Fuente: CODESA, 2019. Leyenda: En ejecución: Comprende aquellas medidas que son de ejecución continua durante la vida del proyecto. Ejecutada: Comprende aquellas medidas que se cumplen con o en una actuación concreta. No ejecutada: Comprende aquellas medidas que no se implementan o no se cumplen correctamente. No aplica: Comprende aquellas medidas cuyo tiempo de ejecución no corresponde a la etapa actual del proyecto o al tipo de actividades que el mismo realiza.

5.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN EN LA RESPUESTA A LA NOTA DIEORA-DEIA-AC-0092-1504-16

En la tabla 4 se puntualizan las medidas de prevención, mitigación y compensación establecidas en la Respuesta a la Nota DIEORA-DEIA-AC-0092-1504-16.

Tabla 4. Medidas contempladas en Respuesta a la Nota DIEORA-DEIA-AC-0092-1504-16

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| 1 | Presentar un Plan de Reforestación que incluya la servidumbre de la quebrada Aguas Blancas y el Río Hato; aguas arriba del área que será canalizada. Este se elaborará considerando las Resoluciones AG 0151-2000 y AG-0613-2009 ^[1] . | | | ✓ | | 100% | <p>Ejecutada.</p> <p>En el anexo 3.15 del Cuarto Informe de Seguimiento, febrero – julio de 2018; se adjunta el plan de reforestación, presentado por el proyecto.</p> <p>El Plan de Reforestación y Arborización se elaboró cumpliendo con lo establecido por las Resoluciones AG 0151-2000 y AG-0613-2009.</p> <p>No se tomó en cuenta la evaluación de la Quebrada Aguas Blancas (Agua Claras) en este periodo, debido a que fue excluida del Seguimiento del Proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”, a través de la Resolución de Modificación DEIA-IAM-015-2019.</p> |

^[1] Por la cual se aprueba y adopta en todas sus partes la Guía Metodológica para Desarrollar Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) y Planes Operativos Anuales (POA) en Bosques Tropicales, para el trámite de solicitudes de aprovechamientos forestales sostenibles.

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| 2 | Realizar el pago de la indemnización ecológica establecida en la Resolución AG-0235-2004. | | | ✓ | | 100% | Ejecutada. En el anexo 2.3 del Primer Informe de Seguimiento, agosto de 2016 - enero de 2017, se adjunta el comprobante de pago de la indemnización ecológica con número 2012387 del 10 de febrero de 2017; así como la Resolución de aprobación de la tala No. DRCC-004-2017 del 18 de enero de 2017. |
| 3 | Realizar aporte técnico o apoyo en insumos, para el desarrollo de la Alianza por el Millón de Hectáreas. | | | | ✓ | | No aplica. Esta medida fue eliminada por la Resolución DEIA-IAM-015-2019, que modifica lo previamente establecido en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto "Agro Playa Blanca Fase II". En el anexo 3.4 del Tercer Informe de Seguimiento, agosto de 2017 – enero de 2018; se adjuntó la participación de la empresa promotora en el desarrollo de la Alianza por el Millón de Hectáreas. |
| 4 | Elaborar y ejecutar un Plan de Rescate y Reubicación, de los propágulos de mangle y | | | | ✓ | | No aplica. Esta medida fue eliminada por la Resolución DEIA-IAM-015-2019, que modifica lo |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | juveniles, que se encuentran en el área a ser intervenida. | | | | | | <p>previamente establecido en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto "Agro Playa Blanca Fase II".</p> <p>Cabe destacar que en el anexo 2.6 del Primer Informe de Seguimiento, agosto de 2016 - enero de 2017; se adjuntó el Plan de Rescate y Reubicación de Flora, que incluye la reubicación de propágulos y juveniles en la servidumbre del Río Hato y en el anexo 3.1 del Segundo Informe de Seguimiento, febrero – julio de 2017, se adjuntó la nota de aprobación de dicho plan.</p> |
| 5 | Elaborar y ejecutar un Plan de Rescate y Reubicación de fauna acuática; cuando se realice el desvío de la quebrada | | | | ✓ | | <p>No aplica.</p> <p>Esta medida fue eliminada por la Resolución DEIA-IAM-015-2019, que modifica lo previamente establecido en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto "Agro Playa Blanca Fase II".</p> <p>Sin dejar de mencionar, en el anexo 2.5 del Primer Informe de Seguimiento, agosto de 2016 – enero de 2017; se adjuntó el Plan de Rescate y Reubicación de Fauna, que incluye la reubicación de fauna acuática.</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| 6 | Restaurar el ecosistema existente aguas arriba del proyecto, con la plantación y seguimiento de 1 ha de plántones de mangle en las riberas del Río Hato. | | | | ✓ | | No aplica. Esta medida fue eliminada por la Resolución DEIA-IAM-015-2019, que modifica lo previamente establecido en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, del proyecto "Agro Playa Blanca Fase II". |

Fuente: CODESA, 2019. Leyenda: En ejecución: Comprende aquellas medidas que son de ejecución continua durante la vida del proyecto. Ejecutada: Comprende aquellas medidas que se cumplen con o en una actuación concreta. No ejecutada: Comprende aquellas medidas que no se implementan o no se cumplen correctamente. No aplica: Comprende aquellas medidas cuyo tiempo de ejecución no corresponde a la etapa actual del proyecto o al tipo de actividades que el mismo realiza.

5.3. MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN DIEORA-IA-132-16

En la tabla 5 se señalan las medidas obligatorias que establece la Resolución DIEORA-IA-132-16, aprobada previamente por el Ministerio de Ambiente.

Tabla 5. Medidas que contempla la Resolución de aprobación

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| 1 | Colocar, dentro del área del Proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en formato adjunto. | | | ✓ | | 100% | Ejecutada. La imagen 42 del Quinto Informe de Seguimiento, evidencia el sitio donde fue ubicado el letrero con la información del proyecto. |
| 2 | Cumplir con la Resolución AG-0051-2008 <i>"Por la cual se reglamenta lo relativo a las especies de fauna y flora amenazadas y en peligro de extinción, y se dictan otras disposiciones"</i> . | | | ✓ | | 100% | Ejecutada. Se adjuntaron en el anexo 2.5 del Primer Informe de Seguimiento, agosto de 2016 – enero de 2017; los Planes de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna. En el anexo 3.1 del Segundo Informe de Seguimiento, febrero - julio de 2017; se adjuntaron las notas de aprobación de los Planes de Rescate y Reubicación de Fauna (DAPSV-1514-2017 del 26 de junio de 2017) y Flora (DAPVS-1083-2017 del 5 de junio de |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | | | | | | | 2017). |
| 3 | <p>Cumplir con la Resolución AG-0342-2005 “<i>Que establece los requisitos para la autorización de obras en cauce naturales y se dicta otras disposiciones</i>”. El Promotor está obligado a presentar las evidencias, resoluciones, planos aprobados y otros documentos que certifiquen el fiel cumplimiento de esta normativa en el momento que presenten sus respectivos informes de Seguimiento, fiscalización y Control de las medidas planteadas en el EsIA.</p> | | | ✓ | | 100% | <p>Ejecutada.</p> <p>En el anexo 3.6 del Cuarto Informe de Seguimiento, febrero – julio de 2018, se evidencia que la empresa promotora cuenta con la Resolución de Permiso de Obras en Cauces Naturales DRCC-AGICH N° 132-2017, del 10 de mayo de 2017 que corresponde al Río Hato. De igual manera, se adjunta la Resolución de Permiso de Obras en Cauces Naturales DRCC-AGICH N° 133-2017, del 10 de mayo de 2017, realizada para la Quebrada Aguas Claras (Aguas Blancas). Sin embargo, todo lo concerniente a la Quebrada Aguas Claras, fue eliminado por la Resolución de modificación DEIA-IAM-015-2019, del proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”.</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|
| 4 | Solicitar previo inicio de obra, los permisos de uso de agua ante DIGICH y cumplir con el Decreto Ley No.35 del 22 de septiembre de 1966. | | | ✓ | | 100% | Ejecutada. En el anexo 2.7 del Primer Informe de Seguimiento, agosto de 2016 – enero de 2017, se presentó la Resolución No. 049-2015 del 13 de agosto de 2015; para el uso de agua de los pozos No.1 y No. 2, del proyecto Agro Playa Blanca Fase II. |
| 5 | La disposición final de los desechos sólidos, deberá realizarse en un relleno sanitario debidamente autorizado. | ✓ | | | | 100% | En ejecución. En el anexo 3.2 se presentan los comprobantes de la recolección de los desechos sólidos generados en el proyecto, emitidos por la Autoridad de Aseo, la cual se encarga de efectuar la disposición final en el relleno sanitario autorizado. |
| 6 | Presentar, previo al inicio de actividades, para su evaluación y aprobación ante DIGICH, el Plan de Reforestación por compensación (sin fines de aprovechamiento), cuya implementación será monitoreada por la Dirección Regional de | | | ✓ | | 100% | Ejecutada. Tal cual como lo establece la medida, previo al inicio de las actividades, la empresa promotora presentó el Plan de Reforestación y Arborización del proyecto; el cual fue aprobado DRPO-AGICH-1339-2017 (ver anexo 3.2 del Segundo Informe de Seguimiento, febrero - julio de 2017) |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | Coclé. | | | | | | |
| 7 | Efectuar el pago en concepto de indemnización ecológica, de conformidad con la resolución No. AG-0235-2003, del 12 de junio de 2003, para lo que contará con (30) días hábiles, una vez la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Coclé establezca el monto. | | | ✓ | | 100% | Ejecutada. En el anexo 2.3 del Primer Informe de Seguimiento, agosto de 2016 - enero de 2017, se adjuntó el comprobante de pago de la indemnización ecológica con número 2012387 del 10 de febrero de 2017; así como la Resolución de aprobación de la tala No. DRCC-004-2017 del 18 de enero de 2017. |
| 8 | Contar previo inicio de obras, con la aprobación del Plan de Rescate y Reubicación de Fauna y Flora Silvestre aprobado por la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente, conforme a las disposiciones de la | | | ✓ | | 100% | Ejecutada. En el anexo 2.5 del Primer Informe de Seguimiento, agosto de 2016 – enero de 2017; se adjuntaron los Planes de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna. En el anexo 3.1 del Segundo Informe de Seguimiento, febrero - julio de 2017, se adjuntaron las notas de aprobación de los |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | Resolución AG-0292-2008. La misma debe ser incluida en el primer informe de seguimiento. | | | | | | Planes de Rescate y Reubicación de Fauna (DAPSV-1514-2017 del 26 de junio de 2017) y Flora (DAPVS-1083-2017 del 5 de junio de 2017). |
| 9 | Previo inicio de obras, el promotor deberá presentar la línea de alta marea ordinaria actual, establecida por la autoridad competente, que respalde la ubicación o conformación de los lotes contiguos a la ribera del Océano Pacífico, a la Dirección de Protección de la Calidad Ambiental y a la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente para su revisión. | | | ✓ | | 100% | Ejecutada. En el anexo 3.14 del Tercer Informe de Seguimiento, agosto de 2017 – enero de 2018; se adjunta el documento que presenta la línea de alta marea ordinaria actual, por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. |
| 10 | Presentar ante el Ministerio de Ambiente, cualquier modificación, adición o cambio de las técnicas y/o medidas que no estén contempladas | ✓ | | | | 100% | En ejecución. En el anexo 3.12 se presenta la resolución IAM-015-2019 de 10 de mayo de 2019, por medio de la cual se aprueba la solicitud de modificación del EsIA Cat III; el cual consiste en |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, con el fin de verificar si se precisa la aplicación de las normas establecidas para tales efectos en el Decreto Ejecutivo No. 123 del 14 de agosto de 2009. | | | | | | realizar ajuste al diseño del proyecto al excluir del EsIA, el desvío de la quebrada Aguas Blanca (Agua Clara); así como los impactos y medidas de mitigación propuesta para la ejecución del mismo, ya que se instalará una tubería pluvial paralelamente al borde Este y canal a la entrada de la Marina. |
| 11 | Presentar ante la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Coclé, cada seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la presente resolución administrativa, durante la construcción y la etapa operativa del proyecto, un informe sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, un (1) ejemplar original impreso y tres (3) copias en formato digital (CD), de | ✓ | | | | 100% | <p>En ejecución.</p> <p>Agro Playa Blanca, S.A. presentó ante la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente-Sede Central, el Quinto Informe de Seguimiento sobre la Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación del Plan de Manejo Ambiental y la Resolución DIEORA-IA-132-16, un (1) ejemplar original impreso y tres (3) copias en formato digital (CD); de acuerdo con lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental, en las respuestas a las Ampliaciones y en la Resolución.</p> <p>En el anexo 3.11 se adjunta el acuse de recibido ante MiAMBIENTE, del Quinto Informe de Seguimiento, Febrero – Julio de 2018.</p> |

| N° | Medidas de Mitigación | En Ejecución | No Ejecutada | Ejecutada | No Aplica | Porcentaje de Ejecución del Cumplimiento | Observaciones |
|----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|--|---|
| | acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental, en las respuestas a las Ampliaciones y en esta Resolución. Este informe deberá ser elaborado por un profesional idóneo e independiente de El Promotor del Proyecto. | | | | | | El presente documento corresponde al Sexto Informe de Seguimiento sobre la Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación del Plan de Manejo Ambiental y la Resolución DIEORA-IA-132-16, que comprende al periodo de febrero a julio de 2019, cumpliendo así con la documentación solicitada, y con la elaboración por parte de un personal idóneo. |

Fuente: CODESA, 2019. Leyenda: En ejecución: Comprende aquellas medidas que son de ejecución continua durante la vida del proyecto. Ejecutada: Comprende aquellas medidas que se cumplen con o en una actuación concreta. No ejecutada: Comprende aquellas medidas que no se implementan o no se cumplen correctamente. No aplica: Comprende aquellas medidas cuyo tiempo de ejecución no corresponde a la etapa actual del proyecto o al tipo de actividades que el mismo realiza.

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PROMOTOR

6.1. CONCLUSIÓN

El proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”, desarrolla la fase de construcción, dentro del periodo de evaluación que comprende los meses de febrero a julio de 2019; lo que incluye actividades de movimiento y nivelación de tierra, para la edificación del complejo residencial turístico.

De acuerdo con esto, de las medidas planteadas en el Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental y en la Resolución que lo aprueba, el 36% no aplican para esta etapa del proyecto, un 46% se encuentra en ejecución, el 16% están ejecutadas y el 2% no ha sido ejecutado.

Es importante mencionar que, de las 87 medidas, 55 son aplicables a las actividades que realiza el proyecto “Agro Playa Blanca Fase II” dentro del periodo de evaluación, por lo que mantiene una efectividad de ejecución del 95%.

6.2. RECOMENDACIONES

- Continuar con la elaboración de los informes requeridos en la Resolución DIEORA-IA-132-16, que aprueba el EsIA del proyecto.
- Mantener la recopilación de las evidencias de las medidas que se vayan ejecutando en las diferentes etapas del proyecto.
- Construir los cajones pluviales para movilizar las aguas por escorrentía.
- Instalar barreras de control de sedimentos en el Río Hato.
- Colocar en el proyecto letreros que indiquen la prohibición del depósito de desperdicios y residuos en lugares no apropiados.
- Establecer programa de capacitaciones para todos los subcontratistas presentes en el proyecto.
- Colocar letreros sobre la prohibición de mantener las maquinarias encendidas mientras estas no son utilizadas.
- Adecuar con las condiciones requeridas, el área que se utiliza en el proyecto para realizar la revisión de las maquinarias.

7. BIBLIOGRAFÍA

- ANAM (Autoridad Nacional del Ambiente). 1998. Artículo 4. Ley Nº 41. Ley General de Ambiente. Panamá.
- ANAM (Autoridad Nacional del Ambiente). 1994. Ley 1 de 3 de febrero de 1994. Por el cual se establece la Legislación Forestal en la Republica de Panamá y se dictan otras disposiciones.
- CODESA, S.A. 2015. Estudio de Impacto Ambiental Categoría III “Agro Playa Blanca III”. Panamá.

- Corporación de Desarrollo Ambiental S.A. 2017. Primer Informe de Seguimiento sobre la Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación del Plan de Manejo Ambiental y la Resolución DIEORA-IA-132-2016.
- Corporación de Desarrollo Ambiental S.A. 2017. Segundo Informe de Seguimiento sobre la Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación del Plan de Manejo Ambiental y la Resolución DIEORA-IA-132-2016.
- Corporación de Desarrollo Ambiental S.A. 2018. Tercer Informe de Seguimiento sobre la Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación del Plan de Manejo Ambiental y la Resolución DIEORA-IA-132-2016.
- Corporación de Desarrollo Ambiental S.A. 2018. Cuarto Informe de Seguimiento sobre la Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación del Plan de Manejo Ambiental y la Resolución DIEORA-IA-132-2016.
- Corporación de Desarrollo Ambiental S.A. 2019. Quinto Informe de Seguimiento sobre la Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación del Plan de Manejo Ambiental y la Resolución DIEORA-IA-132-2016.
- MiAmbiente (Ministerio de Ambiente). 2016. Resolución DIEORA IA-132-16 del 4 de agosto de 2016, mediante la cual se aprueba el desarrollo del proyecto “Agro Playa Blanca II”. Panamá.
- MEF (Ministerio de Economía y Finanzas). 2009. Decreto Ejecutivo 123. Por el cual se reglamenta el Capítulo II del Título IV de la Ley 41 del 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá y se deroga el Decreto Ejecutivo 209 de 2006. República de Panamá. Publicado en la Gaceta Oficial núm. 26352, 24 de agosto de 2009.
- MEF (Ministerio de Economía y Finanzas). 2009. Decreto Ejecutivo No.5 del 4 de febrero de 2009. Normas Ambientales de Emisiones de Fuentes Fijas.
- MICI (Ministerio de Comercio e Industrias). 2000. Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45-200. Higiene y Seguridad Industrial. Condiciones de Higiene y Seguridad en Ambientes de Trabajo donde se generen Vibraciones. República de Panamá. Gaceta Oficial 24163, miércoles 18 de octubre de 2000. pp. 8-18.
- MICI (Ministerio de Comercio e Industria). 2000. Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000. Higiene y seguridad Industrial.

- MICI (Ministerio de Comercio e Industrias). 2001. Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 que adopta el Reglamento para la Higiene y Seguridad Industrial para el Control de la Contaminación Atmosférica en Ambientes de Trabajo Producidas por Sustancias Químicas.
- MINSA (Ministerio de Salud). 2002. Decreto Ejecutivo 306 del 04 de septiembre de 2002. Que adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, aéreas residenciales o de habitación, así como en ambientes laborales.
- MINSA (Ministerio de Salud). 2004. Decreto Ejecutivo No 1 de 15 de enero de 2004, por el cual se determina los niveles de ruido, para las áreas residenciales e industriales.


8. ANEXOS

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Esta sección tiene como propósito, sustentar la implementación y la calificación de las medidas que establece el Plan de Manejo Ambiental, y la Resolución aprobatoria del proyecto "Agro Playa Blanca Fase II".

Medida de mitigación 1: *Prohibir el depósito de desperdicios y residuos sólidos en lugares no apropiados (canales pluviales, calles y/o vías).*

Durante el recorrido en el área del proyecto, se observó que las vías, calles y canales pluviales internos del proyecto; se mantienen libres de desperdicios y residuos.

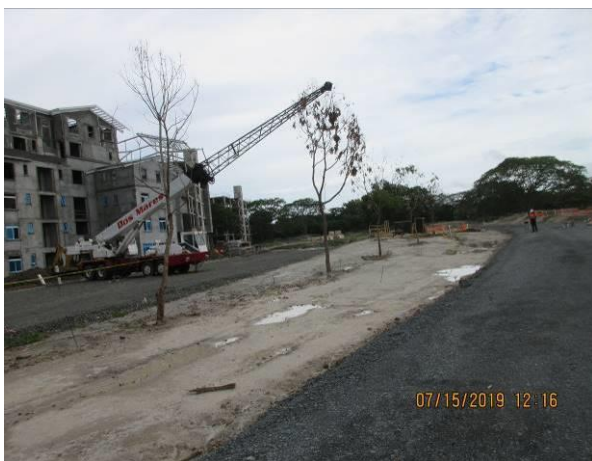

Imágenes 1 y 2. Vías y canales pluviales libres de desechos

Medida de Mitigación 2: *Depositar los desechos de tipo doméstico en bolsas plásticas resistentes o cestos de basura con tapa.*

En distintas áreas del proyecto, se han ubicado recipientes con bolsas y tapas, para la disposición de desechos sólidos. Sin embargo, también se identificaron recipientes sin tapadera, ni bolsa plástica.



Imágenes 3 y 4. Visa de los recipientes para acopio de los desechos generados en el proyecto



Imagen 5. Desechos domestico colocadas dentro bolsas plásticas



Imagen 6. Vista de los recipientes sin tapaderas

Medida de Mitigación 3: *Establecer un lugar de acopio en el área de construcción, donde se dispongan temporalmente los desechos sólidos, a fin de evitar la acumulación de desechos sólidos que queden a la intemperie.*

Durante la inspección se evidenció el lugar para el acopio del material de construcción, el cual es recogido periódicamente.



Imágenes 7 y 8. Vista del personal y maquinaria recolectando los desechos de construcción



Imagen 9. Vista de la recolección de los desechos de construcción

Medida de Mitigación 6: *Contar con un kit para el control de derrames (paños, materiales particulados u otros); que permitan la fácil remoción y control de pequeñas fugas de combustible que puedan presentarse de la maquinaria que se utilice en el proyecto.*

Tal cual como se muestra en la imagen 10 el proyecto cuenta con paños absorbentes en caso de darse algún derrame; cabe indicar que se evidenció que una retroexcavadora mantenía un paño absorbente en mal estado (ver imagen 11).



Imagen 10. Kit antiderrame cuenta el proyecto



Imagen 11. Paño absorbente en mal estado

Medida de Mitigación 7: *Contratar a una empresa que brinde el servicio de instalación y mantenimiento de sanitarios portátiles, que acredite la disposición final y segura de los desechos líquidos generados por las actividades fisiológicas de los trabajadores.*

La promotora y sus contratistas, han subcontratado diversas empresas para la instalación y mantenimiento de sanitarios portátiles; como lo muestran las siguientes imágenes. Además, han construido letrinas fijas para uso del personal.



Imágenes 12 y 13. Sanitarios portátiles de la empresa RE (renta equipos) y Selepsa



Imágenes 14 y 15. Vista de los sanitarios portátiles Aluma Systems y letrinas utilizadas en el proyecto

Medida de Mitigación 8: *Colocar cajones pluviales para que los líquidos, producto de las actividades de limpieza del área de construcción, no rieguen de manera descontrolada hacia las alcantarillas o vías más cercanas.*

Las imágenes a continuación muestran los tragantes y el cabezal de descarga final del sistema de alcantarillado pluvial, construido durante este periodo; en el proyecto Agro Playa Blanca Fase II.



Imágenes 16 y 17. Vista de los tragantes pluviales construidos durante este periodo



Imágenes 18 y 19. Vista de las tuberías y cabezales de descarga pluvial

Medida de Mitigación 10: *Verificar que los trabajos de dragado u movimiento de tierra no abarquen más de la capacidad que se establece en el diseño para la marina.*

Las imágenes 20 y 21 muestran el vado temporal construido durante este periodo de evaluación, según información suministrada por la promotora, para el transporte de material de un margen del Río Hato al otro.



Imágenes 20 y 21. Vado temporal construido en la desembocadura del Río Hato

Medida de Mitigación 12: *Revegetar las zonas que queden desprovistas de vegetación, con especies de rápido crecimiento y de preferencia herbáceas.*

En el área de desarrollo del proyecto, se ha efectuado la plantación de palmas y árboles; como lo muestran las imágenes siguientes.



Imágenes 22 y 23. Vistas de palmas y árboles plantados en el área del proyecto

Medida de Mitigación 15: *Instalar barreras de control de sedimentos en las márgenes de los cuerpos de agua superficial (Quebrada Aguas Blancas y Río Hato), principalmente durante el movimiento de tierra.*

Durante la inspección, se evidenció a través de las siguientes imágenes, el arrastre de sedimentos producto del movimiento de tierra en el proyecto y las repetidas lluvias de la época.



Imágenes 24 y 25. Erosión y arrastre de sedimentos en la desembocadura del Río Hato

Medida de Mitigación 16: *Exigir a los contratistas que los camiones que transporten suelo y materiales como arena, o cualquier otro material particulado; utilicen lonas cuando circulen por las vías públicas.*

Los camiones volquetes utilizados para las actividades de construcción del proyecto, cuentan con lona de protección. Debido a su uso dentro del proyecto, no hacen uso de estas.



Imagen 26 y 27. Vista de los camiones volquete con su respectiva lona de protección

Medida de Mitigación 18: *Proporcionar mascarillas de seguridad adecuados al tipo de partículas, en los lugares donde se genere material particulado, que pueda afectar la salud de los trabajadores.*

Uno de los contratistas presentó durante la inspección, las mascarillas de seguridad a disposición del personal; sin embargo, se observó personal realizando actividades de carpintería sin protección respiratoria.



Imágenes 28 y 29. Personal expuesto a material particulado sin protección respiratoria y mascarillas disponibles en uno de los almacenes del proyecto


|  | | <div style="text-align: center;"> REGISTRO DE EXTENSIÓN DE TIEMPO DE PROTECTOR PERSONAL BAJA CALIFORNIA SUR EMPRESA: COMSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A </div> | | | |
|---|-------------------|---|--------------|--------------------|--|
| DATOS PERSONALES | | ELABORADO POR PROTECTOR PERSONAL | | | |
| NOMBRE | CEDULA | DIAS | FECHA | FIRMA | |
| JOSUE MORA | 8.896.1428 | ✓ | 15-7-2019 | <i>[Signature]</i> | |
| JUAN SEGUNDO | 2.152.582 | ✓ | 15-7-2019 | <i>[Signature]</i> | |
| RODOLFO MORA | 8.842.755 | ✓ | 17/7/2019 | <i>[Signature]</i> | |
| ANTONIO GONZALES | 2.728.1265 | ✓ | 17/7/2019 | <i>[Signature]</i> | |
| MARCELO SANCHEZ | 2.707.661 | ✓ | 17/7/2019 | <i>[Signature]</i> | |
| FRANCIS DE LA CRUZ | 2.727.564 | ✓ | 17-7-2019 | <i>[Signature]</i> | |
| CARDENAS | 8.581.1429 | ✓ | 16-7-2019 | <i>[Signature]</i> | |
| CEDELA | 2.718.1065 | ✓ | 16-7-2019 | <i>[Signature]</i> | |
| NOMBRE | | MASCARILAS | FECHA | FIRMA | |
| JOSUE MORA | 8.896.1428 | | | | |
| JUAN SEGUNDO | 2.152.582 | | | | |
| RODOLFO MORA | 8.842.755 | | | | |
| ANTONIO GONZALES | 2.728.1265 | ✓ | | | |
| MARCELO SANCHEZ | 2.707.661 | | | | |
| FRANCIS DE LA CRUZ | 2.727.564 | | | | |

Imagen 30. Registro de entrega de protección respiratoria

Medida de Mitigación 22: *Utilizar los vehículos y equipos únicamente cuando sean necesarios y durante la jornada laboral que se establezca, para la construcción del Proyecto.*

La imagen 31 muestra a una de las maquinarias encendidas, con su operador lejos de ella.



Imagen 31. Retroexcavadora encendida sin ser utilizada

Medida de Mitigación 30: *Dotar y exigir a los trabajadores el uso de equipo de protección acústica (tapones u orejeras); cuando sea necesario, de acuerdo con la actividad.*

En distintos puntos del proyecto, se observan letreros indicando el uso obligatorio de equipo de protección personal; igualmente, se observó al personal utilizando el equipo de protección acústica.



Imágenes 32 y 33. Letreros de uso obligatorio de protección personal



Imágenes 34 y 35. Letreros de uso obligatorio de protección personal



Imágenes 36 y 37. Tapones auditivos y orejeras a disposición de los trabajadores I

Medida de Mitigación 31: Capacitar a los trabajadores sobre la importancia en el uso de los equipos de protección personal.

Durante la inspección se verifico el registro y temas de capacitación de algunas de las subcontratistas

| EVIDENCIA DE REGISTRO | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|---------------|
| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO/FUNCION |
| 01 | Andrés Dávila | 2.700.000 | Aplicador |
| 02 | Andrés Dávila | 2.700.000 | Aplicador |
| 03 | Andrés Dávila | 2.700.000 | Aplicador |
| 04 | Andrés Dávila | 2.700.000 | Aplicador |
| 05 | Andrés Dávila | 2.700.000 | Aplicador |
| 06 | Andrés Dávila | 2.700.000 | Aplicador |
| 07 | Andrés Dávila | 2.700.000 | Aplicador |
| 08 | Andrés Dávila | 2.700.000 | Aplicador |
| 09 | Andrés Dávila | 2.700.000 | Aplicador |
| 10 | Andrés Dávila | 2.700.000 | Aplicador |

15/07/2019 14:37

Imagen 38. Registro de capacitación de la empresa COSISA

Medida de Mitigación 49: *Fumigar periódicamente para disminuir la presencia de vectores adultos en la zona.*

Las imágenes 39 y 40 muestra el certificado de fumigación otorgado a la contratista del proyecto, Ingeniería Lara.



Imágenes 39 y 40. Vista del certificado de fumigación

ANEXO 2. INFORMES DE INSPECCIONES AMBIENTALES

ANEXO 2.1. INFORME DE INSPECCIÓN DE RUIDO DE AMBIENTAL



Informe de Inspección de Ruido Ambiental

Proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”

Preparado para:
Agro Playa Blanca, S.A.



Julio, 2019

Informe de Inspección de Ruido Ambiental

Proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”

Preparado para:
Agro Playa Blanca, S.A.





Elaborado por:



N° SC-CER139957



Junio, 2019

|  CORPORACION DE DESARROLLO AMBIENTAL, S.A. | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|--|---|--|---|
| |  |  |  |
| | Responsable | Control de calidad | Director Técnico |
| Idoneidad DIVEDA-AA-003-2012/ Act. 2018 | Ada Díaz C.I.N° 2019-120-020 | Roy Quintero C.T. N° 867 | Venicia Cerrud C.T. N° 597 |

Índice

| | |
|---|----|
| 2.1.1. Introducción | 4 |
| 2.1.2. Objetivo general | 4 |
| 2.1.3. Objetivos específicos | 4 |
| 2.1.4. Metodología | 5 |
| 2.1.4.1. Coordinación con la empresa promotora | 5 |
| 2.1.4.2. Metodología para la medición de ruido ambiental | 5 |
| 2.1.4.2.1 Metodología para la medición de ruido ambiental en área residencial (ISO 1996-2: 2007) | 5 |
| 2.1.4.2.2 Metodología para la medición de ruido ambiental en ambiente laboral (ANSI S12 19-1996) . | 6 |
| 2.1.4.3. Especificaciones técnicas del equipo y datos sobre las mediciones | 6 |
| 2.1.4.4. Estimación de la incertidumbre de la medición | 7 |
| 2.1.5. Resultados | 8 |
| 2.1.6. Declaración de conformidad | 12 |
| 2.1.7. Recomendaciones | 12 |
| 2.1.8. Bibliografía | 12 |
| Anexos | 14 |
| Anexo 2.1.1. Registro de imágenes | |
| Anexo 2.1.2. Data generada por el equipo de medición | |
| Anexo 2.1.3. Extracto de las Normas para ruido ambiental en Panamá | |
| Anexo 2.1.4. Estimación de la incertidumbre de medición | |
| Anexo 2.1.5. Certificado de calibración del equipo de medición | |
| Anexo 2.1.6. Hojas de campo | |

2..1.1. Introducción

El ruido es el conjunto de fenómenos vibracionales aéreos, percibidos e integrados por el sistema auditivo, que provocan en el receptor una reacción de rechazo (Flores 2007).

El ruido fondo o ambiental se define como los sonidos medidos o percibidos sin distinguir la fuente de ruido, motivo del estudio o a medir (MINSA 2002).

En el año 1972 se celebró el Congreso Mundial del Medio Ambiente de Estocolmo, organizado por las Naciones Unidas, desde entonces el ruido fue declarado como contaminante. Según las definiciones generales del momento, un contaminante es aquel agente que puede afectar adversamente a la salud y el bienestar de las personas; al pleno uso y disfrute de la propiedad. Es un agente contaminante fácil de producir.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el término salud hace referencia al “estado de completo bienestar físico, mental y social”. En base a esa definición y de acuerdo a lo referenciado anteriormente, el ruido ambiental puede producir efectos adversos a la salud; entre éstos se encuentran la interferencia en la comunicación, disturbios en el descanso y en el sueño; efectos en el sistema cardiovascular, efectos psicológicos y fisiológicos; deterioro en el desempeño de tareas y cambios en el comportamiento social. En algunos casos, se llega incluso, al deterioro irreversible del sistema auditivo.

En Panamá, el Ministerio de Salud (MINSA), promulgó el Decreto Ejecutivo N° 306 del 4 de septiembre del 2002, por el cual se adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así como en ambientes laborales. Este Decreto se modificó mediante el Decreto Ejecutivo N° 1 del 15 de enero de 2004, específicamente en su artículo 7 y la palabra exclusivamente del artículo 11.

El presente informe comprende el análisis de los resultados de la inspección de ruido ambiental, realizado en el Proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”, de acuerdo a los requisitos que se establecen el Decreto Ejecutivo N° 306 del 4 de septiembre de 2002 y el Decreto Ejecutivo N° 1 del 15 de enero de 2004.

2.1.2. Objetivo general

Evaluar el nivel de ruido ambiental en el Proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”.

2.1.3. Objetivos específicos

- Identificar las posibles fuentes de ruido.
- Medir los niveles de ruido ambiental en el área del proyecto y en la residencia más cercana a este.

- Analizar los resultados de las mediciones y compararlos con los valores que establece el Decreto Ejecutivo 306 del 4 de septiembre de 2002 y el Decreto Ejecutivo 1 del 15 de enero de 2004.

2.1.4. Metodología

Para el desarrollo de las inspecciones de ruido ambiental se realizaron las siguientes actividades de forma sucesiva:

- Coordinación con la empresa promotora.
- Desarrollo de la metodología para las mediciones de ruido ambiental (ISO 1996-2: 2007 y ANSI S12 19-1996).

2.1.4.1. Coordinación con la empresa promotora

Para lograr las mediciones y la toma de datos, se efectuaron las coordinaciones con el Ingeniero Miguel Pereira.

2.1.4.2. Metodología para la medición de ruido ambiental

2.1.4.2.1 Metodología para la medición de ruido ambiental en área residencial (ISO 1996-2: 2007)

La secuencia metodológica para el desarrollo de esta medición fue:

- Inspección general del área del proyecto.
- Identificación de las principales áreas del proyecto que son influenciadas por las fuentes emisoras de ruido.
- Selección del sitio de medición.
- Ubicación geográfica de las mediciones (coordenadas UTM).
- Calibración del sonómetro (instrumento cuantitativo que mide niveles de ruido).
- Medición de los niveles de ruido, a través de un sonómetro calibrado.
- Identificación de las fuentes de ruido durante el desarrollo de las mediciones.
- Cuantificación del paso de vehículos (livianos y pesados).
- Registro de imágenes fotográficas.
- Descarga de datos.
- Estimación de la incertidumbre de las mediciones (ver anexo 5).

El sonómetro se colocó sobre un trípode, a una altura de 1.5 m, y un ángulo de 45° en dirección a la fuente emisora de ruido (ISO 1996-2: 2007).

Los parámetros obtenidos en la medición fueron: L equivalente (LAeq)¹ y LAF90².

¹ Nivel de presión sonora continua equivalente.

² El nivel de ruido con ponderación 'A' excedido por un 90% de la medición, calculado por análisis estadístico desde muestras del nivel de ruido con ponderación temporal Rápida o 'F'.

Las mediciones se realizaron en la residencia más cercana al Proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”, durante un período de 10 minutos (horario diurno) cada medición, en un intervalo de 40 minutos para 4 mediciones de ruido, en un horario desde las 3:18 p.m. a las 4:26 p.m. del 18 de julio de 2019.

2.1.4.2.2 Metodología para la medición de ruido ambiental en ambiente laboral (ANSI S12 19-1996)

La secuencia metodológica para el desarrollo de esta medición fue:

- Inspección general del área del proyecto.
- Identificación de las principales áreas del proyecto que son influenciadas por las fuentes emisoras de ruido.
- Selección del sitio de medición.
- Ubicación geográfica de la medición (coordenadas UTM).
- Calibración del sonómetro (instrumento cuantitativo que mide niveles de ruido).
- Medición de los niveles de ruido, a través de un sonómetro calibrado.
- Identificación de las fuentes de ruido durante el desarrollo de las mediciones.
- Registro de imágenes fotográficas.
- Registro de los niveles de ruido medidos en frecuencias de banda 1/1 Octava.
- Descarga de datos.

El sonómetro se colocó sobre un trípode, a una altura de 1.5 m, y un ángulo de 45º en dirección a la fuente emisora de ruido.

El parámetro obtenido en la medición fue: L equivalente (LAeq)³.

La medición se realizó el 18 de julio de 2019 en el área del Proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”, específicamente Frente al edificio 200, durante horario diurno.

2.2.4.3. Especificaciones técnicas del equipo y datos sobre las mediciones

En la tabla 1 se presentan las especificaciones técnicas del equipo que se utilizó y los datos generados por las mediciones, incluyendo las normativas panameña aplicables.

³ Leq, t de Bandas de Octava ponderadas en A.

Tabla 1. Especificaciones técnicas del equipo y datos sobre las mediciones

| Equipo empleado | Sonómetro |
|--------------------------------|---|
| Fabricante | Cirrus |
| Modelo | CR: 171B |
| Serie | G079527 |
| Fecha de la última calibración | 12 de marzo de 2019 |
| Escala | A |
| Respuesta | Rápida |
| Metodología | ISO 1996-2:2007 |
| Normativa aplicable | Decreto Ejecutivo 306 del 4 de septiembre de 2002 |
| | Decreto Ejecutivo 1 del 15 de enero de 2004 |
| Fecha de la medición: | 18 de julio de 2019 |
| Turno (horario diurno) | Familia De La Guardia (casa más cercana al proyecto): 40 minutos de medición (efectuado en un horario de 3:18 p.m. a 4:16 p.m.) en intervalos de 10 minutos. – Período diurno |
| | Frente al edificio 200: 10 minutos de medición (efectuado en un horario de 9:54 a.m. y 10:04 a.m.) – Período diurno |
| Ubicación | Familia De La Guardia (casa más cercana al proyecto) 922134 N/ 592349 E |
| | Frente al edificio 200 922323 N/ 592078 E |
| Inspectores | Yeleinshka Yaleman |
| Persona de contacto | |
| Nombre | Miguel Pereira |
| Teléfono | 6983-9191 |
| Correo electrónico | mpereira@marazul.com.pa |
| Fecha de emisión | 19-8-2019 |

Fuente: Especificaciones técnicas del equipo. CODESA, 2019. Ver las normas nacionales para ruido ambiental y el certificado de calibración en los anexos 3 y 4.

2.1.4.4. Estimación de la incertidumbre de la medición

La incertidumbre en la medida se expresa como una incertidumbre expandida basada en una combinación de incertidumbres estándar multiplicada por un factor de cobertura de 2, proporcionando una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95% (Norma ISO 1996-2:2007).

a) Incertidumbre debida a la instrumentación

Representa la influencia que ejercen los distintos operadores y equipos en el mismo lugar bajo unas condiciones cortantes.

b) Incertidumbre debida a las condiciones de operación

Constituye las variaciones en las condiciones de tráfico rodado que ejercen influencia en los resultados.

c) Incertidumbre debida al clima y al suelo

Depende de la distancia de medición y de las condiciones meteorológicas, tomando en cuenta el radio de curvatura R.

d) Incertidumbre debida al sonido residual

La incertidumbre varía dependiendo de la diferencia entre los valores totales medidos y el sonido residual (ver anexo 5).

2.1.5. Resultados

El resultado obtenido en las mediciones efectuadas en el punto denominado Familia De La Guardia (casa más cercana al proyecto), se presenta en la tabla 2, y en las gráficas 1 y 2.


- Las fuentes de ruido identificadas, provenientes de la casa más cercana al proyecto, fueron: ruido de aves, corta grama y trabajos manuales. Mientras que se identificó como fuente de ruido proveniente del proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”: paso de vehículos livianos y pesados.

Tabla 2. Resultados de las mediciones de ruido ambiental en la residencia más cercana al proyecto

| Sitio de Inspección | Horario de Medición | Leq. dB(A) | L90 dB(A) | Promedio Leq dB(A) |
|--|-----------------------|------------|-----------|--------------------|
| Familia De La Guardia (casa más cercana al proyecto) | 3:18 p.m. a 3:28 p.m. | 66.8 | 50.7 | 61.43 |
| | 3:29 p.m. a 3:39 p.m. | 54.2 | 44.9 | |
| | 3:40 p.m. a 3:50 p.m. | 51.0 | 44.8 | |
| | 4:06p.m. a 4:16 p.m. | 55.8 | 45.3 | |

Fuente: Datos de campo. CODESA, 2019.

Gráfica 1. Resultados de la inspección de Ruido Ambiental – Familia De La Guardia (casa más cercana al proyecto)



Fuente: Datos de campo CODESA, 2019. Valor normado para otros trabajos (60 dB(A)). Decreto Ejecutivo 1 del 15 de enero de 2004. Valor normado para niveles máximos de ruido en áreas residenciales e industriales.

La tabla 3 presenta el valor promedio de las mediciones de ruido ambiental y la incertidumbre expandida aplicada a este resultado.

Tabla 3 Valor promedio de ruido ambiental y valor de incertidumbre expandida

| Sitio de Inspección | Horario de Medición | Leq. dB(A) | Promedio Leq dB(A) | ⁴ Incertidumbre (k = 95%) | Valor Normado dB(A) |
|--|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Familia De La Guardia (casa más cercana al proyecto) | 3:18 p.m. a 3:28 p.m. | 66.8 | 61.43 | ±5.89 | 60 ⁵ |
| | 3:29 p.m. a 3:39 p.m. | 54.2 | | | |
| | 3:40 p.m. a 3:50 p.m. | 51.0 | | | |
| | 4:06p.m. a 4:16 p.m. | 55.8 | | | |

Fuente: Datos de campo CODESA, 2019.

El valor resultante obtenido en las mediciones efectuadas en el punto de inspección denominado Frente al edificio 200, se presenta en la tabla 4, y en la gráfica 2.

⁴ Estimación de la incertidumbre sugerida por la Norma ISO 1996-2:2007 Acústica - Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental - Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental.

⁵ Valor normado para niveles máximos de ruido en áreas residenciales e industriales (60 dB(A) en horario diurno). Decreto Ejecutivo 1 del 15 de enero de 2004.


- Las fuentes de ruido identificadas, provenientes del proyecto "Agro Playa Blanca Fase II" fueron: movimiento de tierra por retroexcavadora y paso de camión volquete cargando material.

Tabla 4. Resultados de las mediciones de ruido ambiental en el área del proyecto

| Sitio de Inspección | Horario de Medición | Banda de frecuencia (Octava 1/1) Hz | Nivel sin Ponderar dB (A) | Nivel Ponderado dB (A) | Leq dB(A) |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| Frente al edificio 200 | 9:54 a.m. a 10:04 a.m. | 31.5 | 76.1 | 36.7 | 70.3 |
| | | 63 | 84.6 | 58.4 | |
| | | 125 | 72.1 | 56.0 | |
| | | 250 | 67.6 | 59.0 | |
| | | 500 | 67.1 | 63.9 | |
| | | 1000 | 65.3 | 65.3 | |
| | | 2000 | 62.2 | 63.4 | |
| | | 4000 | 57.4 | 58.4 | |
| | | 8000 | 48.3 | 47.2 | |
| | | 16000 | 40.1 | 33.5 | |

Fuente: Datos de campo. CODESA, 2019.

Gráfica 2. Resultados de la inspección de Ruido Ambiental Frente al edificio 200 en Frecuencias de Banda 1/1 Octava

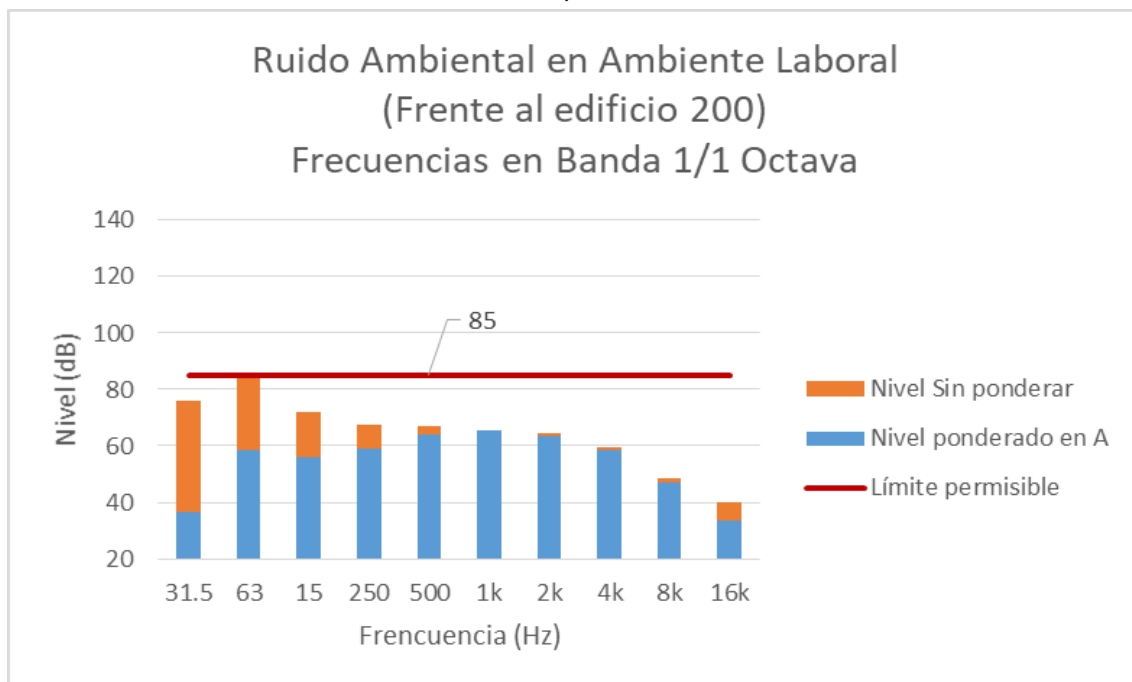

Fuente: Datos de campo CODESA, 2019. Valor normado para otros trabajos (85 dB(A)). Decreto Ejecutivo 306 del 4 de septiembre de 2002.


La tabla 5 presenta el valor Leq dB (A) de la medición de ruido ambiental en comparación con la normativa aplicable para otros trabajos.

Tabla 5. Valor resultante de la medición de ruido ambiental en el área del proyecto y valor normado

| Sitio de Inspección | Horario de Medición | Leq. dB(A) | Valor Normado dB(A) |
|------------------------|------------------------|------------|---------------------|
| Frente al edificio 200 | 9:54 a.m. a 10:04 a.m. | 70.3 | 85 ⁶ |

Fuente: Datos de campo CODESA, 2019.

Gráfica 3. Resultado de Ruido Ambiental Leq comparado con la normativa aplicable

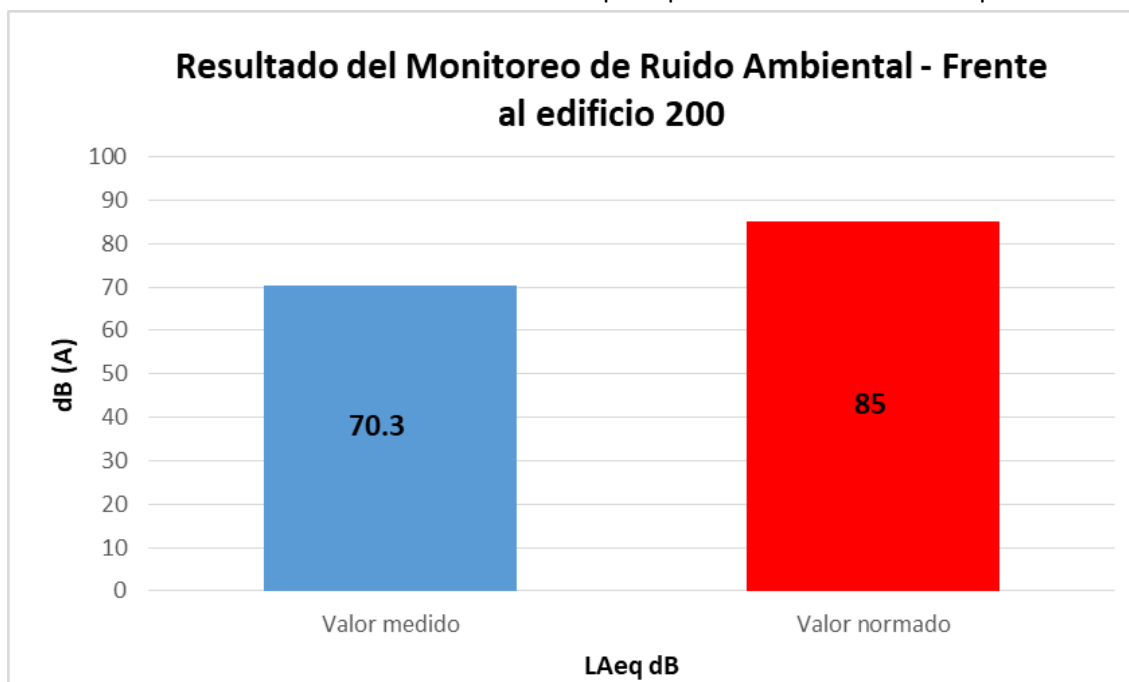

Fuente: Datos de campo CODESA, 2019. Valor normado para otros trabajos (85 dB(A)). Decreto Ejecutivo 306 del 4 de septiembre de 2002

⁶ Valor normado para otros trabajos (85 dB(A)), Decreto Ejecutivo 306 del 4 de septiembre de 2002.

2.1.6. Declaración de conformidad

Los valores resultantes de las mediciones de ruido ambiental, realizadas en la casa más cercana al proyecto (Familia De La Guardia), se encuentran por encima del límite máximo permisible establecido en el Decreto Ejecutivo 1 del 15 de enero de 2004 para horario diurno. Cabe mencionar que, durante la medición se efectuaron trabajos de jardinería y actividades manuales provenientes de la casa de la Familia De La Guardia, influyendo en la medición de ruido ambiental.

El resultado obtenido de la medición de ruido ambiental efectuada Frente al edificio 200, correspondiente al área del proyecto, se halla por debajo del límite máximo permisible que establece el Decreto Ejecutivo 306 de 4 de septiembre de 2002; donde el valor máximo para otros trabajos es de 85 dB(A), utilizado como referencia.

2.1.7. Recomendaciones

- Realizar el mantenimiento periódico a los equipos y maquinarias del proyecto.
- Continuar con las inspecciones de ruido ambiental en la residencia más cercana al proyecto para evaluar el aporte de ruido ocasionado por las actividades de construcción del proyecto, que pudiesen afectar a la población colindante.
- Continuar con las inspecciones de ruido ambiental en el área del proyecto para determinar el aporte de ruido que ocasiona al personal y residentes del área.

2.1.8. Bibliografía

- ANAM (Autoridad Nacional de Ambiente). 1998. Ley Nº 41 de 1 de julio de 1998. Ley General de Ambiente. Artículo 4. República de Panamá.
- ANSI S12.19-1996 (American National Standard Institute). 1996. MEDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE RUIDO OCUPACIONAL. Estados Unidos.
- Flores, E. 2007. El ruido y su percepción en la ciudad de Panamá. Departamento de Física. Universidad de Panamá. República de Panamá.
- MINSA (Ministerio de Salud). 2002. Decreto Ejecutivo 306 del 4 de septiembre de 2002. Control de ruido en espacios públicos, habitaciones y ambientes laborales. Artículo 3. República de Panamá.
- MINSA (Ministerio de Salud). 2004. Decreto Ejecutivo 1 del 15 de enero de 2004. Niveles de ruido para áreas residenciales e industriales. Artículo 1. República de Panamá.

- Norma Internacional ISO 1996-2:2007. 2007. Acústica - Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental - Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental.
- OMS (Organización Mundial de la Salud). 2001. Disponible en: http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/index.html.
- P., Aparicio. 2010. MÉTODO Y EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN ACÚSTICA AMBIENTAL (Caso Práctico). UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. España.

Anexos

Anexo 2.1.1. Registro de imágenes



Imágenes 1 y 2. Equipo de medición de ruido ambiental y fuente de ruido identificada (movimiento de equipos pesados) en el lugar de medición (frente al edificio 200)



Imágenes 3 y 4. Vista del equipo de medición en el punto Familia De La Guardia (casa más cercana al proyecto)



Imágenes 5 y 6. Fuentes de ruido identificadas (paso de vehículos pesados y livianos) próximas a la casa más cercana al proyecto

Anexo 2.1.2. Data generada por el equipo de medición

Data generada por el Sonómetro ubicado en el Proyecto "Agro Playa Blanca Fase II"
Frente al edificio 200

09/17/2019




Informe de Octava

Nombre RA1-Frente a Edificio 200
Tiempo 07/18/2019 9:54:33 a. m. **Persona**
Duración 00:10:00 **Lugar** Agro Playa Blanca FII
Instrumento G079527, CR:171B **Proyecto** Frente al edificio 200

Calibración

Antes 07/18/2019 9:54 a. m. **Offset** 0.20 dB **Después** 07/18/2019 10:06 a. m. **Offset** 0.26 dB

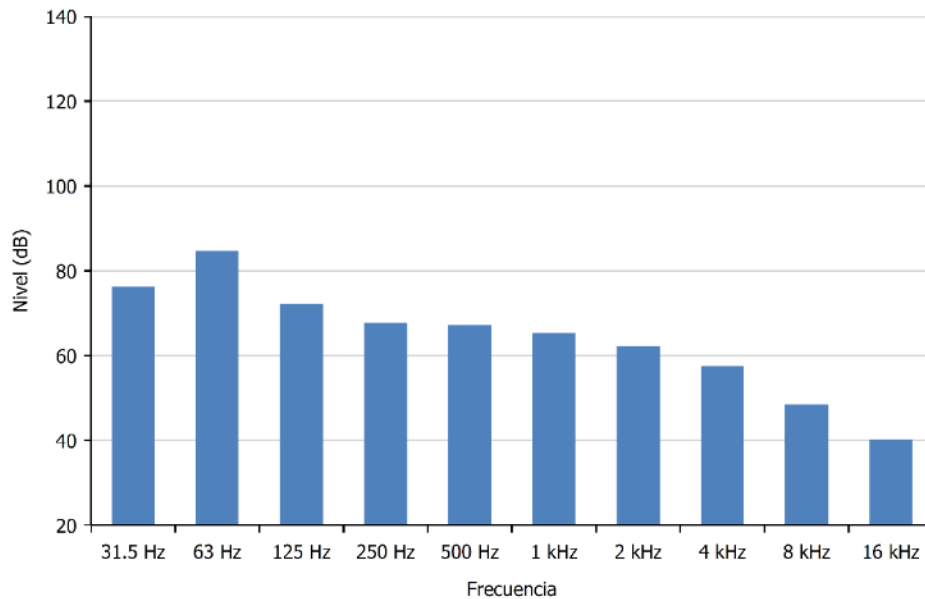

| Frecuencia (Hz) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 16 000 |
|-----------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Nivel (dB) | 76.1 | 84.6 | 72.1 | 67.6 | 67.1 | 65.3 | 62.2 | 57.4 | 48.3 | 40.1 |

| | | |
|-----------------------|-------|---------|
| Banda más alta | 63 Hz | 84.6 dB |
|-----------------------|-------|---------|

ReportId



M23F601000000F5

Cirrus Research NoiseTools

Página 1 de 1

Data generada por el Sonómetro ubicado en la casa más cercana al proyecto (Familia De La Guardia)





Informe de resumen de medición

| | | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | RA1-Familia De La Guardia | | | |
| Tiempo | 07/18/2019 3:18:15 p. m. | Persona | Lugar | Proyecto |
| Duración | 00:10:00 | | Agro Playa Blanca FII | Agro Playa Blanca |
| Instrumento | G079527, CR:171B | | Casa más cercana | |

Calibración

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------|---------|
| Antes | 07/18/2019 3:18 p. m. | Offset | 0.21 dB | Después | 07/18/2019 3:29 p. m. | Offset | 0.32 dB |
|--------------|-----------------------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------|---------|

| Valores básicos | | Exposición proyectada | |
|-----------------|----------|-----------------------|---------|
| LAeq | 66.8 dB | 30 minutos | 54.8 dB |
| LCPeak | 103.4 dB | 1 hora | 57.8 dB |
| C-A | 8.9 dB | 2 horas | 60.8 dB |
| LEX8 | 50.0 dB | 4 horas | 63.8 dB |
| LAFMax | 85.2 dB | 6 horas | 65.6 dB |
| | | 8 horas | 66.8 dB |
| | | 10 horas | 67.8 dB |
| | | 12 horas | 68.6 dB |

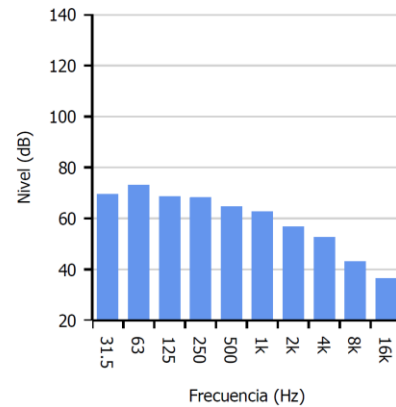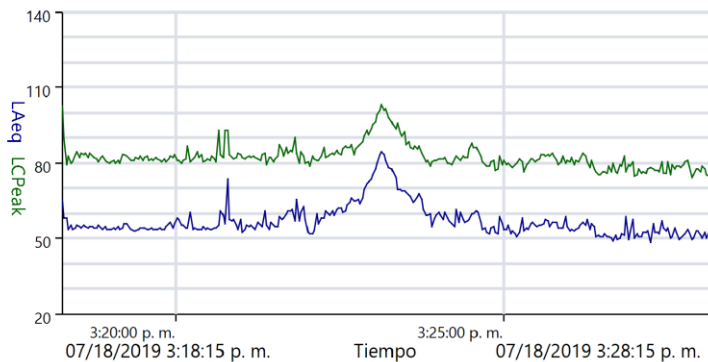

09/17/2019





Informe de resumen de medición

Nombre RA2-Familia De La Guardia
Tiempo 07/18/2019 3:29:44 p. m. **Persona**
Duración 00:10:00 **Lugar** Agro Playa Blanca FII **Proyecto** Agro Playa Blanca
Instrumento G079527, CR:171B **Casa más cercana**

Calibración

Antes 07/18/2019 3:29 p. m. **Offset** 0.32 dB **Después** 07/18/2019 3:40 p. m. **Offset** 0.17 dB

| Valores básicos | | Exposición proyectada | |
|-----------------|----------|-----------------------|---------|
| LAeq | 54.2 dB | 30 minutos | 42.2 dB |
| LCPeak | 112.5 dB | 1 hora | 45.2 dB |
| C-A | 14.6 dB | 2 horas | 48.2 dB |
| LEX8 | 37.4 dB | 4 horas | 51.2 dB |
| LAFMax | 76.9 dB | 6 horas | 53.0 dB |
| | | 8 horas | 54.2 dB |
| | | 10 horas | 55.2 dB |
| | | 12 horas | 56.0 dB |

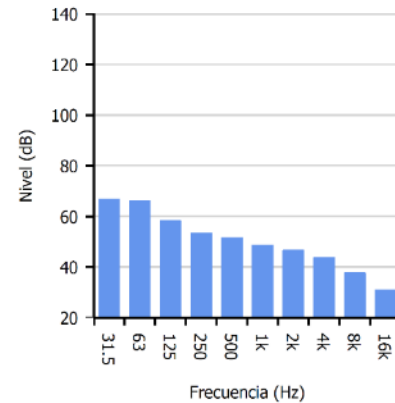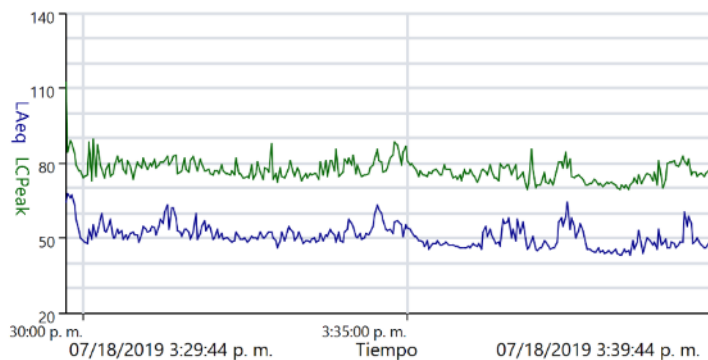

ReportId



M23F601000000FA

Cirrus Research NoiseTools

Página 1 de 1

09/17/2019





Informe de resumen de medición

Nombre RA3-Familia De La Guardia
Tiempo 07/18/2019 3:40:37 p. m. **Persona**
Duración 00:09:50 **Lugar** Agro Playa Blanca FII **Proyecto** Agro Playa Blanca
Instrumento G079527, CR:171B **Casa más cercana**

Calibración

Antes 07/18/2019 3:40 p. m. **Offset** 0.17 dB **Después** 07/18/2019 3:54 p. m. **Offset** 0.25 dB

| Valores básicos | | Exposición proyectada | |
|-----------------|---------|-----------------------|---------|
| LAeq | 51.0 dB | 30 minutos | 39.0 dB |
| LCPeak | 93.5 dB | 1 hora | 42.0 dB |
| C-A | 11.9 dB | 2 horas | 45.0 dB |
| LEX8 | 34.1 dB | 4 horas | 48.0 dB |
| LAFMax | 68.3 dB | 6 horas | 49.8 dB |
| | | 8 horas | 51.0 dB |
| | | 10 horas | 52.0 dB |
| | | 12 horas | 52.8 dB |

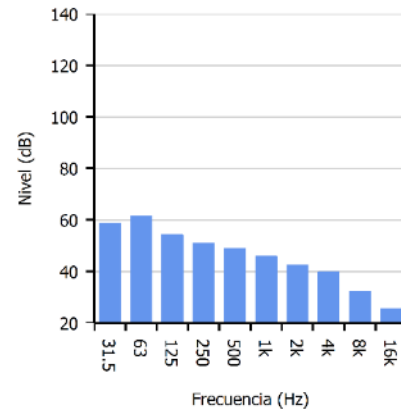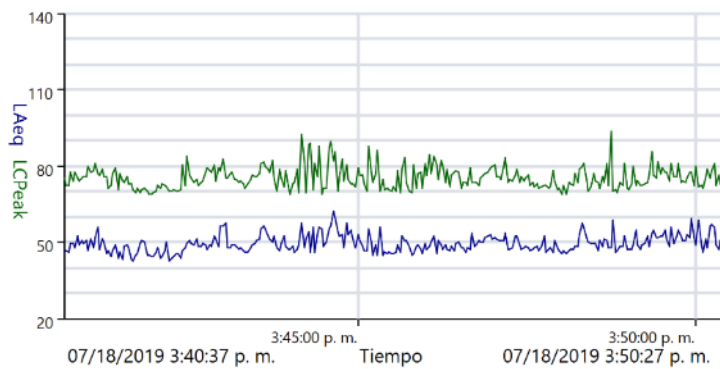

ReportId



M23F601000000FB

Cirrus Research NoiseTools

Página 1 de 1





Informe de resumen de medición

Nombre RA4-Familia De La Guardia
Tiempo 07/18/2019 4:06:44 p. m. **Persona**
Duración 00:10:00 **Lugar** Agro Playa Blanca FII **Proyecto** Agro Playa Blanca
Instrumento G079527, CR:171B **Casa más cercana**

Calibración

Antes 07/18/2019 4:06 p. m. **Offset** 0.20 dB **Después** 07/23/2019 1:41 p. m. **Offset** 0.19 dB

| Valores básicos | | Exposición proyectada | |
|-----------------|----------|-----------------------|---------|
| LAeq | 55.8 dB | 30 minutos | 43.8 dB |
| LCPeak | 102.7 dB | 1 hora | 46.8 dB |
| C-A | 8.7 dB | 2 horas | 49.8 dB |
| LEX8 | 39.0 dB | 4 horas | 52.8 dB |
| LAFMax | 76.6 dB | 6 horas | 54.6 dB |
| | | 8 horas | 55.8 dB |
| | | 10 horas | 56.8 dB |
| | | 12 horas | 57.6 dB |

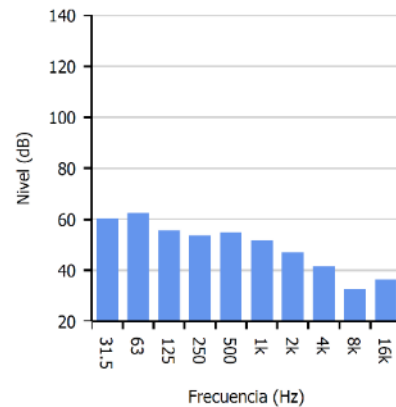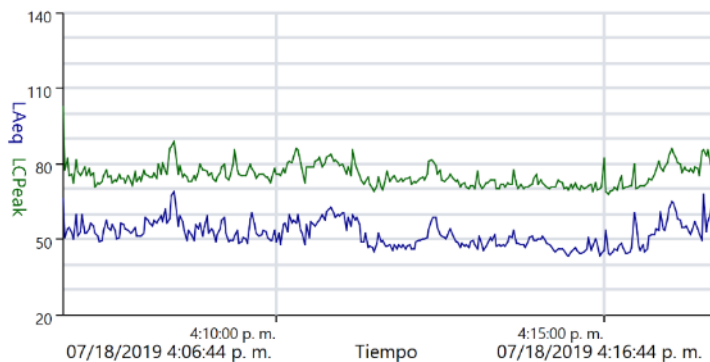

ReportId



M23F601000000FC

Cirrus Research NoiseTools

Página 1 de 1

Anexo 2.1.3. Extracto de las Normas para ruido ambiental en Panamá

DECRETO EJECUTIVO N° 306
(De 4 de septiembre de 2002)

Que adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así como en ambientes laborales

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA,
en uso de sus facultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 105 de la Constitución Política establece que es función esencial del Estado velar por la Salud Pública, que incluye la responsabilidad de asegurar el derecho que tiene el individuo a la promoción, prevención y rehabilitación de la salud.

Que el artículo 88, numeral 1, del Código Sanitario faculta al Ministerio de Salud para dictar medidas tendientes a evitar que se afecte o se pueda afectar la salud, como es el caso del ruido.

Que los altos niveles de ruido no controlados que se presentan en el ambiente, producidos por las actividades de las fábricas, talleres, bares, discotecas, toldos, locales comerciales, vehículos de combustión interna y cualquier otra actividad que genere ruido, se han convertido en una amenaza para la salud de los miembros de la comunidad.

Que se ha comprobado científicamente, desde el punto de vista clínico-patológico, que el ruido produce alteraciones orgánicas irreversibles en los individuos expuestos continuamente a éste.

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Se adopta el Reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así como en ambientes laborales, cuyo texto es del tenor siguiente:

Capítulo I
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1. Queda prohibido producir ruidos que, por su naturaleza o inoportunidad, perturben o pudieran perturbar la salud, el reposo o la tranquilidad de los miembros de las comunidades, o les causen perjuicio material o psicológico.

ARTÍCULO 2. Toda actividad o trabajo deberá realizarse de manera que se reduzcan los ruidos producidos por ellos, y se evitarán especialmente aquellos causados por piezas de maquinarias flojas, sueltas o excesivamente desgastadas, correas de transmisión en mal estado y escapes de vapor o aire comprimido, así como otros ruidos innecesarios y susceptibles de evitarse.

ARTÍCULO 3. Para los fines del presente Decreto, los siguientes conceptos se definen así:

1. **Actividad temporal:** Ferias, patronales, carnavales y otras fiestas que se celebren por periodos no mayores de quince días continuos, que no se efectúen más de tres veces al año, en la misma área geográfica.
2. **Espacios públicos:** Todo lugar en donde pueda transitar o detenerse libremente cualquier persona.
3. **Intensidad sonora:** Grado de energía de las sensaciones producidas en el órgano auditivo.
4. **Medidas de ingeniería:** Técnicas que permiten aplicar el saber científico para la utilización de la materia y fuentes de energía, en este caso, del ruido, y así disminuirlo, atenuarlo, desviarlo o eliminarlo.
5. **Periferia:** Espacio que rodea las circunferencias de las industrias o áreas industriales.
6. **Programas de protección auditiva:** Conjunto de medidas para prevenir o mitigar los riesgos a la salud, causados por la generación de ruidos.
7. **Ruido:** Todo sonido molesto o que causa molestia, que interfiere con el sueño y trabajo o lesione y dañe física o psíquicamente al individuo, flora, fauna y bienes de la nación o de particulares.
8. **Ruido de fondo o ambiental:** Sonidos medidos o percibidos sin distinguir la fuente de ruido, motivo del estudio o a medir.
9. **Sectores industriales:** Áreas de la República dispuestas por el Ministerio de Vivienda como industriales y que no deben ser vecinas a residencias o habitaciones.
10. **Vecino:** El que habita o coexiste con otros en el mismo pueblo, barrio, área o zona, ya sea cercana, próxima o lejana a otras habitaciones o viviendas.
11. **Zona de amortiguamiento:** Área para la disipación de la energía sonora, que puede consistir en la distancia, la naturaleza o cualquier otro cuerpo.

Capítulo II **Ruidos en Ambientes Laborales**

ARTÍCULO 4. El nivel sonoro máximo admisible de ruidos de carácter continuo, para las personas, dentro de los lugares de trabajo, en jornada de ocho horas será:

| Tipo de Trabajo | Nivel Sonoro Máximo |
|---|----------------------------|
| 1. Con actividad mental constante e intensa | 50 decibeles (en escala A) |
| 2. De oficina y actividades similares | 60 decibeles (en escala A) |

3. Otros trabajos

85 decibeles (en escala A)

Parágrafo. Todos estos valores serán medidos en las áreas en que el operario realiza habitualmente sus labores.

ARTÍCULO 5. La empresa que exceda los 85 decibeles, en escala A, en sus ambientes de trabajo, en jornada de ocho horas, deberá establecer medidas de ingeniería que reduzcan los ruidos a los niveles establecidos en el artículo 4; de no existir medida mitigable, debe implementar programas de conservación auditiva.

Parágrafo. La empresa, también, tiene la obligación de realizar audiometrías periódicas, cada seis meses, a sus trabajadores, hechas por un médico otorrinolaringólogo o audiólogo, y los resultados deberán entregarse al trabajador, al igual que a las autoridades competentes.

ARTÍCULO 6. La empresa aplicará la Resolución 506 de 6 de octubre de 1999, que aprueba el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000, Higiene y Seguridad Industrial "Condiciones de Higiene y Seguridad en los Ambientes de Trabajo donde se genere Ruido".

Parágrafo. Las mediciones las efectuará el personal técnico de inspección u otras autoridades designadas por el Ministerio de Salud o por la ley. No obstante, las empresas generadoras de ruido son responsables de hacer mediciones, cuando las condiciones de trabajo sean modificadas, e informar de los resultados a la autoridad de salud.

Capítulo III

Ruidos Producidos por las Industrias y Comercios Vecinos a Residencias o Habitaciones

ARTÍCULO 7. Se prohíbe exceder la intensidad del ruido, fuera del local o residencia, a las fábricas, industrias, talleres, almacenes, bares, restaurantes, discotecas, locales comerciales o cualquier otro establecimiento o residencia cuya actividad genere ruido, vecinos a edificios o casas destinadas a residencia o habitación, de acuerdo al siguiente horario y tabla:

| Horario | Nivel Sonoro Máximo |
|---------------------------|----------------------------|
| De 6:00 a.m. a 9:59 p.m. | 55 decibeles (en escala A) |
| De 10:00 p.m. a 5:59 a.m. | 50 decibeles (en escala A) |

Parágrafo. La medición del ruido para determinar las infracciones a esta norma, se hará desde las distintas residencias o habitaciones de los afectados.

ARTÍCULO 8. Todas las fábricas, industrias, talleres, almacenes, bares, restaurantes, discotecas, toldos, locales comerciales o cualquier otro establecimiento o actividad permanente ubicados en áreas residenciales o de habitación, que generen ruido fuera del local, de intensidades sonoras que sobrepasen los niveles máximos establecidos en el artículo anterior, deberán suspender sus operaciones hasta que resuelvan el problema de ruido. De ser imposible controlar el nivel de ruido a los parámetros establecidos, deberán trasladar la empresa o su fuente de ruido a un área no residencial.

debido a que establece una desigualdad o desproporción entre los residentes de una y otra área, ya que los ruidos que se produzcan en exceso perturban por igual a la salud, tranquilidad y reposo de los residentes de una comunidad, al producirles perjuicios médicamente comprobados, ya sean materiales o psicológicos.

Que se utilizaron estudios preexistentes para determinar los niveles únicos de ruidos, basados en evaluaciones y análisis, así como se realizaron reuniones para establecer los niveles máximos sonoros, para todo el territorio nacional.

DECRETA:

Artículo 1. Se determinan los siguientes niveles de ruido, para las áreas residenciales e industriales, así:

| Horario | Nivel sonoro máximo |
|---------------------------|----------------------------|
| De 6:00 a.m. a 9:59 p.m. | 60 decibeles (en escala A) |
| De 10:00 p.m. a 5:59 a.m. | 50 decibeles (en escala A) |

Parágrafo. La medición del ruido para determinar las infracciones a esta norma, se hará desde las residencias de los afectados.

Artículo 2. Este Decreto empezará a regir desde su promulgación.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

MIREYA MOSCOSO
Presidenta de la República

FERNANDO GRACIA
Ministro de Salud

RESOLUCION Nº 197
(De 4 de diciembre de 2003)

Que cancela el registro sanitario del producto **OMNIDOL 50 mg/ cápsulas**.

EL DIRECTOR NACIONAL DE FARMACIAS Y DROGAS

En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que conforme señala el Instituto Especializado de Análisis el producto no cumple con la prueba de disolución, de acuerdo con las exigencias establecidas por el fabricante, ya que reportó en dicha prueba un valor de X6= 57 %, en la primera etapa y de X12= 60 % en la segunda etapa.

Que mediante Resolución 043 de 3 de junio de 2003, ordena a la empresa PANAMED, S.A., el retiro del mercado del producto OMNIDOL 50 MG/ CÁPSULAS elaborado por Laboratorios California S.A., de Colombia, con número de registro sanitario 51623 ya que el producto no cumple con el requisito de calidad declarado por el fabricante al momento de registrar el producto y se le suspende el registro sanitario.


Anexo 2.1.4. Estimación de la incertidumbre de medición

Tabla 6 Resumen de la incertidumbre de medición para LAeq

| Incertidumbre típica | | | | Incertidumbre típica combinada (dB) | Incertidumbre de medición expandida (dB) |
|---|--|---|---|---|--|
| Debido a la instrumentación ^a (dB) | Debido a las condiciones de funcionamiento ^b (dB) | Debido a las condiciones meteorológicas y del terreno ^c (dB) | Debido al sonido residual ^d (dB) | | |
| 1.0 | X | Y | Z | $\sigma_t = \sqrt{1^2 + X^2 + Y^2 + Z^2}$ | $\pm 2.0 \sigma_t$ |

Fuente: Norma Internacional ISO 1996-2:2007.

Figura 1. Radio de la trayectoria de sonido de curvatura R

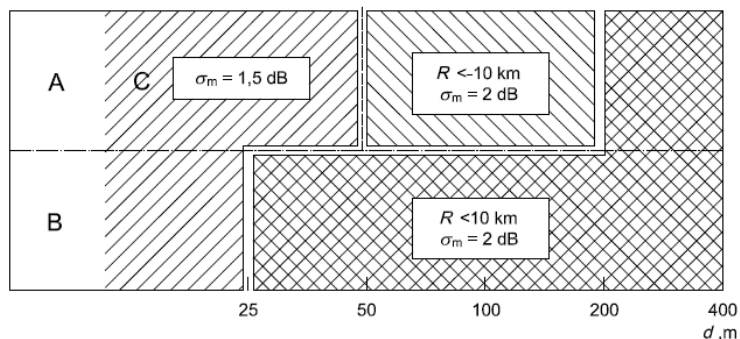

Siendo,

A: Alto

B: Bajo

C: Sin restricción

a) Incertidumbre debida a la instrumentación

Incertidumbre del instrumento = 0.7 dB

b) Incertidumbre debida a las condiciones de operación

En la tabla 5 se presenta el tráfico rodado y el promedio total de vehículos.

Tabla 5. Tráfico rodado y promedio total de vehículos

| Sitio de Inspección | Vehículos livianos | Vehículos pesados |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Casa más cercana | 3 | 10 |
| Promedio total de vehículos | 3.25 | |

Fuente: Datos de campo. CODESA, 2019.

$$X = 2.77 \text{ dB}$$

c) Incertidumbre debida al clima y al suelo

$$Y = 0.5 \text{ dB}$$

d) Incertidumbre debida al sonido residual

$$Z = 0.5 \text{ dB}$$

5.1 Cálculo de incertidumbre total combinada y expandida

A continuación, se presenta el cálculo de la incertidumbre típica combinada, que incluye los valores de incertidumbre debido a la instrumentación, a las condiciones de funcionamiento, condiciones meteorológicas y del terreno y debido al sonido residual.

$$\sigma_t = \sqrt{0.7^2 + X^2 + Y^2 + Z^2}$$

$$\sigma_t \approx 2.94 \text{ dB}$$

$$\sigma_{ex} = \pm 5.89$$

Anexo 2.1.5. Certificado de calibración del equipo de medición



Certificado de Calibración

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificado No.: SN-G079527-OSC7995
Certificate number

Cliente: CORPORACIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL, S.A. (CODESA)
Customer

Dirección: Plaza Aventura, Oficina M - 23, Via Ricardo J. Alfaro, El Dorado, Panamá
Address

Instrumento: SONÓMETRO
Instrument

Fabricante: CIRRUS
Manufacturer

Modelo: CR:171B
Model

Número de serie: G079527
Serial number

Registro único entrada: RC7995
RUE

Fecha de recepción: 2019-03-11
Date of receipt

Condición de ingreso: Sin anomalías visuales.
Entry condition

Fecha de calibración: 2019-03-12
Calibration date

Número de páginas del certificado incluyendo anexos: 3
Number of pages of this certificate and documents attached

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite.

This certificate is an accurate record of the performed measurements results. This certificate must not be partially reproduced, except with prior written permission of the issuing laboratory.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriated intervals.

Aprobó:
Approved by

ALVARO ANDRES HERNANDEZ MARTINEZ
Director Técnico Laboratorio de calibración

Calibró: FAM

Fecha de emisión:
Issue Date

2019-03-12

Sello
Seal



Certificado No. SN-G079527-OSC7995

Método utilizado:

El ítem descrito anteriormente fue calibrado por el método de comparación directa, de acuerdo a la norma CEI/IEC 61672-3 Edición 2,0 2013-09, realizando las pruebas de: Indicación del nivel de presión sonora y frecuencia, Prueba acústica de ponderación en frecuencia, Prueba eléctrica de ponderación en frecuencia y Ponderación frecuencial y temporal a 1 kHz; también descritas en el procedimiento interno CA-PR-003.

Condiciones Ambientales:

Temperatura Máxima: 21,9 °C
Temperatura Mínima: 21,1 °C

Humedad Relativa Máxima: 57,6 % HR
Humedad Relativa Mínima: 56,5 % HR

Presión atmosférica: 752,3 mbar
Δ Presión atmosférica: 0,0 mbar

Resultados de la calibración:

1. Indicación del nivel de presión sonora y frecuencia

| Frecuencia (Hz) | Valor esperado (dB) | Lectura Inicial (dB) | Lectura Final (dB) | Incertidumbre (dB) |
|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 000 | 94,0 | 94,70 | 93,70 | 0,19 |
| 1 000 | 104,0 | 104,70 | 103,70 | 0,19 |
| 1 000 | 114,0 | 114,70 | 113,70 | 0,19 |

2. Prueba acústica de ponderación en frecuencia

Ponderación frecuencial: C

Nivel de referencia: 93,7 dB

| Frecuencia (Hz) | Valor esperado (dB) | Promedio de las Lecturas (dB) | Error (dB) | Incertidumbre (dB) |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|------------|--------------------|
| 125 | 93,5 | 93,50 | 0,00 | 0,19 |
| 1 000 | 93,7 | 93,70 | 0,00 | 0,19 |
| 4 000 | 92,9 | 93,00 | 0,10 | 0,19 |

3. Prueba eléctrica de ponderación en frecuencia

Nivel de referencia: 93,7 dB

| Frecuencia (Hz) | Ponderación A | | | | Ponderación C | | | | Ponderación Z | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|------------|--------------------|
| | Valor esperado (dB) | Promedio de las Lecturas (dB) | Error (dB) | Incertidumbre (dB) | Valor esperado (dB) | Promedio de las Lecturas (dB) | Error (dB) | Incertidumbre (dB) | Valor esperado (dB) | Promedio de las Lecturas (dB) | Error (dB) | Incertidumbre (dB) |
| 63 | 67,5 | 67,80 | 0,30 | 0,21 | 92,9 | 92,88 | -0,02 | 0,21 | 94,0 | 93,68 | -0,32 | 0,21 |
| 125 | 77,6 | 77,80 | 0,20 | 0,21 | 93,5 | 93,50 | 0,00 | 0,21 | 94,0 | 93,70 | -0,30 | 0,21 |
| 250 | 85,1 | 85,30 | 0,20 | 0,21 | 93,7 | 93,68 | -0,02 | 0,21 | 94,0 | 93,70 | -0,30 | 0,21 |
| 500 | 90,5 | 90,60 | 0,10 | 0,21 | 93,7 | 93,70 | 0,00 | 0,21 | 94,0 | 93,70 | -0,30 | 0,21 |
| 1 000 | 93,7 | 93,70 | 0,00 | 0,21 | 93,7 | 93,70 | 0,00 | 0,21 | 94,0 | 93,70 | -0,30 | 0,21 |
| 2 000 | 94,9 | 94,70 | -0,20 | 0,21 | 93,5 | 93,50 | 0,00 | 0,21 | 94,0 | 93,70 | -0,30 | 0,21 |
| 4 000 | 94,7 | 94,30 | -0,40 | 0,21 | 92,9 | 92,70 | -0,20 | 0,21 | 94,0 | 93,70 | -0,30 | 0,21 |
| 8 000 | 92,6 | 92,10 | -0,50 | 0,21 | 90,7 | 90,30 | -0,40 | 0,21 | 94,0 | 93,59 | -0,41 | 0,21 |
| 16 000 | 87,1 | 87,30 | 0,20 | 0,21 | 85,2 | 85,50 | 0,30 | 0,21 | 94,0 | 93,40 | -0,60 | 0,21 |

CA-FT-019 V4 / 2017-05-19

✱ página 2 de 3

Carrera 67 No. 167-61 Oficina 209 • Centro Empresarial Colina Office Park
Bogotá Colombia • Teléfonos: 674 1061 - 674 1065
info@labserviceltlda.com • www.labserviceltlda.com



Certificado No. SN-G079527-OSC7995

4. Ponderación frecuencial y temporal a 1 kHz

Ponderación temporal Fast

Nivel de referencia: 94 dB

| Ponderación Frecuencial (Hz) | Valor esperado (dB) | Promedio de las Lecturas (dB) | Error (dB) | Incertidumbre (dB) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|--------------------|
| A | 94,0 | 94,00 | 0,00 | 0,21 |
| C | 94,0 | 94,00 | 0,00 | 0,21 |
| Z | 94,0 | 94,00 | 0,00 | 0,21 |

Ponderación temporal Slow

Nivel de referencia: 94 dB

| Ponderación Frecuencial (Hz) | Valor esperado (dB) | Promedio de las Lecturas (dB) | Error (dB) | Incertidumbre (dB) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|--------------------|
| A | 94,0 | 94,00 | 0,00 | 0,21 |

Incertidumbre:

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" igual a 2 y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

Trazabilidad:

El Laboratorio LAB&SERVICE ELECTRÓNICA ESPECIALIZADA Ltda., asegura el mantenimiento de la trazabilidad al amper (A), metro (m), kilogramo (kg) y segundo (s), unidad base del SI, mediante los patrones utilizados en estas mediciones.

| Patrón utilizado | Identificación | Certificado No. | Calibrado por: |
|------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| CALIBRADOR ACUSTICO | AC-009 | CAS-324078-Q6K0F2-901 | Brüel & Kjær |
| GENERADOR DE FUNCIONES | AC-001 | CMK-GELEC-17145 CMK-TFQ-17021 | COLMETRIK |

Observaciones:

Los valores e incertidumbres asignadas corresponden al momento de la calibración, no considerándose la estabilidad a largo plazo del instrumento, y únicamente son válidos para el instrumento cuyos datos aparecen en la primera página. El Laboratorio LAB&SERVICE Electrónica Especializada Ltda., no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

Este instrumento cuenta con micrófono serie 209404D y preamplificador serie 7100F.

Otras Identificaciones: EQC 0075

El valor de referencia según el manual es de 93,7dB se toma como referencia.

FIN DEL CERTIFICADO

CA-FT-019 V4 / 2017-05-19

Página 3 de 3

Carrera 67 No. 167-61 Oficina 209 • Centro Empresarial Colina Office Park
Bogotá Colombia • Teléfonos: 674 1061 - 674 1065
info@labserviceltlda.com • www.labserviceltlda.com

Anexo 2.1.6. Hojas de campo



N° SC-CER139557

| HOJA DE CAMPO PARA INSPECCIÓN DE RUIDO AMBIENTAL | | | | | | RE-29 | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|----------------------------|-------------------------------------|
| Datos generales | | | | | | | |
| Nombre del proyecto | Agro Playa Blanca Fase II | | | | | Fecha y hora | 18-7-19 10:08 a.m. |
| Ubicación | Frente al edificio 200 | | | | | Persona de Contacto | Jorge Silva |
| Promotor | Agro Playa Blanca S.A. | | Teléfono | | 391-7200 | Firma | |
| Datos del Inspector | | | | | | | |
| Nombre | Yelenshka Yalman | | Cédula | 9-798-892 | | Firma | <i>[Firma]</i> |
| Condiciones climáticas y datos del equipo de medición | | | | | | | |
| Humedad relativa | 70% | Soleado | <input checked="" type="checkbox"/> | Tipo de suelo | Suave | Duro | |
| Dirección del viento | SO | Nublado | | Época | Seca | Lluviosa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Velocidad del viento | 56 km/h | Equipo de medición | Cirrus: CR: 171B 6079527 | | | Verificación (94 o 114) dB | 93.7 |
| Temperatura | 30.9°C | Coordenadas | 922323N 592078E | | | | 93.7 |
| Características generales de la medición | | | | | | | |
| Hora | Fuentes de ruido | Distancia a la fuente de ruido (m) | # Vehículos | | Leq (dB) | L90 (dB) | |
| | | | Livianos | Pesados | | | |
| 9:54 a.m. | Movimiento de tierra retroexcavadora | 10m | 0 | 3 | 70 | 65.7 | |
| 10:04 a.m. | Camión Volquete (Cargando Material) | 12m | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | |
| - Se Calibró antes y después de la medición. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



N° SC-CER13957

| HOJA DE CAMPO PARA INSPECCIÓN DE RUIDO AMBIENTAL | | | | | | | | | | RE-29 | |
|--|------------------------------|--|-------------|--------------------|----------|-------------------------------------|--|----------------------|--|--|--|
| Datos generales | | | | | | | | | | | |
| Nombre del proyecto | | Agro Playa Blanca Fase II | | | | | | | | | |
| Ubicación | | Casa más cercana al proyecto (Familia De La Guardia) | | | | Fecha y hora | | 18-7-19 3:29 p.m. | | | |
| Promotor | | Agro Playa Blanca S.A. | | | | Persona de Contacto | | Jorge Silva | | | |
| Teléfono | | 381-7200 | | | | Firma | | | | | |
| Datos del Inspector | | | | | | | | | | | |
| Nombre | | Yelensky Yalaman | | Cédula | | 8798-892 | | Firma | | | |
| Condiciones climáticas y datos del equipo de medición | | | | | | | | | | | |
| Humedad relativa | | 66.7% | | Soleado | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Tipo de suelo | | Suave <input checked="" type="checkbox"/> Duro | |
| Dirección del viento | | SO | | Nublado | | | | Época | | Seca <input type="checkbox"/> Lluviosa <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Velocidad del viento | | 2.5 km/h | | Equipo de medición | | Cirrus: CR: 1715 G079527 | | | | Verificación (94 o 114) dB | |
| Temperatura | | 32.8°C | | Coordenadas | | 922134N 592349E | | | | 93.7 dB 93.7 dB | |
| Características generales de la medición | | | | | | | | | | | |
| Hora | Fuentes de ruido | Distancia a la fuente de ruido (m) | # Vehículos | | Leq (dB) | L90 (dB) | | | | | |
| | | | Livianos | Pesados | | | | | | | |
| 3:18 p.m. | Vehículo encendido | 5.0 | 0 | 7 | 66.8 | 50.7 | | | | | |
| | trabajos manuales en la casa | 20.0 | | | | | | | | | |
| 3:28 p.m. | paso de vehículos | 5.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | |
| - Calibrado antes y después de la medición. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



N° SC CER133957

| HOJA DE CAMPO PARA INSPECCIÓN DE RUIDO AMBIENTAL | | | | | | | RE-29 |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|----------|
| Datos generales | | | | | | | |
| Nombre del proyecto | Agro Playa Blanca Fase II | | | | | | |
| Ubicación | Casa más cercana al proyecto (Familia De La Guardia) | | | | Fecha y hora | 18-7-19 3:40 p.m. | |
| Promotor | Agro Playa Blanca S.A. | | Persona de Contacto | | Jorge Silva | | |
| Teléfono | 391-7200 | | Firma | | | | |
| Datos del Inspector | | | | | | | |
| Nombre | Yelenshka Yalerman | | Cédula | 8-798-892 | | Firma | |
| Condiciones climáticas y datos del equipo de medición | | | | | | | |
| Humedad relativa | 66.8% | Soleado | ✓ | Tipo de suelo | Suave | ✓ | Duro |
| Dirección del viento | SO | Nublado | | Época | Seca | | Lluviosa |
| Velocidad del viento | 5.9 Km/h | Equipo de medición | CURVUS: CR: 171B 6079527 | | | Verificación (94 o 114) dB | 93.7 |
| Temperatura | 31.3°C | Coordenadas | 922134N 592349E | | | | 93.7 |
| Características generales de la medición | | | | | | | |
| Hora | Fuentes de ruido | Distancia a la fuente de ruido (m) | # Vehículos | | Leq (dB) | L90 (dB) | |
| | | | Livianos | Pesados | | | |
| 3:29 p.m. | Vehículo encendido | 5.0 | 0 | 3 | 54.2 | 44.9 | |
| | ruido de aves. | | | | | | |
| 3:39 p.m. | Paso de Vehículos Pesados | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | |
| - Se calibro antes y después de la medición. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



N° SC-CER139957

| HOJA DE CAMPO PARA INSPECCIÓN DE RUIDO AMBIENTAL | | | | | | | | RE-29 |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Datos generales | | | | | | | | |
| Nombre del proyecto | Agro Playa Blanca Fase II | | | | | | | |
| Ubicación | Casa más cercana al proyecto (Familia De La Guardia) | | | | | Fecha y hora | 18-7-19 4:06 p.m. | |
| Promotor | Agro Playa Blanca S.A. | | | Persona de Contacto | Jorge Silva | | | |
| Teléfono | 391-7200 | | | Firma | | | | |
| Datos del Inspector | | | | | | | | |
| Nombre | Yelenshka Yalman | | | Cédula | 8-798-892 | | Firma | Yelenshka Yalman |
| Condiciones climáticas y datos del equipo de medición | | | | | | | | |
| Humedad relativa | 65.1% | Soleado | <input checked="" type="checkbox"/> | Tipo de suelo | Suave | <input checked="" type="checkbox"/> | Duro | |
| Dirección del viento | SO | Nublado | | Época | Seca | | Lluviosa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Velocidad del viento | 1.5 km/h | Equipo de medición | Cirrus: CR: 1713 G079527 | | | Verificación (94 o 114) dB | 93.7 | |
| Temperatura | 32.1°C | Coordenadas | 922134N 592249E | | | | 93.7 | |
| Características generales de la medición | | | | | | | | |
| Hora | Fuentes de ruido | Distancia a la fuente de ruido (m) | # Vehículos | | Leq (dB) | L90 (dB) | | |
| | | | Livianos | Pesados | | | | |
| 3:40 p.m. | Portagranja | 20 | 0 | 0 | 51 | 44.8 | | |
| | en casa más | | | | | | | |
| 3:50 p.m. | Cercana | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | |
| No hubo paso de vehículos | | | | | | | | |
| Se calibró antes y después de la medición. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



N° SC-684139957

| HOJA DE CAMPO PARA INSPECCIÓN DE RUIDO AMBIENTAL | | | | | | RE-29 | |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Datos generales | | | | | | | |
| Nombre del proyecto | Agro Playa Blanca Fase II | | | | | | |
| Ubicación | Casamás cercana al proyecto (Familia De La Guardia) | | | | Fecha y hora | 18-7-19 4:18 p.m. | |
| Promotor | Agro Playa Blanca S.A. | | Persona de Contacto | | Jorge Silva | | |
| Teléfono | 391-7200 | | Firma | | | | |
| Datos del Inspector | | | | | | | |
| Nombre | Yelenishka Valerian | | Cédula | 8-798-892 | | Firma | |
| Condiciones climáticas y datos del equipo de medición | | | | | | | |
| Humedad relativa | 63.28 | Soleado | <input checked="" type="checkbox"/> | Tipo de suelo | Suave | <input checked="" type="checkbox"/> | Duro |
| Dirección del viento | SO | Nublado | | Época | Seca | | Lluviosa <input checked="" type="checkbox"/> |
| Velocidad del viento | 0.0 Km/h | Equipo de medición | CURVUS: CR. 171B 8079527 | | Verificación (94 o 114) dB | | |
| Temperatura | 33.8°C | Coordenadas | 922134N 592349E | | | | |
| Características generales de la medición | | | | | | | |
| Hora | Fuentes de ruido | Distancia a la fuente de ruido (m) | # Vehículos | | Leq (dB) | L90 (dB) | |
| | | | Livianos | Pesados | | | |
| 4:06 p.m. | Paso de Vehículos livianos | 5.0 | 3 | 0 | 55.8 | 45.3 | |
| 4:16 p.m. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | |
| Se calibró antes y después de la medición. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ANEXO 2.2. INFORME DE INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL



Informe de Inspección de Ruido Laboral

Proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”

Preparado para:
Agro Playa Blanca, S.A.



Julio, 2019

Informe de Inspección de Ruido Laboral





Proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”

Preparado para:
Agro Playa Blanca, S.A.

Elaborado por:



Julio, 2019

|  CORPORACION DE DESARROLLO AMBIENTAL, S.A. | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|--|---|--|---|
| |  |  |  |
| | Responsable | Control de calidad | Director Técnico |
| DIVEDA-AA-003-2012/ Act. 2018 | Ángel Credidío | Roy Quintero C.T. N°867 | Venicia Cerrud C.T. N°597 |

Índice

| | |
|--|----|
| 2.2.1. Introducción | 4 |
| 2.2.2. Objetivo general | 4 |
| 2.2.3. Objetivos específicos..... | 4 |
| 2.2.4. Metodología | 5 |
| 2.2.4.1. Especificaciones del equipo y datos del inspección..... | 5 |
| 2.2.4.2. Procedimiento de medición para dosimetría | 5 |
| 2.2.5. Resultados | 6 |
| 2.2.6. Conclusión | 7 |
| 2.2.7. Recomendaciones | 7 |
| 2.2.8. Bibliografía | 8 |
| Anexos | 9 |
| Anexo 2.2.1 Reporte de imágenes | 10 |
| Anexo 2.2.2 Datos de las mediciones de ruido laboral | 12 |
| Anexo 2.2.3 Extracto de la Norma Nacional para Ruido Laboral | 14 |
| Anexo 2.2.4 Certificado de calibración del equipo de medición..... | 16 |
| Anexo 2.2.5 Cadenas de Custodia | 20 |

2.2.1. Introducción

La dosis de ruido es un parámetro que se desarrolla para evaluar la exposición al ruido en los centros de trabajo, como protección contra la pérdida de la audición. Se define como el nivel continuo equivalente (L_{eq}) al que un trabajador puede estar sometido para una jornada de 8 horas diarias, sin protección auditiva (Reglamento Técnico DGNTI¹ -COPANIT² 44-2000)³.

Existen tres tipos de ruidos: ruido estacionario o continuo es aquel en el que el nivel de presión sonora permanece constante a lo largo del tiempo, ruido fluctuante o intermitente, cuyos niveles de presión sonora varían en cuanto al tiempo y ruido de impulso, que presenta picos en los niveles de presión sonora de duración inferior a un segundo, a intervalos superiores de un ciclo por segundo.

Los valores normales oscilan entre 85 y 90 dB(A) y hace referencia a una dosis al 100%. Esta dosis es el máximo permisible de exposición al ruido en conformidad con las normas de “Occupational Safety and Health Administration” (OSHA), “Mine Safety and Health Administration” (MSHA), “American Conference of Governmental Industrial Hygienists” (ACGHI) e “International Organization for Standardization” (ISO). La dosis de ruido ofrece una medida de la exposición sonora a la que se encuentra sometida una persona, la cual no presenta interpretación física y que trata de un índice dimensional que suele expresarse como porcentaje de la exposición diaria máxima permisible al ruido, donde intervienen cinco variables (nivel de presión sonora, tiempo, tasa de intercambio, nivel sonoro y umbral de nivel sonoro) (Pavón 2007).

El Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000 es la normativa nacional que regula la exposición al ruido en ambientes de trabajo. Para efecto del cumplimiento de esta normativa y lo que establece la Resolución aprobatoria DRPM-IA-132-2016, el presente informe realiza el análisis del resultado obtenido en la medición de ruido laboral efectuada en el lugar donde se construye el proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”.

2.2.2. Objetivo general

Evaluar los niveles de ruido a los que están expuestos los trabajadores del proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”.

2.2.3. Objetivos específicos

- Identificar las fuentes de ruido (continuo, fluctuante e impulsivo).
- Verificar el uso correcto del equipo de protección auditiva.
- Analizar el resultado de la medición.

¹ DGNTI: Dirección General de Normas y Tecnología Industrial

² COPANIT: Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas

³ Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000, normativa que regula la exposición al ruido laboral

- Comparar el resultado obtenido con el valor de referencia establecido en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000.

2.2.4. Metodología

El 15 de julio de 2019 se desarrolló la inspección al proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”, para realizar el análisis de las características de la exposición al ruido y la dosimetría al trabajador que, por su función, puede estar expuesto al mayor nivel de ruido.

2.2.4.1. Especificaciones del equipo y datos de la inspección

Tabla 2.2.1. Especificaciones del equipo y datos de la inspección

| Dosimetría Laboral | |
|--|---|
| Equipo empleado | Dosímetro |
| Fabricante | Cirrus |
| Modelo/ Serie | CR:120A/ MK500455 |
| Fecha de calibración | 12 de marzo de 2019 |
| Escala | A |
| Respuesta | Lenta |
| Valores máximos permitidos por la norma | Dosis de 88 dB(A) para una jornada de 5 horas de trabajo. |
| Fecha de la medición | 15 de julio de 2019 |
| Turno (horario medido) | 9:33 a.m. a 2:13 p.m. |
| Metodología aplicada | ANSI S12.19-1996 |
| Norma aplicada | Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT-44-2000 |
| Nombre de colaboradores y área de trabajo en la cual se desempeñan durante la medición | Marcelino Ávila (operador de montacargas) |
| Nombre del técnico | Yeleinshka Yaleman |
| Persona de contacto | |
| Nombre | Miguel Pereira |
| Teléfono | 6983-9191 |
| Correo electrónico | mpereira@marazul.com.pa |
| Fecha de emisión | 16-10-2019 |

Fuente: Especificaciones técnicas del equipo de dosimetría, 2019. Ver Certificados de calibración y el extracto de la Norma de ruido laboral en el anexo 2.2.4

2.2.4.2. Procedimiento de medición para dosimetría

- Determinar el área de influencia de las principales fuentes generadoras de ruido, que influyen en los puestos de trabajo.
- Seleccionar el puesto de trabajo que está expuesto a un nivel de ruido elevado.

- Comparar el resultado obtenido con la normativa utilizada como referencia (Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000).

Técnicas de medición

El dosímetro fue colocado sobre el cuerpo del colaborador, ubicando el micrófono cerca de la oreja, donde se procedió a medir el Leq y el porcentaje de dosis por un período de cinco (5) horas laborales, en base a la norma de servicio ANSI S12.19-1996.

2.2.5. Resultados

En la tabla 2.2.2 y en la gráfica 2.2.1 se presentan los datos de la medición realizada al colaborador Marcelino Ávila, por un período de 5 horas y su comparación con el valor normado. En el anexo 2.2.2 se presenta la data generada por el equipo de medición.


Tabla 2.2.2. Resultado obtenido en la dosimetría

| Parámetro Medido | colaborador | Valor Medido | Parámetro Normado |
|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| TWA dB(A) (5 horas) ⁴ | Marcelino Ávila | 81.4 dB(A) | 88 dB(A) |

Fuente: Datos de campo. CODESA, 2019.

⁴ Nivel sonoro medio con ponderación temporal para 8 horas proyectado en TWA.

Gráfica 2.2.1 Comparación entre el valor medido y el valor normado para el colaborador Abel Gil



Fuente: Datos de campo. CODESA, 2019.

Se identificaron como fuentes generadores de ruido fluctuantes: camiones volquetes estacionados pero encendidos, paso de vehículos pick up, paso de equipos pesados. Cabe mencionar, que el colaborador no contaba con protección auditiva.

2.2.6. Conclusión

El resultado obtenido en la dosimetría realizada al colaborador Marcelino Ávila, demuestra que, se cumple con el límite máximo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000 para una jornada de 5 horas continuas de exposición a ruido, por lo que las actividades que realiza el colaborador no afectan su salud.

2.2.7. Recomendaciones

- Dotar y hacer obligatorio el uso de los equipos de protección auditiva a los trabajadores, principalmente a aquellos que están expuestos a altos niveles de ruido.
- Realizar capacitaciones sobre el uso adecuado del equipo de protección personal, principalmente el auditivo.
- Realizar audiometrías a los trabajadores antes que inicien el proyecto y durante su estancia en el mismo para verificar que las actividades que desarrollan no estén afectando su salud ni su capacidad auditiva.

- Realizar el mantenimiento periódico a los equipos que se utilicen en el proyecto, a fin de reducir los niveles de ruido.

2.2.8. Bibliografía

- ACGHI (American Conference of Governmental Industrial Hygienists). 2012. Publications. En línea en: <http://www.acgih.org/store/>
- MICI (Ministerio de Comercio e Industrias). 2000. Dirección General de Normas y Tecnología Industrial. Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000. Higiene y seguridad en ambientes de trabajo donde se genere ruido. MINSA (Ministerio de Salud). Panamá.
- MSHA (Administración de Salud y Seguridad en Minas). 2011. Una Guía a Los Derechos y Responsabilidades de los Mineros - MSHA 3116-S (OT 2S) - (Added 11/22/2011) En línea en: <http://www.msha.gov/S&HINFO/minersrights/MinersRightsEsp.pdf>
- OSHA (Occupational Safety & Health Administration). 2011. Perfil de OSHA. OSHA, Washington DC. 3 p. En línea en: <http://www.osha.gov/Publications/3454-B-at-a-glance-SP.pdf>
- Pavón, I. 2007. Ambientes laborales de ruido en el sector minero de la comunidad de Madrid: clasificación, predicción y soluciones. Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, España. 533 p.

Anexos

Anexo 2.2.1. Reporte de imágenes



Imágenes 2.2.1 y 2.2.2. Vista del colaborador Marcelino Ávila antes de iniciar la inspección de Ruido Laboral

Anexo 2.2.2. Datos de la medición de ruido laboral

Data generada por el equipo de medición – Marcelino Ávila




Informe de resumen de medición

Nombre Agro Playa Blanca FII 15-07-2019
Tiempo 07/15/2019 9:33:48 a. m. **Persona** Marcelino Ávila **Lugar** Río Hato Coclé **Proyecto** AgroPlaya Blanca FII
Duración 05:40:08
Instrumento MK500455, CR:120A

Calibración

Antes 07/15/2019 8:53 a. m. Offset 0.43 dB **Después** 07/15/2019 3:14 p. m. Offset 0.14 dB

| Valores Peak & Max | | ISO LAeq | | ISO LCeq | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| LCPeak | 143.5 dB | LAeq | 81.4 dB | LCeq | 87.8 dB |
| LAFMax | 119.5 dB | LEX8 | 79.9 dB | | |
| LAFMaxTime | --- | Dosis | 30.9 % | | |
| | | LAE | 124.5 dB | | |

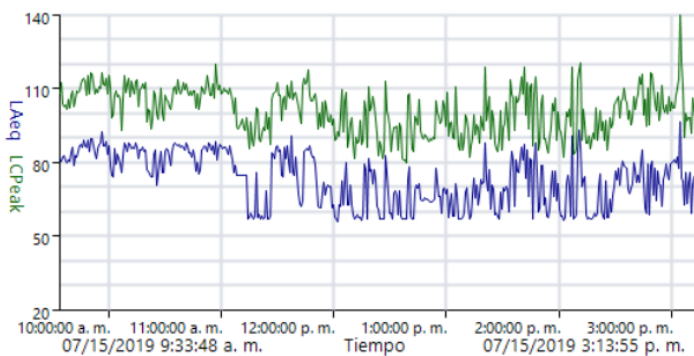

Anexo 2.2.3. Extracto de la Norma Nacional para Ruido Laboral

REPÚBLICA DE PANAMÁ
ASAMBLEA LEGISLATIVA
LEGISPAN

Tipo de Norma: RESOLUCION

Número: 506

Referencia: 506-1999

Año: 1999

Fecha (dd-mm-aaaa) : 06-10-1999

Título: REGLAMENTO TECNICO N° DGNTI-COMPANIT-44-2000. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Dictada por: MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS

Gaceta Oficial: 24163

Publicada el: 18-10-2000

Rama del Derecho: DER. ADMINISTRATIVO

Palabras Claves: Normas técnicas y especificaciones, Comercio e industrias

Páginas: 10

Tamaño en Mb: 1.077

Rollo: 513

Posición: 3832

N°24,163

Gaceta Oficial, miércoles 18 de octubre de 2000

27


7. ANEXO NORMATIVO.

7.1 Tabla No. 1. Nivel de exposición permisible en una jornada de trabajo de 8 horas.

| DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN MÁXIMA (En una jornada de trabajo de 8 Horas) | NIVEL DE RUIDO PERMISIBLE EN dB(A) |
|---|------------------------------------|
| 8 HORAS | 85 |
| 7 HORAS | 86 |
| 6 HORAS | 87 |
| 5 HORAS | 88 |
| 4 HORAS | 90 |
| 3 HORAS | 92 |
| 2 HORAS | 95 |
| 1 HORA | 100 |
| 45 MINUTOS | 102 |
| 30 MINUTOS | 105 |
| 15 MINUTOS | 110 |
| 7 MINUTOS | 115 |

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución tendrá vigencia una vez sea publicada en la Gaceta Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE


JOAQUÍN E. JACOME DIEZ
MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS

Anexo 2.2.4. Certificado de calibración del equipo de medición



Certificado de Calibración

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificado No.: DS-MK500455-OSC7993
Certificate number

Cliente: Corporación de Desarrollo Ambiental, S.A. (CODESA)
Customer

Dirección: Plaza Aventura, oficina M-23, Vía Ricardo J. Alfaro, El Dorado, Panamá
Address

Instrumento: DOSÍMETRO ACÚSTICO
Instrument

Fabricante: CIRRUS
Manufacturer

Modelo: CR:120A
Model

Número de serie: MK500455
Serial number

Registro único entrada: RC7993
RUE

Fecha de recepción: 2019-03-11
Date of receipt

Condición de ingreso: Sin anomalías visuales.
Entry condition

Fecha de calibración: 2019-03-12
Calibration date

Número de páginas del certificado incluyendo anexos: 3
Number of pages of this certificate and documents attached

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite.

This certificate is an accurate record of the performed measurements results. This certificate must not be partially reproduced, except with prior written permission of the issuing laboratory.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriated intervals.

Aprobó:
Approved by

ÁLVARO ANDRÉS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Director Técnico Laboratorio de calibración

Calibró: DHM

Fecha de emisión:
Issue Date

2019-03-12

Sello
Seal

CA-FT-019 V4 / 2017-05-19

Página 1 de 3

Carrera 67 No. 167-61 Oficina 209 • Centro Empresarial Colina Office Park
Bogotá Colombia • Teléfonos: 674 1061 - 674 1065
info@labserviceltida.com • www.labserviceltida.com



Certificado No. DS-MK500455-OSC7993

Método utilizado:

El instrumento descrito anteriormente fue calibrado por el método de comparación directa, de acuerdo a la normas CEI/IEC 61252 1ra Edición 1993-06, realizando las pruebas de ponderación frecuencial y linealidad, también descritas en el procedimiento interno CA-PR-005.

Condiciones Ambientales:

Temperatura Máxima: 23,5 °C
Temperatura Mínima: 22,4 °C

Humedad Relativa Máxima: 57,3 % HR
Humedad Relativa Mínima: 56,0 % HR

Presión atmosférica: 749,2 mbar
Δ Presión atmosférica: 0,9 mbar

Resultados de la calibración:

1. Estado previo a la calibración

1.1. Indicación del nivel de presión sonora inicial

| Frecuencia (Hz) | Valor esperado (dB) | Lectura Inicial (dB) | Lectura Final (dB) | Incertidumbre (dB) |
|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 000 | 94,0 | 93,68 | 94,00 | 0,19 |

1.2 Prueba de exposición sonora

Tiempo de Integración 180 s
Nivel de criterio 85 dB
Razón de Cambio 3 dB

| Nivel sonoro (dB) | Valor nominal % | Valor Promedio % | Error % | Error (dB) | Incertidumbre (dB) |
|-------------------|-----------------|------------------|---------|------------|--------------------|
| 94 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 104 | 50,40 | 49,56 | -0,84 | -0,07 | 0,19 |
| 114 | 507,97 | 492,80 | -15,17 | -0,13 | 0,19 |

2. Pruebas de Calibración

2.1 Ponderación en Frecuencia

| Frecuencia nominal (Hz) | Valor nominal (dB) | Valor promedio (dB) | Error (dB) | Incertidumbre (dB) |
|-------------------------|--------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 125 | 77,9 | 78,50 | 0,60 | 0,19 |
| 250 | 85,4 | 85,80 | 0,40 | 0,19 |
| 500 | 90,8 | 91,00 | 0,20 | 0,19 |
| 1 000 | 94,0 | 94,00 | 0,00 | 0,19 |
| 2 000 | 95,2 | 94,90 | -0,30 | 0,19 |
| 4 000 | 95,0 | 93,90 | -1,10 | 0,19 |

CA-FT-019 V4 / 2017-05-19

Página 2 de 3

Carrera 67 No. 167-61 Oficina 209 • Centro Empresarial Colina Office Park
Bogotá Colombia • Teléfonos: 674 1061 - 674 1065
info@labserviceltlda.com • www.labserviceltlda.com



Certificado No. DS-MK500455-OSC7993

2. Linealidad de las respuestas a señales estacionarias

| Nivel sonoro (dB) | Valor promedio (dB) | Error (dB) | Incertidumbre (dB) |
|-------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 94 | 94,00 | 0,00 | 0,19 |
| 104 | 104,00 | 0,00 | 0,19 |
| 114 | 114,00 | 0,00 | 0,19 |

Incertidumbre:

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" igual a 2 y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

Trazabilidad:

El Laboratorio LAB&SERVICE ELECTRÓNICA ESPECIALIZADA Ltda., asegura el mantenimiento de la trazabilidad al amper (A), metro (m), kilogramo (kg) y segundo (s), unidad base del SI, mediante los patrones utilizados en estas mediciones.

| Patrón utilizado | Identificación | Certificado No. | Calibrado por: |
|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| CALIBRADOR ACUSTICO | AC-009 | CAS-324078-Q6K0F2-901 | Brüel & Kjær |

Observaciones:

Los valores e incertidumbres asignadas corresponden al momento de la calibración, no considerándose la estabilidad a largo plazo del instrumento, y únicamente son válidos para el instrumento cuyos datos aparecen en la primera página. El Laboratorio LAB&SERVICE Electrónica Especializada Ltda., no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

Este instrumento cuenta con micrófono sin serial.

Otras Identificaciones: EQC0081

FIN DEL CERTIFICADO

Anexo 2.2.5. Cadena de Custodia

| CADENA DE CUSTODIA PARA INSPECCIÓN DE RUIDO LABORAL | | | | | | | RE-31 |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------|
| Datos generales | | | | | | | |
| Nombre del proyecto | Agro Playa Blanca Fase II | | | | | | |
| Lugar | Río Hato, Coclé | | | | Fecha | 15/julio/2019 | |
| Promotor | Agro Playa Blanca S.A. | | | | Persona de Contacto | Jorge Silva | |
| Teléfono | 391-7200 | | | | e-mail | jsilva@marozul.com.pa | |
| Características generales | | | | | | | |
| Nombre del trabajador | Actividades que realiza | Hora de inicio | Hora de fin | Tiempo de medición | Fuentes de ruido | Modelo del equipo de medición | |
| Maxelino Quila | operador de motoniveladora | 9:33 am | 3:13 pm | 5:0 horas 40 minutos | Camiones volqueteros estacionados, peso incendiados. Peso de vehículos pick up. Peso de equipo pesado. | Cirrus 120-A No MK500455 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Coordenadas (NAD27 o WGS 84) | | 17P 0592 431E / 09 22503N | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | |
| El operador no portaba tapones auditivos. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Elaborado por: Helenika Aleman | | | | Fecha: 15/7/2019 | | Hora: 9:30 am | |
| 8-798-892 | | | | | | | |

ANEXO 2.3. INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD DE AIRE PARTÍCULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN (PTS)



Informe de Inspección de Calidad de Aire- Partículas Totales en Suspensión (PTS)

Proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”

Preparado para:
Agro Playa Blanca, S.A.



Julio, 2019.

Informe de Inspección de Calidad de Aire
Partículas Totales en Suspensión (PTS)

Proyecto
“Agro Playa Blanca Fase II”

Preparado para:
Agro Playa Blanca, S.A.


Elaborado por:



N° SC-CER139957



Julio, 2019

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| |  |  |  |
| | Responsable | Control de calidad | Director Técnico |
| Idoneidad DIVEDA-AA-003-2012/ Act. 2018 | Jonathan Corro C.I.N° 2017-340-021 | Roy Quintero C.T. N°867 | Venicia Cerrud C.T N°597 |

Índice

| | |
|--|----|
| 2.3.1. Introducción | 4 |
| 2.3.2. Objetivo general | 4 |
| 2.3.3. Objetivos específicos | 4 |
| 2.3.4. Aspecto metodológico | 5 |
| 2.3.4.1. Especificaciones del equipo de medición y datos del monitoreo | 5 |
| 2.3.5. Resultados | 6 |
| 2.3.6. Declaración de conformidad | 8 |
| 2.3.7. Recomendaciones | 8 |
| 2.3.8. Bibliografía | 8 |
| Anexos | 10 |
| Anexo 2.3.1. Data generada por el equipo de medición | 11 |
| Anexo 2.3.2. Reporte de imágenes que fundamentan los monitoreos | 14 |
| Anexo 2.3.3. Extracto de la Norma para Calidad de Aire en Panamá | 17 |
| Anexo 2.3.4. Índices ICAIRE y ORAQI | 19 |
| Anexo 2.3.5. Certificado de calibracion del equipo | 21 |
| Anexo 2.3.6. Hoja de campo | 20 |

2.3.1. Introducción

Los contaminantes del aire son sustancias que, cuando están presentes en la atmósfera, afectan de manera adversa la salud de los humanos, animales y plantas o vida microbiana; dañan materiales o interfieren con el disfrute de la vida (Henry y Heinke 1999).

Existen organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la National Ambient Air Quality Standards (NAAQS), Air Quality Guidelines for Europe, Guía Ambiental Alemana de Control de la Contaminación del Aire, entre otras; que cuentan con valores de referencia internacionales de calidad de aire, cuyo propósito es servir de guía en lo relacionado a emisiones permisibles de partículas totales en suspensión (PTS), partículas menores a diez micrómetros (PM_{10}), concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO_2), dióxido de azufre (SO_2), monóxido de carbono (CO), entre otros.

Los efectos en la salud humana por exposición a material particulado, NO_2 , SO_2 y CO, incluyen afectaciones en el sistema respiratorio y cardiovascular principalmente (Henry y Heinke 1999).

Este documento corresponde al análisis de las mediciones de PTS, realizadas en el Punto 1: Frente al Edificio 200, del proyecto “Agro Playa Blanca Fase II” y el Punto 2: Casa más cercana al proyecto (Familia De La Guardia), con el objetivo de compararlos con el límite máximo e índice de calidad de aire, establecidos para cada medición.

2.3.2. Objetivo general

Evaluar los niveles de partículas totales suspendidas a los que están expuestos los trabajadores en el ambiente laboral y analizar los niveles de partículas captadas por los residentes en ambientes habitacionales.

2.3.3. Objetivos específicos

- Identificar las fuentes generadoras de partículas totales en suspensión, durante los trabajos de construcción del proyecto.
- Medir el nivel de PTS en el área donde se desarrollan los trabajos de construcción dentro del proyecto.
- Comparar el resultado del monitoreo en ambiente laboral con el límite máximo permisible que establece el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 para las partículas totales en suspensión.
- Identificar las actividades generadoras de partículas durante los trabajos de construcción del proyecto, y medir el nivel de PTS en la residencia más cercana al proyecto.
- Comparar el resultado de la medición de Partículas Totales en Suspensión para ambientes habitacionales, con los valores del índice de referencia de Calidad de Aire ORAQI – ICAIRE.

2.3.4. Aspecto metodológico

Establecimiento de un punto de monitoreo dentro del área del proyecto, y en la residencia más cercana al proyecto, para realizar la toma de datos, considerando la cercanía de la fuente o actividad generadora de partículas. Se desarrollaron los monitoreos para Partículas Totales Suspendidas (PTS), por un período de una (1) hora en los dos puntos establecidos.

Para los monitoreos se utilizó el equipo Microdust Pro (Casella), y el resultado de la medición realizada dentro del proyecto en el Punto 1: Frente al Edificio 200, se comparó con el límite máximo permisible establecido en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001. Para el caso del monitoreo efectuado en el Punto 2: Casa más cercana al proyecto (Familia De La Guardia), el resultado se comparó con el valor del índice de referencia de calidad de aire ORAQI – ICAIRE.

2.3.4.1. Especificaciones del equipo de medición y datos del monitoreo

En la tabla 2.3.1 se presentan las especificaciones del equipo de monitoreo y de las mediciones realizadas.

Tabla 2.3.1. Especificaciones del equipo de medición y datos de los monitoreos

| Información Técnica | |
|---|--|
| Equipo empleado | Microdust Pro-Casella |
| Serie | 3072719 |
| Fecha de la última calibración | 18 de octubre de 2018 |
| Ubicación de la medición | Sector de Buenaventura, corregimiento de Rio Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé |
| Coordenadas WGS 84. Punto 1: | Frente al Edificio 200: 922328 N/ 592078 E |
| Coordenadas WGS 84. Punto 2: | Casa más cercana al proyecto (Familia De La Guardia): 922142 N/ 592348 E |
| Normas aplicadas | <ul style="list-style-type: none"> Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 PTS = (CCT¹: 15 mg/m³) Índice de Calidad de Aire (ORAQI - ICAIRE), para Partículas Totales en Suspendidas. |
| Día de la medición | 18 de julio de 2019 |
| Período de medición. Punto 1: Frente al Edificio 200 | 1 hora (9:16 a.m. hasta 10:16 a.m.) |
| Período de medición. Punto 2: Casa más cercana al proyecto (Familia De La Guardia) | 1 hora (2:56 p.m. hasta 4:00 p.m.) |
| Inspector | Yeleinshka Yaleman |

¹ CCT: Concentración para exposición a corto tiempo. En el cual no debe ser excedido de 15 min, hasta 4 veces por jornada y con períodos de falta de exposición, al menos 1 hora entre dos exposiciones sucesivas.

| Persona de contacto | |
|---------------------|-------------------------|
| Nombre | Miguel Pereira |
| Teléfono | 6983-9191 |
| Correo electrónico | mpereira@marazul.com.pa |
| Fecha de emisión | 18-9-2019 |

Fuente: Especificaciones del equipo técnico y datos de campo. CODESA, 2019. Ver Certificados de calibración en el anexo 2.3.5.

2.3.5. Resultados

En la tabla 2.3.2 se presenta la comparación del valor obtenido en el Punto 1: Frente al Edificio 200, con el límite máximo permisible que establece el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001.

Tabla 2.3.2. Comparación entre los resultados y el valor normado

| Punto monitoreado | Área | Resultado mg/m^3 | Norma Nacional ² (CCT mg/m^3 ⁽³⁾) |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Punto 1 | Frente al Edificio 200 | 0.165 | 15 |


Fuente: Trabajo de campo. CODESA, 2019.

Durante el monitoreo en el Punto 1: Frente al Edificio 200, se observaron como fuentes generadoras de partículas, el paso de un camión volquete, movimiento de tierra y movimiento de maquinaria pesada.

² Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001.

³ mg/m^3 miligramos aproximados de partículas por metro cúbico.

Gráfica 2.3.1. Resultado de la medición de PTS en comparación con el valor normado – “Agro Playa Blanca Fase II”

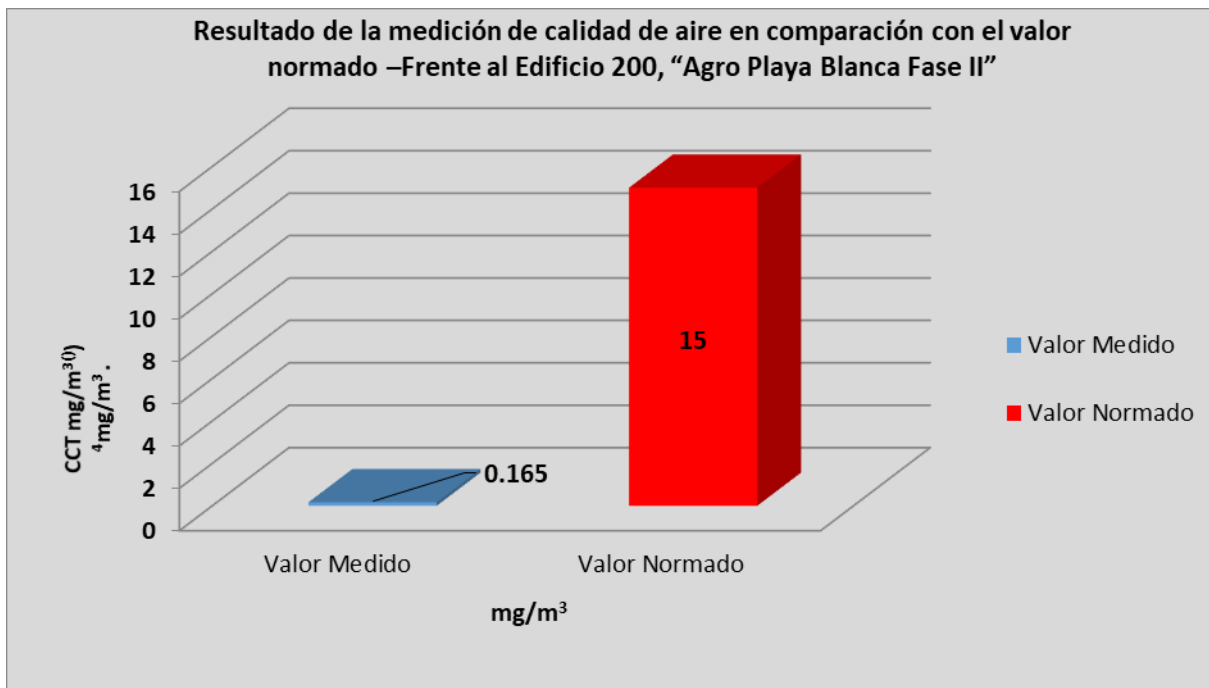

Fuente: CODESA, 2019.

En la tabla 2.3.3, se presenta la comparación del resultado obtenido en la medición del Punto 2: Casa más cercana al proyecto (Familia De La Guardia), con el porcentaje de calidad que establece el Índice de Calidad de Aire (ORAQI - ICAIRE).

Tabla 2.3.3. Comparación entre los resultados y el valor normado

| Punto monitoreado | Área | Parámetro | Resultado (µg/m ³) | Resultado (%) | ORAQI -ICAIRE (%) ⁴ |
|-------------------|--|-----------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Punto 2 | Casa más cercana al proyecto (Familia De La Guardia) | PTS | 148 | 70.4 | 100 |

Fuente: ORAQI – ICAIRE. Ver anexo 2.3.4. Valores porcentuales y de concentración de referencia para el cálculo de los índices ORAQI-ICAIRE.

⁴ Oack Ridge Air Quality Index (ORAQI) - Índice de calidad de aire (ICAIRE), se manifiesta en %.

Tabla 2.1.6. Escala para la evaluación de la calidad del aire - ICAIRE

| Tipología de la calidad del aire | ICAIRE |
|----------------------------------|------------|
| Óptima | 100 – 80 % |
| Buena | 80 – 60 % |
| Aceptable | 60 – 40 % |
| Estado de emergencia | 40 – 20 % |
| Inaceptable | 20 – 0% |

Fuente: Conesa, 1997.

En el Punto 2: Casa más cercana al proyecto (Familia De La Guardia), se identificó como fuente generadora de partículas, el paso de vehículos (pick-up) y camiones volquetes.

2.3.6. Declaración de conformidad

El valor obtenido en la medición de PTS realizada en el Punto 1: Frente al Edificio 200, cumple con el límite máximo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001.

El valor obtenido en la medición de PTS realizada en el Punto 2: Casa más cercana al proyecto (Familia De La Guardia), indica que, la calidad del aire se encuentra dentro de la evaluación descrita como “Buena”, de acuerdo con el índice de calidad de aire ORAQI – ICAIRE, utilizada como referencia.

2.3.7. Recomendaciones

- Continuar con el mantenimiento y la evaluación periódica de los equipos y las maquinarias que se utilizan en el proyecto.
- Mantener la implementación de las medidas para el control del polvo (riego de áreas) en las zonas donde se requiera.
- Continuar con los monitoreos de partículas que brindan información sobre la calidad de aire en el área del proyecto.

2.3.8. Bibliografía


- Henry, JG; Heinke, GW. 1999. Ingeniería Ambiental. 2da. Edición. Pearson Prentice Hall, México. 788.
- MICI - DGNTI (Ministerio de Comercio e Industrias - Dirección General de Normas y Tecnología Industrial). 2001. Reglamento Técnico DGNT-COPANIT 43-2001. Higiene y seguridad industrial. Condiciones de higiene y seguridad para el control de la contaminación atmosférica en ambientes de trabajo producida por sustancias químicas. República de Panamá.

- OMS (Organización Mundial de la Salud). 2005. Guías de Calidad de Aire relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Resumen de evaluación de los riesgos. Actualización mundial 2005.


Anexos

Anexo 2.3.1. Data generada por el equipo de medición

Data del Monitoreo de Calidad de Aire (PTS) en el Punto 1: Frente al Edificio 200

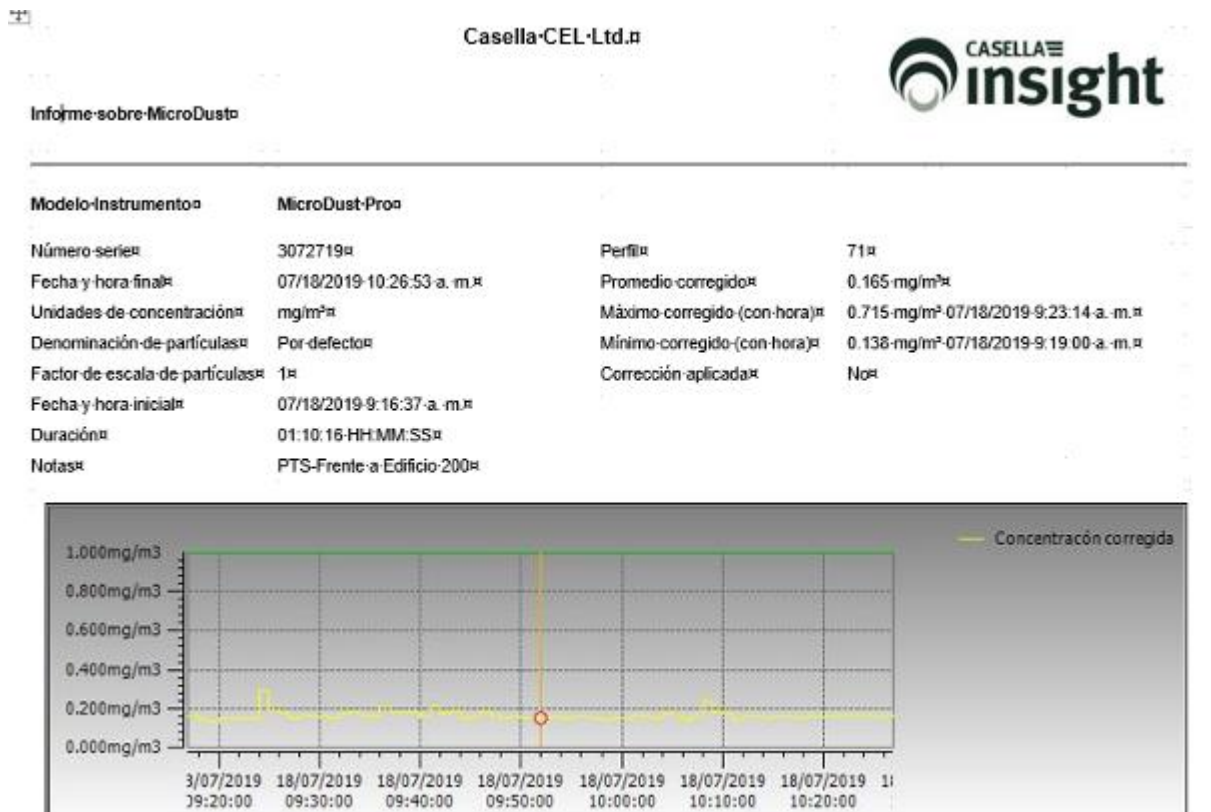

Data del Monitoreo de Calidad de Aire (PTS) en el Punto 2: Casa más cercana al proyecto (Familia De La Guardia)

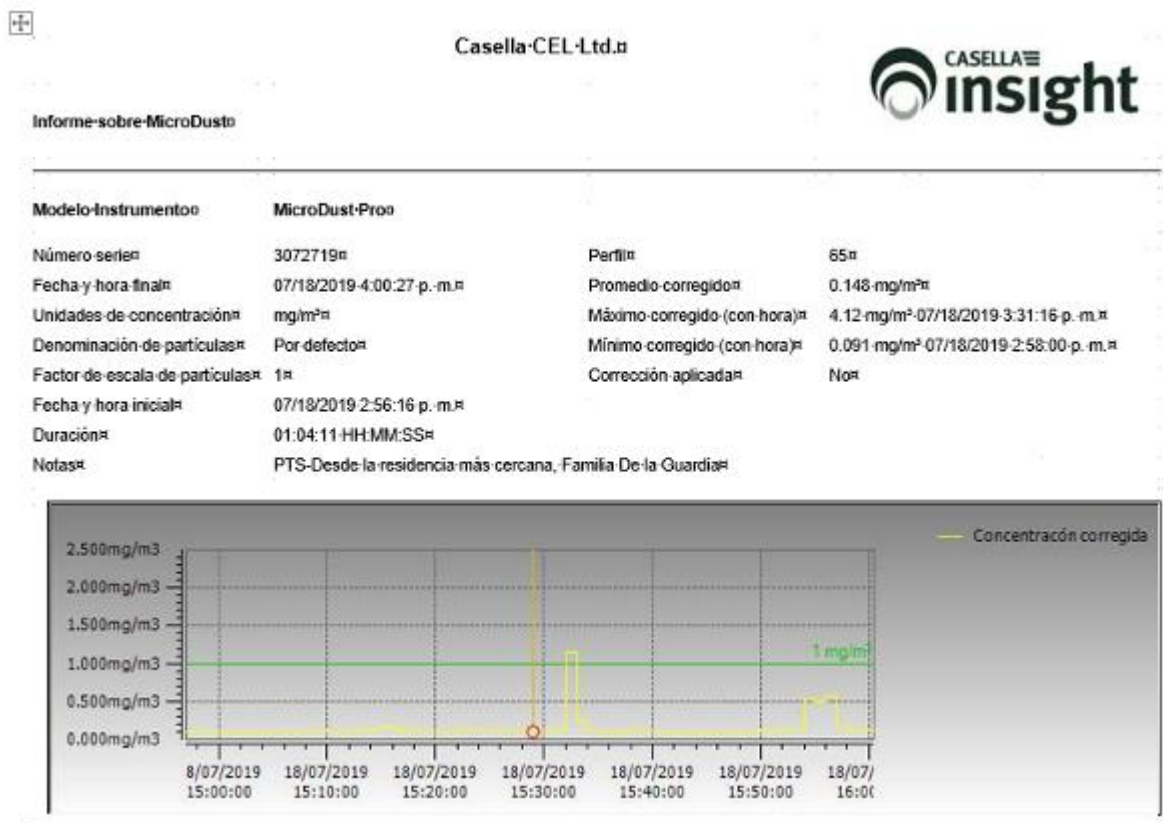

Anexo 2.3.2. Reporte de imágenes de los monitoreos



Imagen 2.3.1. Vista del equipo utilizado en el Punto 1:
Frente al Edificio 200



Imagen 2.3.2. Vista de las fuentes generadoras de partículas
(paso de camión volquete y movimiento de tierra)



Imagen 2.3.3. Vista del equipo utilizado en el Punto 2: Casa más cercana al proyecto (Familia De La Guardia)



Imagen 2.3.4. Vista de una de las fuentes generadoras de partículas (paso de vehículo pick-up)

Anexo 2.3.3. Extracto de la Norma para Calidad de Aire en Panamá

GACETA OFICIAL

ORGANO DEL ESTADO

AÑO XCVII

PANAMÁ, R. DE PANAMÁ JUEVES 17 DE MAYO DE 2001

Nº 24,303

CONTENIDO

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL

RESOLUCION Nº 124

(De 20 de marzo de 2001)

"APROBAR EL REGLAMENTO TECNICO DGNTI-COPANIT 43-2001 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL." PAG. 1

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RESOLUCION Nº 09 JD-A.T.T.T.

(De 14 de mayo de 2001)

"SE APRUEBA EL ACUERDO SUSCRITO ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJADORES ORGANIZADOS (CONATO), LA CAMARA NACIONAL DE TRANSPORTE (CANATRA) Y REPRESENTANTES DEL GOBIERNO NACIONAL, EL DIA 14 DE MAYO DE 2001." PAG. 44

AVISOS Y EDICTOS PAG. 45

Gaceta Oficial, jueves 17 de mayo de 2001

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD
PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA EN AMBIENTES DE TRABAJO
PRODUCIDA POR SUSTANCIAS QUÍMICAS.

REGLAMENTO TÉCNICO
DGNTI – COPANIT 43-2001

| COMPUESTOS QUÍMICOS | CPT | | CCT | |
|--|-----|-------------------|-----|-------------------|
| | ppm | mg/m ³ | ppm | mg/m ³ |
| Partículas de Ninguna Manera Reguladas (Fracción Respirable) | - | 5 | - | 10 |
| Partículas de Ninguna Manera Reguladas (Povo Total) | - | 10 | - | 15 |

Anexo 2.3.4. Índices ICAIRE y ORAQI

Valores porcentuales y de concentración de referencia para los cálculos de los índices ICAIRE y ORAQI

| PM₁₀ | Partículas Totales en Suspensión (µg/m³) | % |
|------------------------|--|----------|
| 1800 | 1800 | 0 |
| 1400 | 1400 | 10 |
| 1000 | 1000 | 20 |
| 600 | 750 | 30 |
| 400 | 500 | 40 |
| 250 | 300 | 50 |
| 200 | 200 | 60 |
| 150 | 150 | 70 |
| 100 | 100 | 80 |
| 50 | 50 | 90 |
| <25 | <25 | 100 |

Fuente: Canarina, 2001.

Anexo 2.3.5. Certificado de calibración del equipo



CERTIFICATE OF CALIBRATION



Aerosol Monitor

Manufacturer: Casella
Model Number: CEL-712
Serial Number: 3072719
Service Order: 27567
Reference Number: 27567-CEL712-3072719
Customer Name: CODESA, S.A.

Calibration Date: October 18, 2018
Date Due:
Temperature: 72.8 °F
Relative Humidity: 43 %
Barometric Pressure: 30.00 inHg
Customer Address: Plaza Adventura M-23
Panama, Panama

Calibration Data

| Zero Stability | Mass Concentration |
|----------------|-------------------------|
| Average: | 0.000 mg/m ³ |
| Minimum: | 0.000 mg/m ³ |
| Maximum: | 0.000 mg/m ³ |

| | |
|------------------|----------------|
| Flow Rate: | 1.714 LPM |
| Operating Range: | 1.4 to 2.4 LPM |

| | |
|----------------------|-----------|
| Final Function Check | Completed |
|----------------------|-----------|

| Aerosol Concentration | | Calibration Factor | 0.279 |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------|
| Reference | Instrument | Percent of Standard | |
| 20.57 mg/m ³ | 20.48 mg/m ³ | 99.56% | |

STANDARDS

| Manufacturer | Description | Model | Serial Number | Certificate Number | Due Date |
|--------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|
| Radwag | Analytical Balance | AS 60/C/2 | 303615/10 | A2977154 | 10/5/2019 |
| PTI | ISO 12103-1 Dust | A2 Fine Test Dust | N/A | N/A | NCR |
| TSI | Mass Flow Meter | 4043F | 40430838004 | 00025072-000007609 | 9/20/2019 |

This report may not be reproduced except in full and shall not be used to claim endorsement of The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA). CIH Calibration Laboratory certifies that the instrument specified above meets the manufacturer's specifications and was calibrated using standards and instruments also listed below where the accuracy is traceable to National Institute of Standards and Technology (NIST), and the calibration systems and records are in compliance to ISO/IEC 17025:2005. Data presented in this report follows WS-0403H & WS-0803D or suitable replacement document and only relates to instrument at time of test.

The reported uncertainty of measurement is stated as the combined standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$. The measured value and the associated expanded uncertainty represent the interval $(y \pm U)$, which contains the value of the measured quantity with a probability of approximately a 95% confidence interval. The uncertainty was estimated following the guidelines of the ISO 17025 and the GUM. $U \pm 1.9 \text{ mg/m}^3$ (Gravimetric) & 2.4% (Flow).

Technician: Jonathan Terry Date: 10/18/2018

Jonathan Terry - Calibration Technician

1806 South Highland Ave • Clearwater, FL 33756-1762 • USA • PH: (727) 584-5063 • FX: (727) 581-5921

Toll Free: (888) 873-2443 • Website: <http://www.cihequipment.com>

Page 01 of 02



AS FOUND DATA



Aerosol Monitor

Manufacturer: Casella
Model Number: CEL-712
Serial Number: 3072719
Service Order: 27567
Reference Number: 27567-CEL712-3072719
Customer Name: CODESA, S.A.

Calibration Date: October 18, 2018
Temperature: 72.8 °F
Relative Humidity: 45 %
Barometric Pressure: 30.01 inHg
Customer Address: Plaza Adventura M-23
Panama, Panama

Calibration Data

| Zero Stability | Mass Concentration |
|----------------|-------------------------|
| Average: | 0.000 mg/m ³ |
| Minimum: | 0.000 mg/m ³ |
| Maximum: | 0.000 mg/m ³ |

| | |
|------------------|----------------|
| Flow Rate: | 1.718 LPM |
| Operating Range: | 1.4 to 2.4 LPM |

| | |
|----------------------|-----------|
| Final Function Check | Completed |
|----------------------|-----------|

| Aerosol Concentration | | Calibration Factor | 1.00 |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|------|
| Reference | Instrument | Percent of Standard | |
| 22.34 mg/m ³ | 77.50 mg/m ³ | 346.91% | |

STANDARDS

| Manufacturer | Description | Model | Serial Number | Certificate Number | Due Date |
|--------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|
| Radwag | Analytical Balance | AS 60/C/2 | 303615/10 | A2977154 | 10/5/2019 |
| PTI | ISO 12103-1 Dust | A2 Fine Test Dust | N/A | N/A | NCR |
| TSI | Mass Flow Meter | 4043F | 40430838004 | 00025072-000007609 | 9/20/2019 |

This report may not be reproduced except in full and shall not be used to claim endorsement of The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA). CIH Calibration Laboratory certifies that the instrument specified above meets the manufacturer's specifications and was calibrated using standards and instruments also listed below where the accuracy is traceable to National Institute of Standards and Technology (NIST), and the calibration systems and records are in compliance to ISO/IEC 17025:2005. Data presented in this report follows WS-0403H & WS-0803D or suitable replacement document and only relates to instrument at time of test.

The reported uncertainty of measurement is stated as the combined standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$. The measured value and the associated expanded uncertainty represent the interval $(y \pm U)$, which contains the value of the measured quantity with a probability of approximately a 95% confidence interval. The uncertainty was estimated following the guidelines of the ISO 17025 and the GUM. $U \pm 1.9 \text{ mg/m}^3$ (Gravimetric) & 2.4% (Flow).

Technician: Jonathan Terry Date: 10/18/2018
Jonathan Terry - Calibration Technician
1806 South Highland Ave • Clearwater, FL 33756-1762 • USA • PH: (727) 584-5063 • FX: (727) 581-5921
Toll Free: (888) 873-2443 • Website: <http://www.cihequipment.com> Page 02 of 02

Anexo 2.3.6. Hoja de campo



| CADENA DE CUSTODIA (PARTICULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN - PTS) | | | | | | RE-39 |
|---|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Datos generales | | | | | | |
| Nombre del proyecto | Agro Playa Blanca Fase II | | | | | |
| Lugar | Río Pinto, Canelo | | | | Fecha | 18/Julio/2019 |
| Promotor | Agro Playa Blanca S.A. | | | | Persona de Contacto | Jorge Silva |
| Teléfono | 3 91-7200 | | | | e-mail | jsilva@marayul-um.pa |
| Condiciones climáticas | | | | | | |
| Parámetros | | | Estado del tiempo | | | |
| Humedad relativa | 68.3% | Soleado | ✓ | Época Seca | — | |
| Dirección del viento | — | Nublado | — | Época Lluviosa | ✓ | |
| Velocidad del viento | 4.2 km/h | Lluvioso | — | Coordenadas (NAD27 o WGS 84) | 17P 0592078E 0922328N | |
| Temperatura | 31.3°C | | | | | |
| Características generales del monitoreo | | | | | | |
| Puntos de Monitoreo | Coordenadas de la fuente generadora (NAD27 o WGS 84) | Fuente Generadora de Partículas | Hora de Inicio | Hora de fin | Tiempo de medición | Modelo del equipo de medición |
| Frente a Edificio 200 | 17P 0592078E 0922308N | Movimiento de tierra Movimiento de maquinaria | 9:14 am | 10:26 am | 1.0 hora 20 minutos | Hidrust Bo Coella 3072719 |
| Observaciones | | | | | | |
| Se realizaban actividades de repelamiento y movimiento de tierra con la maquinaria y conidos volquetes. | | | | | | |
| Elaborado por | | | Fecha: | | Hora: | |
| Hidrust Bo | | | 18/Julio/2019 | | 10:00 am | |



| HOJA DE CAMPO (PARTICULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN - PTS) | | | | RE-39 |
|--|---------------------------|---------------------|------------------------|-------|
| Datos generales | | | | |
| Nombre del proyecto | Agro Playa Blanca Fase II | | | |
| Lugar | Rio Hato Cocle' | Fecha | 18-7-19 | |
| Promotor | Agro Playa Blanca SA | Persona de Contacto | Jorge Silva | |
| Teléfono | 391-7200 | e-mail | jsilva@marayul.com.pa. | |

| Condiciones climáticas | | | | | |
|------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Parámetros | | Estado del tiempo | | | |
| Humedad relativa | 68.3% | Soleado | <input checked="" type="checkbox"/> | Época Seca | |
| Dirección del viento | | Nublado | | Época Lluviosa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Velocidad del viento | 4.2 Km/h | Lluvioso | | Coordenadas (NAD27 o WGS 84) | 922328N 592078E |
| Temperatura | 31.3°C | | | | |

| Características generales del monitoreo | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|
| Puntos de Monitoreo | Coordenadas de la fuente generadora (NAD27 o WGS 84) | Fuente Generadora de Partículas | Hora de inicio | Hora de fin | Tiempo de medición | Modelo del equipo de medición |
| Frente a | 922308N | • Movimiento de | 9:16 | 10:16 | 1 hr | Casella |
| Edificio | 592078E | tierra | a.m. | a.m. | | 3072719 |
| 200 | | • movimiento de maquinaria | | | | |
| Observaciones | | | | | | |
| • movimiento de tierra y nivelación de terreno | | | | | | |
| Elaborado por: <i>Andrés Alemán</i> | | | | | | |
| Fecha: 18-7-19 | | | Hora: 10:00 a.m. | | | |

ANEXO 2.4. INFORME DE INSPECCIÓN DE VIBRACIONES



Informe de Inspección de Vibraciones

Proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”

Preparado para:
Agro Playa Blanca, S.A.



Julio, 2019

Informe de Inspección de Vibraciones





Proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”

Preparado para:
Agro Playa Blanca, S.A.

Elaborado por:



Julio, 2019

|  | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|--|---|
| |  |  |  |
| | Responsable | Control de calidad | Director técnico |
| Idoneidad DIVEDA-AA-003-2012/ Act.2018 | Jonathan Corro C.I.N° 2017-340-021 | Roy Quintero C.T. N°867 | Venicia Cerrud C.T N°597 |

Índice

| | |
|--|----|
| 2.4.1. Introducción | 4 |
| 2.4.2. Objetivo general | 4 |
| 2.4.3. Objetivos específicos..... | 4 |
| 2.4.4. Metodología | 5 |
| 2.4.4.1. Especificaciones del equipo y datos del monitoreo..... | 5 |
| 2.4.4.2. Procedimiento de medición para vibraciones | 5 |
| 2.4.5. Resultado..... | 6 |
| 2.4.6. Declaración de conformidad | 9 |
| 2.4.7. Recomendaciones | 10 |
| 2.4.8. Bibliografía | 10 |
| Anexos | 11 |
| Anexo 2.4.1 Reporte de imágenes | 12 |
| Anexo 2.4.2 Datos de las mediciones de vibración..... | 14 |
| Anexo 2.4.3 Extracto de la Norma de Vibraciones en Panamá..... | 16 |
| Anexo 2.4.4 Certificado de calibración del equipo de medición..... | 21 |
| Anexo 2.4.5 Hojas de campo | 28 |

2.4.1. Introducción

La vibración es un movimiento oscilatorio de partículas de los cuerpos sólidos respecto a una posición de referencia, en relación al tiempo; es el número de veces por segundo que se realiza un ciclo completo al cual se le llama frecuencia y se mide en hertzios (ISO 1997; OIT 2001).

La vibración puede ser general, que es aquella que se transmite a todo el cuerpo, a través de las superficies de apoyo como los pies, regiones glúteas o puede ser local, la cual se refiere a la vibración aplicada a partes específicas del cuerpo, como las manos y brazos (MICI- DGNTI 2000).

Su valoración se hace a través de un instrumento de medida conocido como Vibrómetro, que contiene en su interior unos filtros de ponderación que se integran de acuerdo al potencial lesivo, el cual mide las siguientes variables: frecuencia, amplitud, eje X, Y o Z de entrada por mano-brazo o por cuerpo entero. Las vibraciones pueden alterar las actividades del trabajador ya que deteriora la adquisición de información y la salida de información (ya sea afectando la capacidad de concentración del trabajador, deteriorando sus capacidades motoras o coordinación). Con frecuencia no es posible relacionar directamente las alteraciones de las funciones fisiológicas en condiciones de campo con las vibraciones, dado que ésta suele actuar conjuntamente con otros factores significativos como la elevada tensión mental o el ruido (OIT 2001).

En exposiciones crónicas, los efectos nocivos más graves y frecuentes son las alteraciones en la columna vertebral y en el sistema nervioso central. Otros tipos de riesgos importantes para la salud producto de la vibración, son los trastornos de la circulación periférica (venas varicosas y hemorroides), cardiopatía isquémica, hipertensión, alteraciones neurovasculares y enfermedades gastrointestinales (Pichardo y Jiménez 2007).

En Panamá, el Reglamento Técnico DGNTI -COPANIT 45-2000, establece los límites máximos permisibles y el tiempo al que un trabajador puede estar expuesto a vibraciones, durante su jornada laboral. El presente informe de inspección analiza los resultados obtenidos en los monitoreos de vibraciones, realizados a la retroexcavadora, excavadoras hidráulicas y tractor de cadena, que se utilizan en el área del proyecto "Agro Playa Blanca Fase II".

2.4.2. Objetivo general

Evaluar los niveles de vibración a los que están expuestos los trabajadores que operan maquinarias en el proyecto "Agro Playa Blanca Fase II".

2.4.3. Objetivos específicos

- Identificar las fuentes que generan vibraciones dentro del proyecto.
- Evaluar los niveles de vibración de las fuentes identificadas, para establecer la relación entre los niveles máximos permisibles de vibración y los tiempos máximos permisibles de

exposición por jornada de trabajo, según los requisitos que establece el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45-2000.

2.4.4. Metodología

El 15 y 18 de julio de 2019 se desarrolló la inspección al proyecto “Agro Playa Blanca Fase II”, donde se evaluó el valor de la raíz media cuadrática de la aceleración de la vibración, así como el tiempo de exposición del trabajador. Al existir vibración en más de una dirección, se depreciará la posible interacción entre ellas (Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45-2000).

2.4.4.1. Especificaciones del equipo y datos del monitoreo

Tabla 2.4.1. Especificaciones del equipo y datos de los monitoreos

| Vibraciones | |
|---|--|
| Equipo empleado | Medidor de vibraciones |
| Fabricante | Casella Cel |
| Modelo | CEL-960; Serie: 20152 |
| Fecha de calibración | 30 de julio de 2018 |
| Fecha de la medición | 15 y 18 de julio de 2019 |
| Normas aplicadas | Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45-2000 |
| Áreas de trabajo en las cuales se desempeñaron los trabajadores durante la medición | 1. Operador de retroexcavadora 2. Operador de excavadora hidráulica 3. Operador de tractor de cadena |
| Inspector | Yeleinshka Yalaman |
| Persona de contacto | |
| Nombre | Miguel Pereira |
| Teléfono | 6983-9191 |
| Correo electrónico | mpereira@marazul.com.pa |
| Fecha de emisión | 18-9-2019 |

Fuente: Especificaciones técnicas del equipo de vibraciones, 2019. Ver el extracto de la Norma de vibraciones y el Certificado de calibración en los anexos 2.4.3 y 2.4.4.

2.4.4.2. Procedimiento de medición para vibraciones


- Seleccionar a los operadores de las maquinarias, que están expuestos a vibraciones.
- Comparar los resultados obtenidos con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45-2000.

Técnicas de medición

El sensor del vibrómetro se colocó en el asiento de cada una de las maquinarias (retroexcavadora, excavadora hidráulica y tractor de cadena), que se utilizan dentro del proyecto, con el propósito de medir las vibraciones percibidas por los operadores.

Se realizó la programación del equipo para medir las vibraciones a los trabajadores expuestos y se utilizó el filtro Wk, el cual mide vibraciones de todo el cuerpo en la dirección de la columna vertebral, en personas de pie o sentadas; para medir vibraciones en sentido vertical a la superficie donde se encuentran, en el caso de personas tumbadas; así como vibraciones en las tres direcciones espaciales (eje X, Y, Z), que influyen en los pies de las personas sentadas según la ISO 2631-1, tal como se muestra en la imagen 2.4.1 (persona en posición sentada).

Imagen 2.4.1. Esquema de la medición de vibración en tres direcciones espaciales

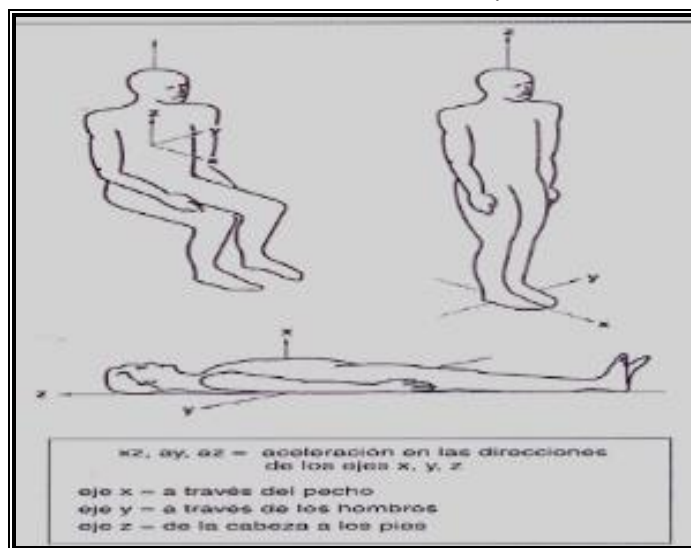

Fuente: ISO 2631-1:1997.

2.4.5. Resultados

En la tabla 2.4.2 se presentan los datos de las mediciones que se realizaron a los operadores de la retroexcavadora, excavadora hidráulica y tractor de cadena; en las tablas 2.4.3, 2.4.4 y 2.2.5 se presentan los resultados de los monitoreos de vibraciones comparados con el reglamento técnico de referencia. En el anexo 2.4.2 se muestra la data del equipo de medición.

Tabla 2.4.2. Datos del monitoreo de vibraciones

| Área de trabajo | Fecha y hora de medición | Nombre del Operador | Ubicación geográfica del equipo (UTM, WGS 84) | Equipo |
|-------------------------------------|--|---------------------|---|-----------------------|
| Movimiento de tierra y compactación | 15 de julio de 2019 1:13 p.m. a 2:40 p.m. | Emilio Bonilla | 922480 N 592389 E | Retroexcavadora |
| Movimiento de tierra y compactación | 18 de julio de 2019 11:13 am a 12:14 p.m. | Ariel Ávila | 922316 N 592041 E | Excavadora hidráulica |

| Área de trabajo | Fecha y hora de medición | Nombre del Operador | Ubicación geográfica del equipo (UTM, WGS 84) | Equipo |
|-------------------------------------|--|---------------------|---|-------------------|
| Movimiento de tierra y compactación | 18 de julio de 2019 1:35 pm a 2:28 p.m. | Antonio Amador | 922226 N 592014 E | Tractor de cadena |

Fuente: Datos de campo. CODESA, 2019.

Tabla 2.4.3. Resultado del Monitoreo de Vibraciones de la retroexcavadora- Agro Playa Blanca Fase II
– (Emilio Bonilla)

| Frecuencia media de la banda terciaria (Hz) | Aceleración en X (m/s ²) Periodo de Monitoreo 8 horas | | Aceleración en Y (m/s ²) Periodo de Monitoreo 8 horas | | Aceleración en Z (m/s ²) Periodo de Monitoreo 8 horas | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| | Medido | DGNTI-COPANIT 45-2000 | Medido | DGNTI-COPANIT 45-2000 | Medido | DGNTI-COPANIT 45-2000 |
| 1 | 0.647 | 0.224 | 0.944 | 0.224 | 0.240 | 0.630 |
| 1,25 | 0.643 | 0.224 | 0.788 | 0.224 | 0.436 | 0.560 |
| 1,6 | 0.778 | 0.224 | 0.981 | 0.224 | 1.12 | 0.500 |
| 2 | 0.420 | 0.224 | 0.605 | 0.224 | 0.986 | 0.450 |
| 2,5 | 0.261 | 0.240 | 0.444 | 0.240 | 1.49 | 0.400 |
| 3,15 | 0.273 | 0.555 | 0.363 | 0.555 | 2.91 | 0.355 |
| 4 | 0.393 | 0.450 | 0.472 | 0.450 | 1.37 | 0.315 |
| 5 | 0.340 | 0.560 | 0.402 | 0.560 | 0.638 | 0.315 |
| 6,3 | 0.243 | 0.710 | 0.372 | 0.710 | 0.463 | 0.315 |
| 8 | 0.284 | 0.900 | 0.342 | 0.900 | 0.400 | 0.315 |
| 10 | 0.357 | 1.120 | 0.385 | 1.120 | 0.320 | 0.400 |
| 12,5 | 0.555 | 1.400 | 0.360 | 1.400 | 0.253 | 0.500 |
| 16 | 0.697 | 1.800 | 0.368 | 1.800 | 0.333 | 0.630 |
| 20 | 0.259 | 2.240 | 0.353 | 2.240 | 0.226 | 0.800 |
| 25 | 0.233 | 2.800 | 0.322 | 2.800 | 0.258 | 1.000 |
| 31,5 | 1.26 | 3.550 | 1.31 | 3.550 | 0.708 | 1.250 |
| 40 | 1.48 | 4.500 | 1.07 | 4.500 | 0.202 | 1.600 |
| 50 | 0.417 | 5.600 | 0.421 | 5.600 | 0.0938 | 2.000 |
| 63 | 0.280 | 7.100 | 0.202 | 7.100 | 0.149 | 2.500 |
| 80 | 0.158 | 9.000 | 0.142 | 9.000 | 0.131 | 3.150 |

Fuente: CODESA, 2019.

De acuerdo con los resultados de la medición (ver tabla 2.4.3), los valores obtenidos en el eje (X), en las frecuencias (1, 1.25, 1.6, 2, 2.5), en el eje (Y) en las frecuencias (1, 1.25, 1.6, 2, 2.5 y 4) y en el eje

(Z) en las frecuencias (1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8), sobrepasan los valores máximos establecidos en la norma de referencia.

Tabla 2.4.4. Resultado del Monitoreo de Vibraciones de la excavadora hidráulica - Agro Playa Blanca Fase II – (Ariel Ávila)

| Frecuencia media de la banda terciaria (Hz) | Aceleración en X (m/s^2) Periodo de Monitoreo 8 horas | | Aceleración en Y (m/s^2) Periodo de Monitoreo 8 horas | | Aceleración en Z (m/s^2) Periodo de Monitoreo 8 horas | |
|---|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | Medido | DGNTI-COPANIT 45-2000 | Medido | DGNTI-COPANIT 45-2000 | Medido | DGNTI-COPANIT 45-2000 |
| 1 | 1.20 | 0.224 | 0.597 | 0.224 | 0.312 | 0.630 |
| 1,25 | 0.775 | 0.224 | 0.636 | 0.224 | 0.386 | 0.560 |
| 1,6 | 1.02 | 0.224 | 0.762 | 0.224 | 0.523 | 0.500 |
| 2 | 1.75 | 0.224 | 1.16 | 0.224 | 0.716 | 0.450 |
| 2,5 | 1.26 | 0.240 | 1.34 | 0.240 | 0.895 | 0.400 |
| 3,15 | 1.65 | 0.555 | 1.27 | 0.555 | 0.951 | 0.355 |
| 4 | 1.60 | 0.450 | 1.36 | 0.450 | 0.921 | 0.315 |
| 5 | 1.70 | 0.560 | 2.09 | 0.560 | 0.729 | 0.315 |
| 6,3 | 2.34 | 0.710 | 1.98 | 0.710 | 0.918 | 0.315 |
| 8 | 2.12 | 0.900 | 1.49 | 0.900 | 1.55 | 0.315 |
| 10 | 2.29 | 1.120 | 1.92 | 1.120 | 2.62 | 0.400 |
| 12,5 | 1.35 | 1.400 | 1.32 | 1.400 | 1.83 | 0.500 |
| 16 | 1.06 | 1.800 | 1.65 | 1.800 | 1.96 | 0.630 |
| 20 | 1.38 | 2.240 | 2.22 | 2.240 | 2.07 | 0.800 |
| 25 | 1.05 | 2.800 | 1.60 | 2.800 | 1.27 | 1.000 |
| 31,5 | 0.826 | 3.550 | 0.985 | 3.550 | 0.766 | 1.250 |
| 40 | 0.815 | 4.500 | 0.841 | 4.500 | 0.435 | 1.600 |
| 50 | 0.763 | 5.600 | 0.783 | 5.600 | 0.326 | 2.000 |
| 63 | 0.758 | 7.100 | 0.891 | 7.100 | 0.266 | 2.500 |
| 80 | 0.542 | 9.000 | 0.620 | 9.000 | 0.189 | 3.150 |

Fuente: CODESA, 2019.

De acuerdo con los resultados de la medición (ver tabla 2.4.4), los valores obtenidos en el eje (X) en las frecuencias (1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8 y 10), en el eje (Y), en las frecuencias (1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8 y 10), y en el eje (Z), en las frecuencias (1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8 y 10, 12.5, 16, 20 y 25), sobrepasan los límites máximos establecidos en la norma.

Tabla 2.4.5. Resultado del Monitoreo de Vibraciones de la - Agro Playa Blanca Fase II – (Antonio Amador)

| Frecuencia media de la banda terciaria (Hz) | Aceleración en X (m/s ²) Periodo de Monitoreo 8 horas | | Aceleración en Y (m/s ²) Periodo de Monitoreo 8 horas | | Aceleración en Z (m/s ²) Periodo de Monitoreo 8 horas | |
|---|---|------------------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|
| | Medido | DGNTI- COPANIT 45-2000 | Medido | DGNTI-COPANIT 45-2000 | Medido | DGNTI- COPANIT 45-2000 |
| 1 | 0.656 | 0.224 | 0.928 | 0.224 | 0.261 | 0.630 |
| 1,25 | 0.712 | 0.224 | 0.972 | 0.224 | 0.269 | 0.560 |
| 1,6 | 0.744 | 0.224 | 0.936 | 0.224 | 0.299 | 0.500 |
| 2 | 0.812 | 0.224 | 0.945 | 0.224 | 0.296 | 0.450 |
| 2,5 | 0.952 | 0.240 | 1.20 | 0.240 | 0.384 | 0.400 |
| 3,15 | 1.07 | 0.555 | 1.55 | 0.555 | 0.880 | 0.355 |
| 4 | 1.65 | 0.450 | 2.18 | 0.450 | 0.749 | 0.315 |
| 5 | 2.04 | 0.560 | 2.36 | 0.560 | 0.677 | 0.315 |
| 6,3 | 2.37 | 0.710 | 2.34 | 0.710 | 0.953 | 0.315 |
| 8 | 1.37 | 0.900 | 1.67 | 0.900 | 1.12 | 0.315 |
| 10 | 2.25 | 1.120 | 2.39 | 1.120 | 1.05 | 0.400 |
| 12,5 | 4.51 | 1.400 | 3.90 | 1.400 | 0.739 | 0.500 |
| 16 | 2.43 | 1.800 | 2.11 | 1.800 | 1.05 | 0.630 |
| 20 | 1.96 | 2.240 | 2.00 | 2.240 | 0.765 | 0.800 |
| 25 | 1.45 | 2.800 | 1.29 | 2.800 | 0.628 | 1.000 |
| 31,5 | 1.05 | 3.550 | 0.840 | 3.550 | 2.12 | 1.250 |
| 40 | 0.911 | 4.500 | 0.876 | 4.500 | 0.401 | 1.600 |
| 50 | 0.551 | 5.600 | 0.622 | 5.600 | 0.290 | 2.000 |
| 63 | 0.564 | 7.100 | 0.522 | 7.100 | 0.756 | 2.500 |
| 80 | 0.615 | 9.000 | 0.577 | 9.000 | 0.309 | 3.150 |

Fuente: CODESA, 2019.

De acuerdo con los resultados de la medición (ver tabla 2.4.5), los valores obtenidos en el eje (X) en las frecuencias (1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5 y 16), en el eje (Y) en las frecuencias (1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5 y 16) y el eje (Z) en las frecuencias (3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5 y 16), sobrepasan los valores máximos establecidos en la norma.

2.4.6. Declaración de conformidad

Los resultados obtenidos en las mediciones realizadas a los operadores de la retroexcavadora (Emilio Bonilla), excavadora hidráulica (Ariel Ávila) y tractor de cadena (Antonio Amador), muestran que, para los ejes (X), (Y) y (Z), los valores resultantes sobrepasan los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 45-2000; lo que indica que, las actividades que realizan los operadores, pueden ser perjudiciales a la salud.

2.4.7. Recomendaciones

- Realizar inspecciones detalladas y periódicas de la maquinaria y reemplazar los sistemas anti-vibraciones, amortiguadores, rodamientos y engranajes si están defectuosos.
- Mantener informados a los trabajadores al momento de iniciar la relación obrero patronal, sobre las posibles alteraciones de la salud, debido a la exposición de vibraciones en el área de trabajo.
- Continuar con los monitoreos de los niveles de vibraciones de las maquinarias que se encuentran en el proyecto.

2.4.8. Bibliografía

- ISO (Organización Internacional de Normalización). 1997. Norma ISO 2631-1:1997 Vibraciones y choques mecánicos. Guía para la estimación de la exposición de los individuos a vibraciones globales del cuerpo. Parte 1: Requerimientos generales.
- MICI (Ministerio de Comercio e Industrias). 2000. Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45. Higiene y Seguridad Industrial. Condiciones de Higiene y Seguridad en Ambientes de Trabajo donde se generen Vibraciones. República de Panamá. Gaceta Oficial 24163, miércoles 18 de octubre de 2000. pp. 8-18. Disponible en: http://www.cnpml.org.pa/cnpml/leyes_normas/copanit_45_2000_vibraciones.pdf
- OIT (Organización Internacional del Trabajo). 2001. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. Tercera Edición, pp. 50.1-50.17. Disponible en: <http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/50.pdf>
- Pichardo, G. & Jiménez, M. 2007. Vibraciones y Salud en el trabajo. Revisión Bibliográfica. México. 16 p. Disponible en: http://exposicionesvirtuales.com/so_images/7597/vibraciones.pdf

Anexos

Anexo 2.4.1. Reporte de imágenes



Imagen 2.4.1. Vista del operador Emilio Bonilla (retroexcavadora)



Imagen 2.4.2. Vista del operador Ariel Ávila (excavadora hidráulica)



Imagen 2 4 3. Vista del operador Antonio Amador (tractor de cadena)

Anexo 2.4.2. Datos de las mediciones de vibración

Datos generados por el equipo de medición durante el monitoreo de vibraciones al trabajador Emilio Bonilla (retroexcavadora)

| X | | | Y | | | Z | |
|----------|-------|------------------|----------|-------|------------------|----------|---------|
| Data | Value | Unit | Data | Value | Unit | Data | Value |
| Spectrum | | | Spectrum | | | Spectrum | |
| 0.8Hz | 0.695 | m/s ² | 0.8Hz | 0.923 | m/s ² | 0.8Hz | 0.181 |
| 1Hz | 0.647 | m/s ² | 1Hz | 0.944 | m/s ² | 1Hz | 0.240 |
| 1.25Hz | 0.643 | m/s ² | 1.25Hz | 0.788 | m/s ² | 1.25Hz | 0.436 |
| 1.6Hz | 0.778 | m/s ² | 1.6Hz | 0.981 | m/s ² | 1.6Hz | 1.12 |
| 2Hz | 0.420 | m/s ² | 2Hz | 0.605 | m/s ² | 2Hz | 0.986 |
| 2.5Hz | 0.261 | m/s ² | 2.5Hz | 0.444 | m/s ² | 2.5Hz | 1.49 |
| 3.15Hz | 0.273 | m/s ² | 3.15Hz | 0.363 | m/s ² | 3.15Hz | 2.91 |
| 4Hz | 0.393 | m/s ² | 4Hz | 0.472 | m/s ² | 4Hz | 1.37 |
| 5Hz | 0.340 | m/s ² | 5Hz | 0.402 | m/s ² | 5Hz | 0.638 |
| 6.3Hz | 0.243 | m/s ² | 6.3Hz | 0.372 | m/s ² | 6.3Hz | 0.463 |
| 8Hz | 0.284 | m/s ² | 8Hz | 0.342 | m/s ² | 8Hz | 0.400 |
| 10Hz | 0.357 | m/s ² | 10Hz | 0.385 | m/s ² | 10Hz | 0.320 |
| 12.5Hz | 0.555 | m/s ² | 12.5Hz | 0.360 | m/s ² | 12.5Hz | 0.253 |
| 16Hz | 0.697 | m/s ² | 16Hz | 0.368 | m/s ² | 16Hz | 0.333 |
| 20Hz | 0.259 | m/s ² | 20Hz | 0.353 | m/s ² | 20Hz | 0.226 |
| 25Hz | 0.233 | m/s ² | 25Hz | 0.322 | m/s ² | 25Hz | 0.258 |
| 31.5Hz | 1.26 | m/s ² | 31.5Hz | 1.31 | m/s ² | 31.5Hz | 0.708 |
| 40Hz | 1.48 | m/s ² | 40Hz | 1.07 | m/s ² | 40Hz | 0.202 |
| 50Hz | 0.417 | m/s ² | 50Hz | 0.421 | m/s ² | 50Hz | 9.38E-2 |
| 63Hz | 0.280 | m/s ² | 63Hz | 0.202 | m/s ² | 63Hz | 0.149 |
| 80Hz | 0.158 | m/s ² | 80Hz | 0.142 | m/s ² | 80Hz | 0.131 |

Datos generados por el equipo de medición durante el monitoreo de vibraciones al trabajador Ariel Ávila (excavadora hidráulica)

| X | | Y | | Z | |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| Data | Value | Data | Value | Data | Value |
| Spectrum | | Spectrum | | Spectrum | |
| 0.8Hz | 0.852 | 0.8Hz | 0.712 | 0.8Hz | 0.300 |
| 1Hz | 1.20 | 1Hz | 0.597 | 1Hz | 0.312 |
| 1.25Hz | 0.775 | 1.25Hz | 0.636 | 1.25Hz | 0.386 |
| 1.6Hz | 1.02 | 1.6Hz | 0.762 | 1.6Hz | 0.523 |
| 2Hz | 1.75 | 2Hz | 1.16 | 2Hz | 0.716 |
| 2.5Hz | 1.26 | 2.5Hz | 1.34 | 2.5Hz | 0.895 |
| 3.15Hz | 1.65 | 3.15Hz | 1.27 | 3.15Hz | 0.951 |
| 4Hz | 1.60 | 4Hz | 1.36 | 4Hz | 0.921 |
| 5Hz | 1.70 | 5Hz | 2.09 | 5Hz | 0.729 |
| 6.3Hz | 2.34 | 6.3Hz | 1.98 | 6.3Hz | 0.918 |
| 8Hz | 2.12 | 8Hz | 1.49 | 8Hz | 1.55 |
| 10Hz | 2.29 | 10Hz | 1.92 | 10Hz | 2.62 |
| 12.5Hz | 1.35 | 12.5Hz | 1.37 | 12.5Hz | 1.83 |
| 16Hz | 1.06 | 16Hz | 1.65 | 16Hz | 1.96 |
| 20Hz | 1.38 | 20Hz | 2.22 | 20Hz | 2.07 |
| 25Hz | 1.05 | 25Hz | 1.60 | 25Hz | 1.27 |
| 31.5Hz | 0.826 | 31.5Hz | 0.985 | 31.5Hz | 0.766 |
| 40Hz | 0.815 | 40Hz | 0.841 | 40Hz | 0.435 |
| 50Hz | 0.763 | 50Hz | 0.783 | 50Hz | 0.326 |
| 63Hz | 0.758 | 63Hz | 0.891 | 63Hz | 0.266 |
| 80Hz | 0.542 | 80Hz | 0.620 | 80Hz | 0.189 |

**Datos generados por el equipo de medición durante el monitoreo de vibraciones al trabajador
Antonio Amador (tractor de cadena)**

X

Y

Z

| Data | Value | Data | Value | Data | Value | Unit |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|------------------|
| Spectrum | | Spectrum | | Spectrum | | |
| 0.8Hz | 0.603 | 0.8Hz | 0.837 | 0.8Hz | 0.235 | m/s ² |
| 1Hz | 0.656 | 1Hz | 0.928 | 1Hz | 0.261 | m/s ² |
| 1.25Hz | 0.712 | 1.25Hz | 0.972 | 1.25Hz | 0.269 | m/s ² |
| 1.6Hz | 0.744 | 1.6Hz | 0.936 | 1.6Hz | 0.299 | m/s ² |
| 2Hz | 0.812 | 2Hz | 0.945 | 2Hz | 0.296 | m/s ² |
| 2.5Hz | 0.952 | 2.5Hz | 1.20 | 2.5Hz | 0.384 | m/s ² |
| 3.15Hz | 1.07 | 3.15Hz | 1.55 | 3.15Hz | 0.880 | m/s ² |
| 4Hz | 1.65 | 4Hz | 2.18 | 4Hz | 0.749 | m/s ² |
| 5Hz | 2.04 | 5Hz | 2.36 | 5Hz | 0.677 | m/s ² |
| 6.3Hz | 2.37 | 6.3Hz | 2.34 | 6.3Hz | 0.953 | m/s ² |
| 8Hz | 1.37 | 8Hz | 1.67 | 8Hz | 1.12 | m/s ² |
| 10Hz | 2.25 | 10Hz | 2.39 | 10Hz | 1.05 | m/s ² |
| 12.5Hz | 4.51 | 12.5Hz | 3.90 | 12.5Hz | 0.739 | m/s ² |
| 16Hz | 2.43 | 16Hz | 2.11 | 16Hz | 1.05 | m/s ² |
| 20Hz | 1.96 | 20Hz | 2.00 | 20Hz | 0.765 | m/s ² |
| 25Hz | 1.45 | 25Hz | 1.29 | 25Hz | 0.628 | m/s ² |
| 31.5Hz | 1.05 | 31.5Hz | 0.840 | 31.5Hz | 2.12 | m/s ² |
| 40Hz | 0.911 | 40Hz | 0.876 | 40Hz | 0.401 | m/s ² |
| 50Hz | 0.551 | 50Hz | 0.622 | 50Hz | 0.290 | m/s ² |
| 63Hz | 0.564 | 63Hz | 0.522 | 63Hz | 0.756 | m/s ² |
| 80Hz | 0.615 | 80Hz | 0.577 | 80Hz | 0.309 | m/s ² |

Anexo 2.4.3. Extracto de la Norma de Vibraciones en Panamá

**REPÚBLICA DE PANAMÁ
ASAMBLEA LEGISLATIVA
LEGISPAN**

Tipo de Norma: RESOLUCION

Número: 505

Referencia: 505-1999

Año: 1999

Fecha (dd-mm-aaaa): 06-10-1999

Título: REGLAMENTO TECNICO N° DGNTI-COMPANIT-45-2000. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Dictada por: MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS

Gaceta Oficial: 24163

Publicada el: 18-10-2000

Rama del Derecho: DER. INDUSTRIAL Y DE MINAS

Palabras Claves: Normas técnicas y especificaciones, Comercio e industria

Páginas: 13

Tamaño en Mb: 0.561

Rollo: 513

Posición: 3827

**MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y
TECNOLOGIA INDUSTRIAL
RESOLUCION N° 505
(De 6 de octubre de 1999)**

**MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL**

**REGLAMENTO TÉCNICO
DGNTI – COPANIT 45 – 2000**

**HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD
EN AMBIENTES DE TRABAJO DONDE SE
GENEREN VIBRACIONES.**

| Frecuencia media de la banda terciaria | Aceleración en m / s^2 Tiempo de exposición diaria | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | (Hz) | 8 Hrs. | 4 Hrs. | 2 Hrs. | 1 Hrs. | 30 min. | 15 min | 7.5 min |
| 1.00 | 0.630 | 0.880 | 1.280 | 1.780 | 2.520 | 3.560 | 5.040 | 6.180 |
| 1.25 | 0.560 | 0.790 | 1.130 | 1.590 | 2.250 | 3.180 | 4.500 | 5.520 |
| 1.60 | 0.500 | 0.700 | 1.000 | 1.410 | 2.000 | 2.820 | 4.000 | 4.900 |
| 2.00 | 0.450 | 0.620 | 0.890 | 1.250 | 1.770 | 2.510 | 3.550 | 4.350 |
| 2.50 | 0.400 | 0.550 | 0.790 | 1.110 | 1.580 | 2.220 | 3.150 | 3.860 |
| 3.15 | 0.355 | 0.490 | 0.700 | 1.050 | 1.400 | 1.980 | 2.800 | 3.430 |
| 4.00 | 0.315 | 0.440 | 0.630 | 0.890 | 1.260 | 1.780 | 2.520 | 3.090 |
| 5.00 | 0.315 | 0.440 | 0.630 | 0.890 | 1.260 | 1.780 | 2.520 | 3.090 |
| 6.30 | 0.315 | 0.440 | 0.630 | 0.890 | 1.260 | 1.780 | 2.520 | 3.090 |
| 8.00 | 0.315 | 0.440 | 0.630 | 0.890 | 1.260 | 1.780 | 2.520 | 3.050 |
| 10.00 | 0.400 | 0.570 | 0.800 | 1.130 | 1.600 | 2.260 | 3.200 | 3.920 |
| 12.50 | 0.500 | 0.710 | 1.000 | 1.410 | 2.000 | 2.830 | 4.000 | 4.900 |
| 16.00 | 0.630 | 0.890 | 1.260 | 1.780 | 2.520 | 3.560 | 5.040 | 6.170 |
| 20.00 | 0.800 | 1.330 | 1.600 | 2.260 | 3.200 | 4.520 | 6.390 | 7.830 |
| 25.00 | 1.000 | 1.410 | 2.000 | 2.830 | 4.000 | 5.650 | 7.990 | 9.790 |
| 31.50 | 1.250 | 1.770 | 2.500 | 3.530 | 5.000 | 7.080 | 9.990 | 12.24 |
| 40.00 | 1.600 | 2.260 | 3.200 | 4.520 | 6.400 | 9.040 | 12.79 | 15.87 |
| 50.00 | 2.000 | 2.830 | 4.000 | 5.650 | 8.000 | 11.31 | 15.99 | 19.59 |
| 63.00 | 2.500 | 3.540 | 5.000 | 7.070 | 10.00 | 14.14 | 19.99 | 24.49 |
| 80.00 | 3.150 | 4.450 | 6.300 | 8.910 | 12.59 | 17.81 | 25.18 | 30.85 |

TABLA N°2: NIVELES ADMISIBLES PARA LAS VIBRACIONES GENERALES EN LA DIRECCIÓN DE LOS EJES "X" y "Y".

| Frecuencia media de la banda terciaria | Aceleración en m/s^2 Tiempo de exposición diaria | | | | | | | |
|---|---|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------------------|
| | (Hz) | 8 Hrs. | 4 Hrs. | 2 Hrs. | 1 Hrs. | 30 min. | 15 min. | 7.5 min < 5 min. |
| 1.00 | 0.224 | 0.317 | 0.448 | 0.630 | 0.900 | 1.270 | 1.790 | 2.190 |
| 1.25 | 0.224 | 0.317 | 0.448 | 0.630 | 0.900 | 1.270 | 1.790 | 2.190 |
| 1.60 | 0.224 | 0.317 | 0.448 | 0.630 | 0.900 | 1.270 | 1.790 | 2.190 |
| 2.00 | 0.224 | 0.317 | 0.448 | 0.630 | 0.900 | 1.270 | 0.790 | 2.190 |
| 2.50 | 0.240 | 0.400 | 0.560 | 0.790 | 1.120 | 1.580 | 2.240 | 2.740 |
| 3.15 | 0.555 | 0.500 | 0.710 | 1.000 | 1.420 | 2.010 | 2.840 | 3.480 |
| 4.00 | 0.450 | 0.640 | 0.900 | 1.270 | 1.800 | 2.540 | 3.600 | 4.410 |
| 5.00 | 0.560 | 0.790 | 1.120 | 1.580 | 2.240 | 3.170 | 4.480 | 5.480 |
| 6.30 | 0.710 | 1.000 | 1.420 | 2.010 | 2.840 | 4.010 | 6.670 | 6.950 |
| 8.00 | 0.900 | 1.270 | 1.800 | 2.540 | 3.600 | 5.090 | 7.190 | 8.810 |
| 10.00 | 1.120 | 1.580 | 2.240 | 3.170 | 4.480 | 6.330 | 8.950 | 10.97 |
| 12.50 | 1.400 | 1.980 | 2.000 | 3.960 | 5.600 | 7.910 | 11.95 | 13.71 |
| 16.00 | 1.800 | 2.540 | 3.600 | 5.090 | 7.200 | 10.17 | 14.39 | 17.62 |
| 20.00 | 2.240 | 3.170 | 4.480 | 6.330 | 8.950 | 12.66 | 17.90 | 21.93 |
| 25.00 | 2.800 | 3.960 | 5.560 | 7.920 | 11.19 | 15.83 | 22.38 | 27.42 |
| 31.50 | 3.550 | 5.020 | 7.100 | 10.04 | 14.19 | 20.07 | 28.37 | 34.76 |
| 40.00 | 4.500 | 6.360 | 9.000 | 12.72 | 17.99 | 25.44 | 35.97 | 44.06 |
| 50.00 | 5.600 | 7.920 | 11.20 | 15.83 | 22.39 | 31.65 | 44.76 | 64.83 |
| 63.00 | 7.100 | 10.04 | 14.20 | 20.07 | 28.38 | 40.13 | 56.75 | 69.52 |
| 80.00 | 9.000 | 12.73 | 17.99 | 25.44 | 35.98 | 50.87 | 71.93 | 88.12 |

Anexo 2.4.4. Certificado de calibración del equipo de medición



**CALILAB - LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIOS
RBC - REDE BRASILEIRA
DE CALIBRAÇÃO.**



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº: RBC5-10437-409

1- CLIENTE/ EQUIPAMENTO

Data da calibração: 30/07/2018
Processo: 18546

Nome: Corporación de Desarrollo Ambiental S.A. (CODESA)
Endereço: Via Ricardo J. Alfaro, Oficina M-23 - Plaza Aventura - Panamá - RP

Equipamento: Medidor de Vibração
Marca: Casella Cel
Modelo: CEL-960

Número de Série: 20152
Identificação: ECQ 0060

Acelerômetro (ACL-1): 01dB
AP2042

Acelerômetro (ACL-2): Casella Cel
CEL-960ACC2

2021 **20101**

2- PADRÕES E INSTRUMENTAÇÃO

| Descrição | Código | Certificado: | Emitente: |
|----------------------|--------|-----------------|-------------------------------|
| Acelerômetro | P172 | DIMCI 1206/2016 | INMETRO |
| Sistema de Aquisição | P182 | RBC 16/0880 | RBC |
| Amplificador | P256 | | Sistema de Aquisição P182 |
| Shaker | P203 | | Gerador (teste dinâmico) P128 |
| Gerador de Ruído | P206 | | Termômetro P161 |
| Conversor Carga/CCP | P183 | | Higrômetro P161 |

3- INFORMAÇÕES DA CALIBRAÇÃO

Procedimento: IT-943: Método de calibração de medidor de vibrações de acordo com a norma ISO 16063-21 - Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 21: Vibration calibration by comparison to a reference transducer. Resposta elétrica de acordo com a ISO 8041 - Human response to vibration - Measuring instrumentation e/ou com a ISO 2954 - Mechanical vibration of rotating and reciprocating machinery - Requirements for instruments for measuring vibration severity, como aplicável.

Características: A resposta em frequência é determinada pela resposta dinâmica por comparação com um acelerômetro padrão. O teste é feito com o acelerômetro acoplado na configuração back-to-back em um excitador dinâmico. A sensibilidade é determinada em um sistema de aquisição (analisador). O teste de linearidade segue o mesmo procedimento. As ponderações em frequência, conforme aplicável, são verificadas através de estímulos elétricos diretos na unidade de medição. Os erros das indicações são exibidos juntamente com os limites de tolerância que a norma estabelece para aquela determinada ponderação. Para esta calibração foi usado um sinal de excitação do tipo: ruído de banda larga e o transdutor colado com cianocrilato na configuração correspondente.

Condições ambientais: Temperatura: 24,3 °C, Umidade Relativa: 61 %. Temperatura média do transdutor 24,0 °C.

Observações gerais: 1- Os resultados apresentados referem-se à média dos valores encontrados.
2- Cada Incerteza Expandida de Medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência $k = 2,00$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
3- O presente certificado de calibração é válido apenas para o Medidor de Vibração / Acelerômetros acima descritos, não sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares.
4- Este certificado de calibração somente pode ser reproduzido completo. Reproduções para fins de divulgação em material publicitário, bem como reproduções parciais, requerem autorização escrita do laboratório emitente. Nenhuma reprodução poderá ser usada de maneira enganosa.
5- Para os testes elétricos o laboratório conta com rastreabilidade formal na faixa de 20 Hz até 10 kHz. Para as baixas frequências são usados sinais elétricos validados no próprio laboratório. A forma de validação foi oportunamente verificada por especialista do Inmetro. Estas informações (relativas à rastreabilidade e ao método disponibilizado para as baixas frequências) foram negociadas com o cliente durante a fase de contratação. O método permite calibrar o equipamento em toda a faixa de interesse do cliente mediante uso de padrão consensado.
6- Cgcre/Inmetro is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement. Cgcre/Inmetro is Signatory of a Bilateral Mutual Agreement with EA. Cgcre/Inmetro is signatory of the IAAC Mutual Recognition Arrangement.

Executante: _____

Página: 1/6

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre/Inmetro que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI).


CALILAB - LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIOS
LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO ACREREDITADO
PELA Cgcre/INMETRO DE ACORDO COM A
ABNT NBR ISO/IEC 17025 SOB O NÚMERO 307.

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº: RBC5-10437-409

4- RESULTADOS DAS MEDIÇÕES

(Teste Elétrico - estímulo de entrada: 870 mV)

| | Frequência Nominal (Hz) | Erro Eixo X (%) | Erro Eixo Y (%) | Erro Eixo Z (%) | Fator Wh (%) | Erro máximo admissível Superior (%) | Erro máximo admissível Inferior (%) | Incerteza (%) |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Ponderação em Frequência Wh | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,25 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,040 | 26 | -100 | 0,4 |
| | 1,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,5 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,158 | 26 | -100 | 0,4 |
| | 3,15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,545 | 26 | -21 | 0,4 |
| | 6,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 10 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,951 | 12 | -11 | 0,4 |
| | 12,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 20 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,782 | 12 | -11 | 0,2 |
| | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 31,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 40 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,411 | 12 | -11 | 0,2 |
| | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 63 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,202 | 12 | -11 | 0,2 |
| | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 125 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,101 | 12 | -11 | 0,2 |
| | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 315 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,050 | 12 | -11 | 0,2 |
| | 400 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 630 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,024 | 12 | -11 | 0,2 |
| | 800 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1250 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 0,009 | 26 | -21 | 0,6 |
| | 1600 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2500 | -52,4 | -51,9 | -52,4 | 0,002 | 26 | -100 | 0,6 |
| | 3150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

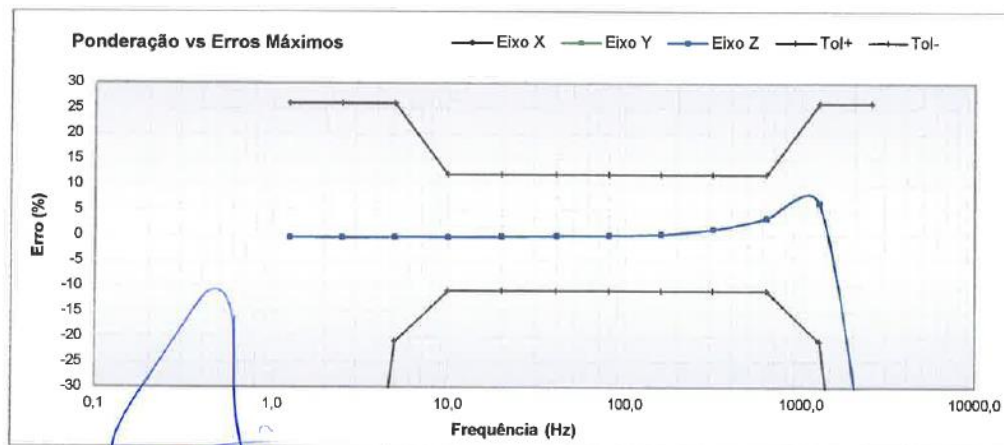

Executante: _____

Página: 2/6



CALILAB - Laboratório de Calibração e Ensaios da Total Safety


CALILAB - LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIOS
LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO
PELA Cgcre/INMETRO DE ACORDO COM A
ABNT NBR ISO/IEC 17025 SOB O NÚMERO 307.

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº: RBC5-10437-409

4- RESULTADOS DAS MEDIÇÕES

(Teste Elétrico - estímulo de entrada: 2000 mV)

| | Frequência Nominal (Hz) | Erro Eixo X - Wd (%) | Erro Eixo Y - Wd (%) | Erro Eixo Z - Wd (%) | Fator Wd (%) | Fator Wk (%) | Erro máximo admissível Superior (%) | Erro máximo admissível Inferior (%) | Incerteza (%) |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Ponderação em Frequência Wd / Wk | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0,125 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0,16 | 3,0 | 3,0 | -11,3 | 0,155 | 0,078 | 26 | -100 | 0,8 |
| | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0,25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0,315 | 1,0 | 1,0 | -10,6 | 0,533 | 0,264 | 26 | -21 | 0,8 |
| | 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 0,63 | -1,2 | -1,2 | -9,3 | 0,944 | 0,459 | 12 | -11 | 0,8 |
| | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1,25 | -0,6 | -0,5 | -5,5 | 1,007 | 0,485 | 12 | -11 | 0,8 |
| | 1,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2,5 | -0,2 | -0,2 | -2,4 | 0,773 | 0,634 | 12 | -11 | 0,8 |
| | 3,15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,408 | 1,039 | 12 | -11 | 0,8 |
| | 6,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,202 | 0,988 | 12 | -11 | 0,4 |
| | 12,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,100 | 0,637 | 12 | -11 | 0,4 |
| | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 31,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 40 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 0,050 | 0,316 | 12 | -11 | 0,6 |
| | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 63 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 80 | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 0,021 | 0,134 | 26 | -21 | 0,6 |
| | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 125 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 160 | 0,4 | 0,5 | 2,2 | 0,005 | 0,029 | 26 | -100 | 0,6 |
| | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 315 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 0,001 | 0,004 | 26 | -100 | 0,6 |
| | 400 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

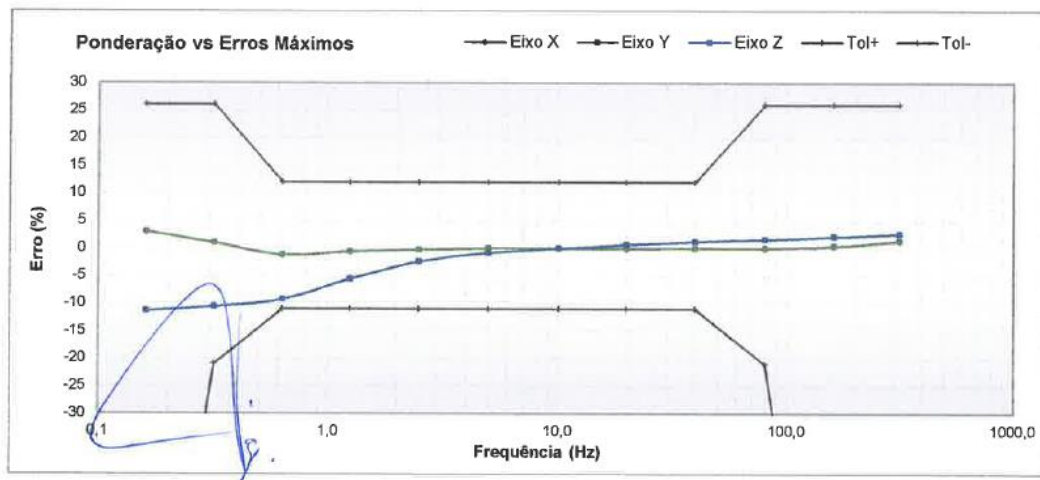

Executante: _____

Página: 3/6



CALILAB - Laboratorio de Calibración
e Ensayos de Total Safety

CALILAB - LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIOS
LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO
PELA Cgcre/INMETRO DE ACORDO COM A
ABNT NBR ISO/IEC 17025 SOB O NÚMERO 307.


CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº: RBC5-10437-409

Resposta em Frequência - (Nível de excitação em 160 Hz: 10 m/s²)

| | Frequência Nominal (Hz) | Eixo X Sensibilidade em [mV/(m/s ²)] | Eixo X Sensibilidade norm. em [%] | Eixo Y Sensibilidade em [mV/(m/s ²)] | Eixo Y Sensibilidade norm. em [%] | Eixo Z Sensibilidade em [mV/(m/s ²)] | Eixo Z Sensibilidade norm. em [%] | Incerteza (%) |
|---------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|--|---|------------------|
| Acelerômetro ACL-1 | 10 | 0,9807 | -4,3 | 1,011 | 0,2 | 0,9871 | -1,1 | 1,9 |
| | 12,5 | 0,9867 | -3,7 | 1,010 | 0,1 | 0,9881 | -1,0 | 1,7 |
| | 16 | 0,9918 | -3,2 | 1,008 | 0,0 | 0,9893 | -0,8 | 1,5 |
| | 20 | 0,9966 | -2,7 | 1,009 | 0,0 | 0,9909 | -0,7 | 1,5 |
| | 25 | 1,001 | -2,3 | 1,010 | 0,1 | 0,9927 | -0,5 | 1,5 |
| | 31,5 | 1,005 | -1,9 | 1,010 | 0,2 | 0,9941 | -0,4 | 1,2 |
| | 40 | 1,010 | -1,4 | 1,010 | 0,2 | 0,9952 | -0,3 | 1,2 |
| | 50 | 1,014 | -1,0 | 1,010 | 0,2 | 0,9962 | -0,1 | 0,8 |
| | 63 | 1,018 | -0,7 | 1,011 | 0,2 | 0,9970 | -0,1 | 0,8 |
| | 80 | 1,020 | -0,4 | 1,010 | 0,2 | 0,9974 | 0,0 | 0,8 |
| | 100 | 1,022 | -0,3 | 1,009 | 0,1 | 0,9980 | 0,0 | 0,8 |
| | 125 | 1,024 | -0,1 | 1,009 | 0,1 | 0,9984 | 0,1 | 0,8 |
| | 160 | 1,025 | 0,0 | 1,008 | 0,0 | 0,9977 | 0,0 | 0,8 |
| | 200 | 1,027 | 0,2 | 1,010 | 0,1 | 0,9993 | 0,2 | 0,8 |
| | 250 | 1,029 | 0,4 | 1,009 | 0,1 | 0,9988 | 0,1 | 0,8 |
| | 315 | 1,030 | 0,6 | 1,009 | 0,0 | 0,9990 | 0,1 | 0,8 |
| | 400 | 1,032 | 0,7 | 1,008 | 0,0 | 0,9992 | 0,1 | 0,8 |
| | 500 | 1,033 | 0,9 | 1,008 | -0,1 | 0,9987 | 0,1 | 0,8 |
| | 630 | 1,035 | 1,0 | 1,007 | -0,2 | 0,9983 | 0,1 | 0,8 |
| | 800 | 1,035 | 1,0 | 1,006 | -0,3 | 0,9981 | 0,0 | 0,8 |
| | 1000 | 1,035 | 1,0 | 1,004 | -0,4 | 0,9976 | 0,0 | 0,8 |
| | 1250 | 1,036 | 1,1 | 1,003 | -0,5 | 0,9975 | 0,0 | 1,2 |
| | 1600 | 1,036 | 1,1 | 1,000 | -0,8 | 0,9972 | 0,0 | 1,2 |
| | 2000 | 1,036 | 1,1 | 0,9972 | -1,1 | 0,9978 | 0,0 | 1,2 |
| | 2500 | 1,034 | 0,9 | 0,9976 | -1,1 | 0,9978 | 0,0 | 1,5 |
| | 3150 | 1,032 | 0,7 | 1,003 | -0,6 | 1,003 | 0,5 | 2,0 |
| | 4000 | 1,027 | 0,2 | 0,9971 | -1,1 | 1,003 | 0,5 | 2,5 |
| | 5000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 6300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 8000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 10000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Resposta em % normalizada em 160 Hz

| | Frequência Nominal (Hz) | Sensibilidade Eixo X | Sensibilidade Eixo Y | Sensibilidade Eixo Z |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| mV/(m/s ²) | 80 | 1,020 | 1,010 | 0,9974 |
| | 160 | 1,025 | 1,008 | 0,9977 |
| mV/g _n | 80 | 10,00 | 9,905 | 9,781 |
| | 160 | 10,05 | 9,885 | 9,784 |

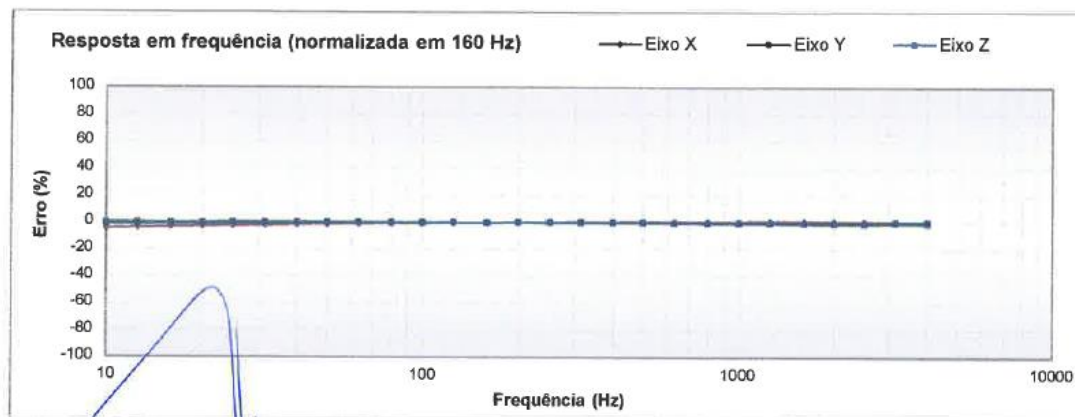

Executante: _____

Página: 4/6

CALILAB - LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIOS
LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO
PELA Cgcre/INMETRO DE ACORDO COM A
ABNT NBR ISO/IEC 17025 SOB O NÚMERO 307.


CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº: RBC5-10437-409

Resposta em Frequência - (Nível de excitação em 160 Hz: 10 m/s²)

| | Frequência Nominal (Hz) | Eixo X Sensibilidade em [mV/(m/s ²)] | Eixo X Sensibilidade norm. em [%] | Eixo Y Sensibilidade em [mV/(m/s ²)] | Eixo Y Sensibilidade norm. em [%] | Eixo Z Sensibilidade em [mV/(m/s ²)] | Eixo Z Sensibilidade norm. em [%] | Incerteza (%) |
|---------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| Acelerômetro ACL-2 | 10 | 11,85 | -0,3 | 11,88 | -0,1 | 11,87 | -0,2 | 1,9 |
| | 12,5 | 11,82 | -0,5 | 11,84 | -0,4 | 11,85 | -0,4 | 1,7 |
| | 16 | 11,78 | -0,8 | 11,80 | -0,7 | 11,82 | -0,7 | 1,5 |
| | 20 | 11,78 | -0,9 | 11,80 | -0,7 | 11,82 | -0,6 | 1,5 |
| | 25 | 11,78 | -0,9 | 11,80 | -0,8 | 11,83 | -0,5 | 1,5 |
| | 31,5 | 11,75 | -1,1 | 11,79 | -0,8 | 11,84 | -0,5 | 1,2 |
| | 40 | 11,80 | -0,7 | 11,85 | -0,3 | 11,84 | -0,5 | 1,2 |
| | 50 | 11,85 | -0,2 | 11,87 | -0,1 | 11,85 | -0,4 | 0,8 |
| | 63 | 11,84 | -0,4 | 11,85 | -0,3 | 11,88 | -0,1 | 0,8 |
| | 80 | 11,85 | -0,3 | 11,87 | -0,1 | 11,84 | -0,4 | 0,8 |
| | 100 | 11,86 | -0,2 | 11,88 | -0,1 | 11,82 | -0,6 | 0,8 |
| | 125 | 11,87 | -0,1 | 11,88 | 0,0 | 11,88 | -0,1 | 0,8 |
| | 160 | 11,88 | 0,0 | 11,89 | 0,0 | 11,89 | 0,0 | 0,8 |
| | 200 | 11,93 | 0,5 | 11,94 | 0,4 | 11,95 | 0,4 | 0,8 |
| | 250 | 12,02 | 1,1 | 12,00 | 1,0 | 12,02 | 1,0 | 0,8 |
| | 315 | 12,16 | 2,3 | 12,13 | 2,1 | 12,13 | 2,0 | 0,8 |
| | 400 | 12,35 | 4,0 | 12,39 | 4,2 | 12,32 | 3,6 | 0,8 |
| | 500 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 630 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 800 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 1000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 1250 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 1600 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 2000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 2500 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 3150 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 4000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 5000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 6300 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 8000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 10000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Resposta em % normalizada em 160 Hz

| | Frequência Nominal (Hz) | Sensibilidade Eixo X | Sensibilidade Eixo Y | Sensibilidade Eixo Z |
|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| mV/(m/s ²) | 80 | 11,85 | 11,87 | 11,84 |
| | 160 | 11,88 | 11,89 | 11,89 |
| mV/gm | 80 | 116,2 | 116,4 | 116,1 |
| | 160 | 116,5 | 116,6 | 116,6 |

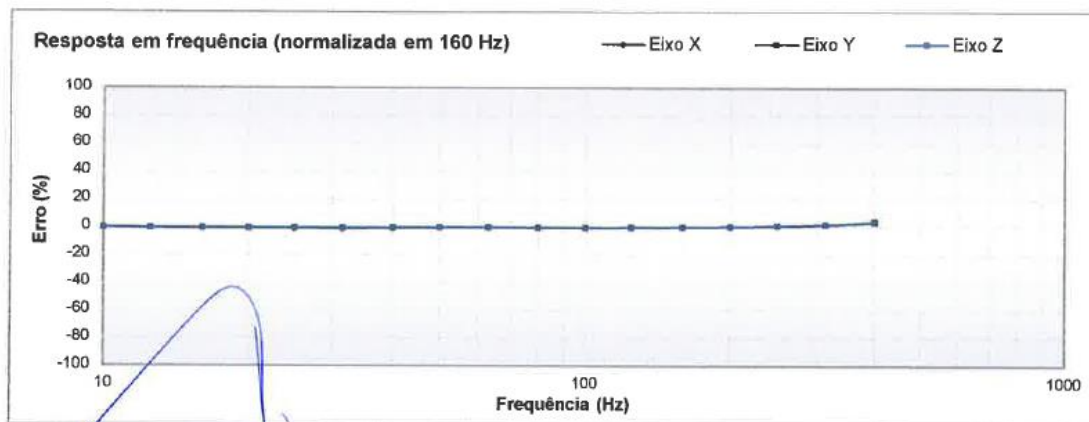

Executante: _____


Página: 5/6

CALILAB - LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIOS
LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO
PELA Cgcre/INMETRO DE ACORDO COM A
ABNT NBR ISO/IEC 17025 SOB O NÚMERO 307.

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº: RBC5-10437-409

Linearidade - Teste dinâmico (Referência: 80 Hz) - Acelerômetro ACL-1 (Eixo Z)

| Aceração de Referência (m/s²) | Aceração Medida (m/s²) | Fundo de Escala | Erro (m/s²) | Erro (%) | Tolerância (± %) | Incerteza (%) |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------|------------------|
| 0,50 | 0,51 | 3000 | 0,01 | 2,0 | ± 1,0 | 4,4 |
| 1,00 | 1,00 | 3000 | 0,00 | 0,0 | ± 1,0 | 2,3 |
| 2,00 | 1,99 | 3000 | -0,01 | -0,5 | ± 1,0 | 1,3 |
| 3,00 | 2,98 | 3000 | -0,02 | -0,7 | ± 1,0 | 1,1 |
| 4,00 | 3,98 | 3000 | -0,02 | -0,5 | ± 1,0 | 0,9 |
| 5,00 | 4,97 | 3000 | -0,03 | -0,6 | ± 1,0 | 0,9 |
| 10,00 | 9,95 | 3000 | -0,05 | -0,5 | ± 1,0 | 0,8 |
| 20,00 | 19,90 | 3000 | -0,10 | -0,5 | ± 1,0 | 0,7 |
| 30,00 | 29,85 | 3000 | -0,15 | -0,5 | ± 1,0 | 0,6 |
| 40,00 | 39,70 | 3000 | -0,30 | -0,7 | ± 1,0 | 0,5 |
| 50,00 | 49,55 | 3000 | -0,45 | -0,9 | ± 1,0 | 0,4 |
| 60,00 | 59,40 | 3000 | -0,60 | -1,0 | ± 1,0 | 0,3 |
| 70,00 | 69,25 | 3000 | -0,75 | -1,1 | ± 1,0 | 0,2 |
| 80,00 | 79,10 | 3000 | -0,90 | -1,1 | ± 1,0 | 0,1 |
| 90,00 | 88,95 | 3000 | -1,05 | -1,2 | ± 1,0 | 0,1 |
| 100,00 | 98,80 | 3000 | -1,20 | -1,2 | ± 1,0 | 0,1 |



Enrique Bondarencó
Signatário Autorizado

Data da emissão: 31/07/2018

Página:6/6

Anexo 2.4.5. Hojas de campo



| HOJA DE CAMPO PARA INSPECCIÓN DE VIBRACIÓN | | | | | | | RE-33 |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Datos generales | | | | | | | |
| Nombre del proyecto | Agro Playa Blanca Fase II | | | | | | |
| Lugar | Rio Hato, Coclé | | | | | Fecha | 15-7-19 |
| Promotor | Agro Playa Blanca S.A | | | | | Persona de Contacto | Jorge Silva |
| Teléfono | | | | | | e-mail | jsilva@marajul.com.pa |
| Características generales | | | | | | | |
| Nombre del trabajador | Coordenadas (NAD27 o WGS 84) | Eje monitoreado | Hora de inicio | Hora de Fin | Duración de la medición | Actividades que realiza el trabajador | Modelo del equipo de medición |
| Emilio Bonilla | 922480N | X | 1:13 p.m. | 2:08 p.m. | 15 minutos | operador de retroexcavadora | Casella |
| | 592389E | Y | 2:10 p.m. | 2:25 p.m. | 15 minutos | | Cel-960 |
| | | Z | 2:25 p.m. | 2:40 p.m. | 15 minutos | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | |
| Serie o ident. del equipo: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Elaborado por | | | Fecha: | | | Hora: | |
| [Firma] | | | 15-7-19 | | | 1:13 p.m. | |



| HOJA DE CAMPO PARA INSPECCIÓN DE VIBRACIÓN | | | | | | | RE-33 |
|---|------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Datos generales | | | | | | | |
| Nombre del proyecto | Agro Playa Blanca Fase II | | | | | | |
| Lugar | Rio Hato, Coclé | | | | Fecha | 18-7-19 | |
| Promotor | Agro Playa Blanca S.A. | | | Persona de Contacto | Jorge Silva | | |
| Teléfono | | | | e-mail | jsilva@maragul.com.pa. | | |
| Características generales | | | | | | | |
| Nombre del trabajador | Coordenadas (NAD27 o WGS 84) | Eje monitoreado | Hora de inicio | Hora de Fin | Duración de la medición | Actividades que realiza el trabajador | Modelo del equipo de medición |
| Ariel Avila | 922316N 592041E | X | 11:09 a.m. | 11:28 a.m. | 15 minutos | Operador de Excavadora Hidráulica | Casella |
| | | Y | 11:38 a.m. | 11:54 a.m. | 15 minutos | | Cel-960 |
| | | Z | 11:58 a.m. | 12:13 p.m. | 15 minutos | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | |
| Serie o ident. del equipo: | | | | | | | |
| Movimiento de tierra, Carga de material a camion Volquete | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Elaborado por: <i>Actividad</i> | | | | Fecha: 18-7-19 | | Hora: 11:09 a. | |



N° 3018139957

| HOJA DE CAMPO PARA INSPECCIÓN DE VIBRACIÓN | | | | | | | RE-33 | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--|--|
| Datos generales | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del proyecto | Agro Playa Blanca Fase II | | | | | | | | | | | |
| Lugar | Rio Hato, Coclé | | | | Fecha | 18-7-19 | | | | | | |
| Promotor | Agro Playa Blanca S.A. | | | Persona de Contacto | Lorge Silva | | | | | | | |
| Teléfono | 391-7200 | | | e-mail | lsilva@maragul.com.pa. | | | | | | | |
| Características generales | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del trabajador | Coordenadas (NAD27 o WGS 84) | Eje monitoreado | Hora de inicio | Hora de Fin | Duración de la medición | Actividades que realiza el trabajador | Modelo del equipo de medición | | | | | |
| Antonio Amador | 922226N 592014E | X | 1:31 p.m. | 1:49 p.m. | 15 minutos | Operador de Tractor de Cadena | Casella C61-900 | | | | | |
| | | Y | 1:51 p.m. | 2:06 p.m. | 15 minutos | | | | | | | |
| | | Z | 2:11 p.m. | 2:27 p.m. | 15 minutos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Observaciones</td> <td>Serie o ident. del equipo:</td> </tr> <tr> <td>* Nivelación de terreno</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> | | | | | | | | Observaciones | Serie o ident. del equipo: | * Nivelación de terreno | | |
| Observaciones | Serie o ident. del equipo: | | | | | | | | | | | |
| | * Nivelación de terreno | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Elaborado por: | Atchison A. Allenman | | | Fecha: | 18-7-19 | | Hora: 1:31 p.m. | | | | | |

ANEXO 3. OTROS ANEXOS

ANEXO 3.1. CAPACITACIONES VARIAS

Inducción ☐

Capacitación ☐

Charla ☒

| | | | |
|-------|-------------------------|------|--|
| Lugar | Proyecto Morina Village | | |
| Fecha | 19/03/19 | Hora | |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Facilitador | Jorge Silva |
| Duración (minutos) | 1 Hora Contratista (BH) |

Temas: Prohibido hacer bromas o Jugar durante las Actividades.
Uso obligatorio del epp (casco, botos, lentes, Guantes)
Uso obligatorio del arnes con su linea de vida.
Prohibido desmontar Barandas de Protección.
Prohibido usar descanso de Escaleras como Urinal.

| No. | Nombre | Cédula | Cargo | Firma |
|-----|------------------|------------|------------|------------------|
| 01 | Edinson Riquelme | 2-725-802 | ayudante | Edinson Riquelme |
| 02 | Roberto Alvarado | 2-716-2727 | ayudante | Roberto Alvarado |
| 03 | Roberto Alvarado | 5-10603 | ayudante | Roberto Alvarado |
| 04 | Isaac Quiroz | 2-743-113 | ayudante | Isaac Quiroz |
| 05 | Orlando Quiroz | 2-145-169 | Carpintero | Orlando Quiroz |
| 06 | Orlando Quiroz | 2-708-1478 | ayudante | Orlando Quiroz |
| 07 | Orlando Quiroz | 2-867-2235 | ayudante | Orlando Quiroz |
| 08 | José Luis Quiroz | 8-527-200 | ayudante | José Luis Quiroz |
| 09 | José Luis Quiroz | 2-711-2026 | ayudante | José Luis Quiroz |
| 10 | Orlando Quiroz | 8-811-1352 | ayudante | Orlando Quiroz |
| 11 | Orlando Quiroz | 2-7261436 | ayudante | Orlando Quiroz |
| 12 | Orlando Quiroz | 8-795682 | ayudante | Orlando Quiroz |
| 13 | Orlando Quiroz | 8-330-1170 | ayudante | Orlando Quiroz |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

OBSERVACIONES:

Se les Indica la Buena Conducta a Practicar durante las Actividades.

Proyectos Mar Azul Seguridad Higiene y Salud Ocupacional Registro de

Inducción ☐

Capacitación ☐

Charla ☒

| | | | |
|-------|--------------------------|------|---------|
| Lugar | Proyecto marina Village. | | |
| Fecha | 03 - JUNIO - 2019 | Hora | 7:00 AM |

| | |
|--------------------|--------------|
| Facilitador | Jorge Silva. |
| Duración (minutos) | 30 minutos. |

Temas:


- ✓ Medidas de Seguridad para Trabajar en altura.
- ✓ Medidas de Control Individuales y Colectivas
- ✓ Higiene Personal
- ✓ Prohibido el uso de Bocinas y audifonos, Silbatos.

| No. | Nombre | Cédula | Cargo | Firma |
|-----|------------------------|------------|-----------|------------------|
| 01 | Eduardo Andres Lorenzo | 2-739-116 | Asistente | Eduardo Lorenzo |
| 02 | Juan Monroy | 4-729-1953 | Asistente | Juan Monroy |
| 03 | Erasmio Gonzalez | 9-707-1202 | Plomero | Erasmio Gonzalez |
| 04 | Arturo Santos | 9-716-2139 | Plomero | Arturo Santos |
| 05 | Roberto Cel | 2-104-1860 | Plomero | Roberto Cel |
| 06 | Jaine Vargas | 8-837-2211 | Plomero | Jaine Vargas |
| 07 | Andres Perez | 8-794-2159 | Plomero | Andres Perez |
| 08 | Abelardo Morales | 2-722-26 | Plomero | Abelardo Morales |
| 09 | Kamir Murillo | 2-736-837 | Asistente | Kamir Murillo |
| 10 | Kelvin Murillo | 2-746-1507 | Asistente | Kelvin Murillo |
| 11 | Andres Espinoza | 2-700-1530 | Asistente | Andres Espinoza |
| 12 | Abdul Espinoza | 8-726-1722 | Plomero | Abdul Espinoza |
| 13 | Abdul Espinoza | 2-730-726 | Asistente | Abdul Espinoza |
| 14 | Amulley Espinoza | 2-707-843 | Asistente | Amulley Espinoza |
| 15 | Elvis Gomez | 8-941-39 | Asistente | Elvis Gomez |
| 16 | Samuel Tellez | 4-173-533 | Asistente | Samuel Tellez |
| 17 | Eduardo Lorenzo | 2-130-155 | Asistente | Eduardo Lorenzo |
| 18 | Rafael Perez | 8-274-176 | Plomero | Rafael Perez |
| 19 | Andres Mejia | 7-103-16 | Encargado | Andres Mejia |
| 20 | Giovany Cordillo | E-8-127435 | Capataz | Giovany Cordillo |
| | Dany Cel | 2-729-1908 | Asistente | Dany Cel |

OBSERVACIONES:

Se realiza charla de Seguridad a Colaboradores de Prody.

4. Evidencias fotográficas de charlas

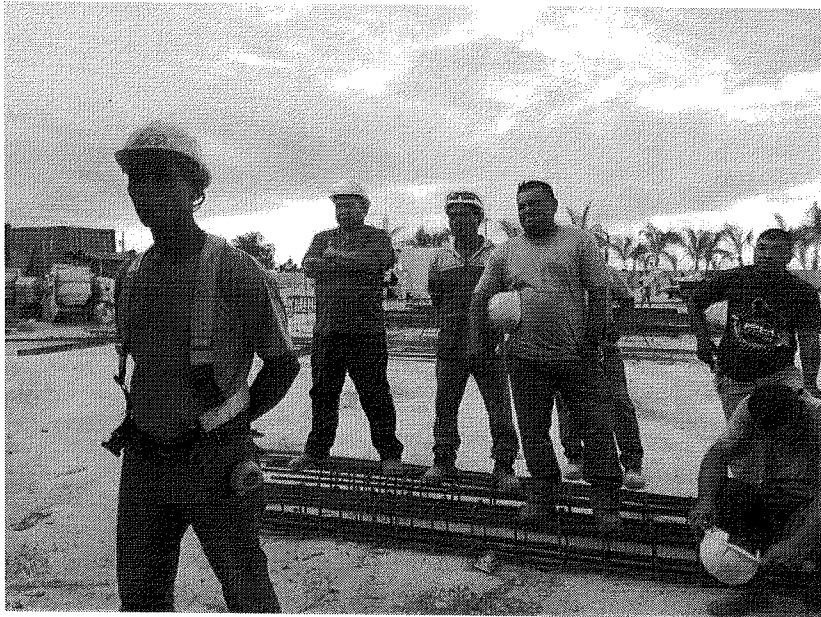

Proyectos Mar Azul
Seguridad Higiene y Salud Ocupacional
Registro de

Inducción ☒

Capacitación ☐

Charla ☐

| | | | |
|-------|-------------------------|------|--|
| Lugar | Proyecto marina Village | | |
| Fecha | 30-07-2019 | Hora | |

| | |
|--------------------|-------------|
| Facilitador | Jorge Silva |
| Duración (minutos) | 1 hora. |

Temas: Prohibir el depósito de desecho de residuos sólidos
Comunicación inicial de medidas de Seguridad
uso obligatorio del Epp.
Higiene (limpieza)
Ambiente.

| No. | Nombre | Cédula | Cargo | Firma |
|-----|---------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| 01 | JANETH GUEVARA | N-20-2145 | Arquitecta. | |
| 02 | Araceli Acosta | 9-159-190 | albañil | |
| 03 | Edwin Domínguez | 2-159-124 | albañil | E. Domínguez |
| 04 | José Luis Acosta | 2-17-2360 | albañil | |
| 05 | José O. Motero | 2-714-1196 | Albañil | |
| 06 | Eduardo Navarro | 9-194-110 | Albañil | Eduardo Navarro |
| 07 | ARAMIS DELGADO | 8-794-326 | Ayudante | |
| 08 | Luis A. Cruz | 2-722-191 | albañil | |
| 09 | JORGE LUIS GONZALEZ | 2-155-708 | Ayudante | |
| 10 | Luis A. González | 2-740-1834 | Ayudante/Plomero | |
| 11 | Mojica García | 2-122-937 | Albañil | |
| 12 | Vol. Parra | 8-931-1612 | Albañil | |
| 13 | Rodrigo Ruiz | 2-701-1538 | Ayudante | |
| 14 | Roy Gil | 2-710-1675 | plomero | |
| 15 | Braaym Bennera | 8-960-761 | colaborador de seguridad | Braaym Bennera |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

OBSERVACIONES: Se realiza inducción de Seguridad a Colaboradores del Contratista BH que ingresarán a laborar.

| | | | |
|---|--------------|-----------------------------|--------------|
| Trabajo / Proceso: S.C.I. | | N° ART: | |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA REQUERIDA PARA ESTA ACTIVIDAD: | | Fecha: 29/07/2019 | |
| Casco, Bota de seguridad, Guantes, Gafas de seguridad, arnés de seguridad, Protección auditiva, Mascarillas | | | |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA ESTA ACTIVIDAD: | | | |
| Esmeril, Martillo, Máquina Ranuradora, Máquina Roscadora | | | |
| PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD: | | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA |
| Freddy Gordillo | | Bartolo Santos | |
| Eduardo Lorenzo | | Davy Gil | |
| Abdiel Espinoza | | Edwin Morales | |
| Andrés Espinoza | | Andrés Padilla | |
| Amikar Espinoza | | Jaime Vargas | |
| Roberti Gil | | Andrés Pérez | |
| Ismael Tejeira | | Eduardo Andrés Lorenzo | |
| Juan Monfroy | | Pedro Pérez | |
| Elio Gómez | | Franklin Espinosa | |
| Gabriel Espinosa | | Kamir Murillo | |

SEGURIDAD INDUSTRIAL

ENCARGADO PRODY PANAMA, S.A.

NOMBRE: Ing. Jorge Silva


FIRMA


NOMBRE: Ing. Joshua Páez

FIRMA

Evidencia de la lista de charla de capacitación: RUIDO LABORAL

(FOTO 1)





Acta de Capacitación


| | | | |
|---|---------|---------------------------|-----------|
| CODIGO/ECU/CAPASO | Versión | Fecha de emisión | Lugar |
| 001 | 002 | 8/7/19 | Bo. Verde |
| Tiempo de capacitación: <input type="checkbox"/> 8 min. Diaria <input checked="" type="checkbox"/> 30 min. Semanal <input type="checkbox"/> 1 hora. Trimestral | | | |
| Proyecto: <u>Química Industrial</u> | | Código: <u>8-110-3324</u> | |
| Capacitador: <u>Valeria Vazquez</u> | | | |
| Objetivo: <u>Ruido Laboral</u> | | | |
| Temas tratados: <u>-> Que es el ruido</u> | | | |
| Conclusiones: <u>-> Diferencia entre el ruido y sonido</u> | | | |
| Observaciones: <u>-> Consecuencias del ruido</u> | | | |
| <u>-> Mediciones de ruido y su importancia</u> | | | |
| <u>-> Trs para reducir el ruido</u> | | | |

| NOMBRE Y APELLIDO | CURSO | N° CROQUIS | FIRMA |
|----------------------|------------------|------------|-------|
| 11 Edgar Toribio | Operador Control | 9-718-1299 | |
| 14 Doriam Camacho | Capataz | 8-510-710 | |
| 15 Franco Sotomayor | Almohada | 8-864-85 | |
| 16 Amilcar Sotomayor | Almohada | 2-700-171 | |
| 17 Omar Sotomayor | Capataz | 4-700-074 | |
| 18 Amilcar Sotomayor | M | 2-408-687 | |
| 19 Marco Camacho | Subero | 8-206-1097 | |
| 20 Kati Keyser | CREV | 8-7244 | |
| 21 Juan Carlos | Almohada | 4-733-182 | |
| 22 Verónica Martínez | Almohada | 2-700-156 | |
| 23 Juan B | AVT | 2-700-200 | |
| 24 Carlos Martínez | Patronato | 2-116-100 | |
| Alfonso Yáñez | Almohada | 2-210-1167 | |
| Paulo Yáñez | Almohada | 2-104-191 | |
| Paulo Yáñez | Almohada | 9-216-385 | |

Evidencia de la lista de charla de capacitación: RUIDO LABORAL

(FOTO 2)

✓



Acta de Capacitación

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| CARGO/EQUIVALENCIA | Versión | Fecha de emisión | Lugar |
| 001 | 002 | 8/7/19 | Rio Hato |
| Tiempo de capacitación: | 5 min Diarios <input checked="" type="checkbox"/> 30 min, Semanales <input type="checkbox"/> 1 hora, Inicio mes <input type="checkbox"/> | | |
| Proyecto: | Buenos Ventos | | |
| Capacitador: | Melissa Herrera | | |
| | | Código: | B-710-2526 |
| Objetivo: | Ruido Laboral | | |
| Temas tratados: | Que es el ruido | | |
| Conclusiones: | Diferencia entre el ruido y el ruido excesivo del ruido | | |
| Observaciones: | - Diferencia del ruido - 25% para reducir el ruido - Prohibir el encendido de máquinas | | |

| NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | Nº CÉDULA | FIRMA |
|-----------------------|------------|-------------|--------------------|
| 13 Agustín M. Delgado | Plumero | 8-812-1801 | Agustín M. Delgado |
| 14 Juan Chantall | Ayudante | 2-951-160 | Juan Chantall |
| 15 Ariel Cedeno | Albañil | 7-99-3132 | Ariel Cedeno |
| 16 Ramon | Albañil | 2-28222 | Ramon |
| 17 Luis Trujillo | Ayudante | 2-705-181 | Luis Trujillo |
| 18 Alberto Martinez | CHOFERADOR | 9-198-111 | Alberto Martinez |
| 19 Roberto | | 2-57-292 | Roberto |
| 20 Raul Rivas | Ayudante | 8-961-329 | Raul Rivas |
| 21 Luis Barrera | Ayudante | 8-832-1449 | Luis Barrera |
| 22 Melvin Castro | OP | 8-751-382 | Melvin Castro |
| 23 Jesus Carrero | O.D | 8-28222 | Jesus Carrero |
| 24 Jesus Carrero | Albañil | 8-8-7-28222 | Jesus Carrero |
| Agustín M. Delgado | OP | 7-113-784 | Agustín M. Delgado |
| Kenneth L. Llanos | Albañil | 6-2822234 | Kenneth L. Llanos |
| Monica Morales | OP | 8-767-587 | Monica Morales |
| Eduardo Oro | Ayudante | 9750-965 | Eduardo Oro |
| Luis Capa | Capitán | 7-90312 | Luis Capa |
| Harold Smith | Ayudante | 8-282-415 | Harold Smith |

Forma E.O.D. Importadora

Lunes 27 Mayo

LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL PROYECTO VELARAZ

| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | VALOR | VALOR |
|------------------------|------------|------------------------|-------|-------|
| ANGEL L. JARAMILLO | 2-705-1099 | Angel L. Jaramillo | 1.600 | 3.200 |
| ALBERTO L. BETHANCOURT | 2-718-1182 | Alberto L. Bethancourt | 1.600 | 3.200 |
| ALEXA R. REYES | 2-728-1254 | Alexa R. Reyes | 1.600 | 3.200 |
| ALFONSO LOPEZ | 2-724-1427 | Alfonso Lopez | 1.600 | 3.200 |
| ANGEL A. BETHANCOURT | 2-725-1055 | Angel A. Bethancourt | 1.600 | 3.200 |
| ANTONIO ALVEDO | 2-705-1093 | Antonio Alvedo | 1.600 | 3.200 |
| ARIEL CARRERA | 2-721-1282 | Ariel Carrera | 1.600 | 3.200 |
| ARIBEL ARAUZ | 2-717-200 | Aribel Arauz | 1.600 | 3.200 |
| CARMEN GALLARDO | 2-67-907 | Carmen Gallardo | 1.600 | 3.200 |
| CEGAR CASTANEDA | 2-21-802 | Cegar Castaneda | 1.600 | 3.200 |
| DANIEL ESPINOSA | 2-150-948 | Daniel Espinosa | 1.600 | 3.200 |
| ELMER BRASSFIELD | 2-118-637 | Elmer Brassfield | 1.600 | 3.200 |
| ENRIQUE PERALTA | 2-755-1378 | Enrique Peralta | 1.600 | 3.200 |
| ERIS GUERRERO | 2-743-1096 | Eris Guerrero | 1.600 | 3.200 |
| FELIPE DIAZ | 2-733-287 | Felipe Diaz | 1.600 | 3.200 |
| GILBERTO VALDES | 2-137-147 | Gilberto Valdes | 1.600 | 3.200 |
| IRENE MENDOZA | 2-703-1080 | Irene Mendoza | 1.600 | 3.200 |
| JAIRO RODRIGUEZ | 2-727-1428 | Jairo Rodriguez | 1.600 | 3.200 |
| JOEL SANTANA | 2-710-2208 | Joel Santana | 1.600 | 3.200 |
| JORGE A. GUERRERO | 2-717-239 | Jorge A. Guerrero | 1.600 | 3.200 |
| JORGE L. GONZALEZ F | 2-165-708 | Jorge L. Gonzalez F | 1.600 | 3.200 |
| JOSE A. GONZALEZ | 2-705-2047 | Jose A. Gonzalez | 1.600 | 3.200 |
| JOSE G. SOTO | 2-169-174 | Jose G. Soto | 1.600 | 3.200 |
| KEVIN DE LA CRUZ | 2-752-2270 | Kevin De La Cruz | 1.600 | 3.200 |
| LUIS N. BERMUDEZ | 2-710-2161 | Luis N. Bermudez | 1.600 | 3.200 |
| MARCELINO GARCES H | 2-723-760 | Marcelino Garces H | 1.600 | 3.200 |
| MARCELO GARCES H | 2-734-494 | Marcelo Garces H | 1.600 | 3.200 |
| MARCELO GARCES H | 2-100-253 | Marcelo Garces H | 1.600 | 3.200 |

Lunes 27 Mayo

| | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|-------|-------|
| NICOLAS GARCES | 2-109-781 | Nicolas Garces | 1.600 | 3.200 |
| NICOLAS GONZALEZ | 2-285-640 | Nicolas Gonzalez | 1.600 | 3.200 |
| OSCAR GARCIA | 2-727-2080 | Oscar Garcia | 1.600 | 3.200 |
| PEDRO RANGEL R. | 2-101-2040 | Pedro Rangel R. | 1.600 | 3.200 |
| PEDRO RANGEL T. TRUJILLO | 2-721-728 | Pedro Rangel T. Trujillo | 1.600 | 3.200 |
| RICARDO HERRERA | 2-8-99819 | Ricardo Herrera | 1.600 | 3.200 |
| RICARDO PEREZ VASQUES | 2-706-552 | Ricardo Perez Vasques | 1.600 | 3.200 |
| RICHARD A. FERNANDEZ | 2-725-1649 | Richard A. Fernandez | 1.600 | 3.200 |
| RIGOBERTO AGUILAR | 2-126-515 | Rigoberto Aguilar | 1.600 | 3.200 |
| RIGOBERTO LOPEZ | 2-714-159 | Rigoberto Lopez | 1.600 | 3.200 |
| RUBEN HERRERA | 2-708-987 | Ruben Herrera | 1.600 | 3.200 |
| SAMUEL A. SAMANIEGO | 2-112-752 | Samuel A. Samaniego | 1.600 | 3.200 |
| ULICES DELGADO | 2-701-749 | Ulices Delgado | 1.600 | 3.200 |
| VICTOR JARAMILLO | 2-157-51 | Victor Jaramillo | 1.600 | 3.200 |

ANEXO 3.2. RECOLECCIÓN DE DESECHOS DOMÉSTICOS



FACTURA POR DISPOSICIÓN DE Desechos

No. 808521

1,257,129

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

Fecha y Hora:

13-mar-2019 12:27 PM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador:

KEVIN TOVAR

Tipo de Desecho:

RESIDUOS INDUSTRIALES Y RES

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado



Facebook:/AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panamá



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE Desechos

No. 810706

1,259,307

☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

Fecha y Hora:

18-mar-2019 09:03 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador:

KEVIN TOVAR

Tipo de Desecho:

RESIDUOS INDUSTRIALES Y RE

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado



Facebook:/AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panamá



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°



FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHO

No. 811514

1,260,115

AUTORIDAD DE ASEO

R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

☐ CONTADO☒ CRÉDITO

Fecha y Hora:

19-mar-2019 02:07 PM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°:

00

Operador:

KEVIN TOVAR

Tipo de Desecho:

RESIDUOS INDUSTRIALES Y REC

Facturado a:

INGENIERIA LARA-



Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.:

699715

No. de Placa:

699715

Peso Vacío:

4.45

Peso Lleno:

16.52

Peso Neto:

2.07

Monto:

B/30.02



Facebook://AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°



AUTORIDAD DE ASEO

R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 812459

1,261,062

☐ CONTADO☒ CRÉDITO

Fecha y Hora:

21-mar-2019 09:22 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°:

00

Operador:


KEVIN TOVAR

Tipo de Desecho:

RESIDUOS INDUSTRIALES Y RE

Facturado a:

INGENIERIA LARA-



Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.:

699715

No. de Placa:

699715

Peso Vacío:

4.45

Peso Lleno:

5.43

Peso Neto:

0.98

Monto:

B/14.21



Facebook://AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°



FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 814320
1,263,332

AUTORIDAD DE ASEO

R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

☐ CONTADO☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 25-mar-2019 07:33 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS INDUSTRIALES Y RECICLABLES

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 699715

No. de Placa: 699715

Peso Vacío: 4.45

Peso Lleno: 9.55

Peso Neto: 5.10

Monto: B/73.95



Facebook:/AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°



FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 817173
1,265,737

AUTORIDAD DE ASEO

R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

☐ CONTADO☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 30-mar-2019 08:14 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador: KAILYN MOSQUERA

Tipo de Desecho: RESIDUOS INDUSTRIALES Y RECICLABLES

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 699715

No. de Placa: 699715

Peso Vacío: 4.45

Peso Lleno: 8.45

Peso Neto: 4.00

Monto: B/58.00



Facebook:/AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°



FACTURA POR DISPOSICIÓN DE Desechos

No. 820221

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

Fecha y Hora:

18-abr-2019 12:12 PM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador:

JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho:

RESIDUOS INDUSTRIALES Y DE

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.:

699715

No. de Placa:

699715

Peso Vacío:

4.45

Peso Lleno:

5.66

Peso Neto:

1.21

Monto:

B/22.05



Facebook:/AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°

P2401



FACTURA POR DISPOSICIÓN DE Desechos

No. 824518

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

Fecha y Hora:

19-abr-2019 12:20 PM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador:

KEVIN TOVAR

Tipo de Desecho:

RESIDUOS INDUSTRIALES Y DE

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.:

699715

No. de Placa:

699715

Peso Vacío:

4.45

Peso Lleno:

5.91

Peso Neto:

1.46

Monto:

B/21.17



Facebook:/AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°

P2401



AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE Desechos

No. 825223

☐ CONTADO

☒ CRÉDITO

Fecha y Hora: 25-abr-2019 21:00 PM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador: KATHY MOSQUERA

Tipo de Desecho: RESIDUOS INDUSTRIALES Y DOMICILIARIOS

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 699715

No. de Placa: 699715

Peso Vacío: 4.45

Peso Lleno: 6.09

Peso Neto: 1.64

Monto: B/23.78



Facebook:/AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°



AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE Desechos

No. 829446

1,277,999

☐ CONTADO

☒ CRÉDITO

Fecha y Hora: 25-abr-2019 11:21 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS INDUSTRIALES Y DOMICILIARIOS

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 699715

No. de Placa: 699715

Peso Vacío: 4.45

Peso Lleno: 6.09

Peso Neto: 1.64

Monto: B/23.78



Facebook:/AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



YouTube Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°



AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE Desechos

No. 827874

☐ CONTADO

☒ CRÉDITO

Fecha y Hora:

23-abr-2019 11:18 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°:

Operador:

Tipo de Desecho:

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.:

No. de Placa:

Peso Vacío:

Peso Lleno:

Peso Neto:

Monto:



Facebook://AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N° P2401

2 Ayudantes — 4 1/2 HR



AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE Desechos

No. 828365

1,276,91

☐ CONTADO

X

☒ CRÉDITO

Fecha y Hora:

23-abr-2019 11:45 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°:

00

Operador:

JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho:

RESIDUOS INDUSTRIALES

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.:

No. de Placa:

Peso Vacío:

Peso Lleno:

Peso Neto:

Monto:

B/80.48



Facebook://AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N° P2401

2 Ayudantes — 3 HRS



FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 83012983

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57☐ CONTADO☐ CRÉDITO

Fecha y Hora:

✓ 26-abr-2019 03:34 PM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS INDUSTRIALES Y REC

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd. Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 699715

No. de Placa: 699715

Peso Vacío: 4.45

Peso Lleno: 8.00

Peso Neto: 3.55

Monto: B/51.48 ✓



Facebook://AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panamá



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 830614

1,279,10

☐ CONTADO☒ CRÉDITO

Fecha y Hora:

✓ 27-abr-2019 02:17 PM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS INDUSTRIALES

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd. Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.:

No. de Placa: 699715

Peso Vacío: 699715

Peso Lleno: 4.45

Peso Neto: 10.15

Peso Neto: 5.70

Monto: B/82.65 ✓



Facebook://AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panamá



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°



AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE PASECHOS

No. 832629
1,281,178

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

Fecha y Hora:

02-may-2019 01:29 PM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°:

00

Operador:

JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho:

RESIDUOS INDUSTRIALES Y RECI

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado



Facebook:/AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

R.U.C. No.:

699715

No. de Placa:

699715

Peso Vacío:

4.45

Peso Lleno:

8.76

Peso Neto:

4.31

Monto:

B/62.50

N°



AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE PASECHOS

No. 837622
1,286,164

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

Fecha y Hora:

13-may-2019 11:49 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°:

00

Operador:

JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho:

RESIDUOS INDUSTRIALES Y RECICL

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado



Facebook:/AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

R.U.C. No.:

699715

No. de Placa:

699715

Peso Vacío:

4.45

Peso Lleno:

5.78

Peso Neto:

1.33

Monto:

B/19.29

N°



FACTURA POR DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

No. 838886

1,287,429

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57☐ CONTADO☒ CRÉDITO

Fecha y Hora:

15-may-2019 03:12 PM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS INDUSTRIALES Y REC

Facturado a: INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Firma:

Nombre del Funcionario en Pesas

Oswaldo Foster

Fecha y Firma de Revisado

2377

RECIBIDO

AAUD



Facebook://AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panamá



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°

R.U.C. No.: 699715

No. de Placa: 699715

Peso Vacío: 4.45

Peso Lleno: 8.23

Peso Neto: 3.78

Monto: B/54.81

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

No. 839396

1,287,9

☐ CONTADO

X

☒ CRÉDITO

Fecha y Hora:

16-may-2019 02:32 PM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS INDUSTRIALES

Facturado a: INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Firma:

Nombre del Funcionario en Pesas

Oswaldo Foster

Fecha y Firma de Revisado

2377

RECIBIDO

AAUD



Facebook://AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panamá



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°

R.U.C. No.: 699715

No. de Placa: 699715

Peso Vacío: 4.45

Peso Lleno: 9.33

Peso Neto: 4.88

Monto: B/70.76



FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 839913

1,288,4

AUTORIDAD DE ASEO

R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

Fecha y Hora: 17-may-2019 03:33 PM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS INDUSTRIALES

Facturado a: INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 699715

No. de Placa: 699715

Peso Vacío: 4.45

Peso Lleno: 8.87

Peso Neto: 4.42

Monto: B/64.09



Facebook:/AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°



AUTORIDAD DE ASEO

R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 842191

1,290,736

☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

Fecha y Hora: 22-may-2019 04:19 PM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS INDUSTRIALES Y RECICL

Facturado a: INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 699715

No. de Placa: 699715

Peso Vacío: 4.45

Peso Lleno: 7.78

Peso Neto: 3.33

Monto: B/48.29



Facebook:/AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°



FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 842527

1,291,074

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57☐ CONTADO☐ CRÉDITO

Fecha y Hora: 23-may-2019 10:48 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS INDUSTRIALES Y RECICL

Facturado a: INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 699715

No. de Placa: 699715

Peso Vacío: 4.45

Peso Lleno: 7.25

Peso Neto: 2.80

Monto: B/40.60



Facebook:/AAUD panamá




Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 846601

1,295,151

☐ CONTADO X☒ CRÉDITO

Fecha y Hora: 31-may-2019 03:00 PM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador: JOHNNY MENDOZA

Tipo de Desecho: RESIDUOS INDUSTRIALES Y P

Facturado a: INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.: 699715

No. de Placa: 699715

Peso Vacío: 4.45

Peso Lleno: 6.72

Peso Neto: 2.27

Monto: B/32.92



Facebook:/AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°



AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE PASECHOS

No. 851803

1,300,309

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

Fecha y Hora:

11-jun-2019 12:24 PM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador:

KAILYN MOSQUERA

Tipo de Desecho:

RESIDUOS INDUSTRIALES Y REC

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.:

699715

No. de Placa:

699715

Peso Vacío:

4.45

Peso Lleno:

6.76

Peso Neto:

2.31

Monto:

B/33.50



Facebook:AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°



AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

FACTURA POR DISPOSICIÓN DE PASECHOS

No. 854621

1,303,10

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

Fecha y Hora:

17-jun-2019 07:42 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°: 00

Operador:

REYNALDO RODRIGUEZ

Tipo de Desecho:

RESIDUOS INDUSTRIALES

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.:

699715

No. de Placa:

699715

Peso Vacío:

4.45

Peso Lleno:

6.00

Peso Neto:

1.55

Monto:

B/23.64



Facebook:AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°



FACTURA POR DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 858085

AUTORIDAD DE ASEO

R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

☐ CONTADO☐ CRÉDITO

Fecha y Hora:

24-11-2019 07:10 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°:

Operador:

Tipo de Desecho:

RESIDUOS INDUSTRIALES Y RECI

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

R.U.C. No.:

No. de Placa:

Peso Vacío:

Peso Lleno:

Peso Neto:

Monto:

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado



Facebook://AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°



FACTURA PC DISPOSICIÓN DE DESECHOS

No. 85996

AUTORIDAD DE ASEO

R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57

☐ CONTADO☐ CRÉDITO

Fecha y Hora:

27-10-2019 11:17 AM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°:

Operador:

Tipo de Desecho:

JOHINNY MENDOZA

RESIDUOS INDUSTRIALES Y RECI

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

R.U.C. No.:

No. de Placa:

Peso Vacío:

Peso Lleno:

Peso Neto:

Monto:

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado



Facebook://AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panama



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°



FACTURA POR DISPOSICIÓN DE Desechos

No. 863867

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57☐ CONTADO☐ CRÉDITO

Fecha y Hora:

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°:

Operador:

Tipo de Desecho:

Facturado a:

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.:

No. de Placa:

Peso Vacio:

Peso Lleno:

Peso Neto:

Monto:



Facebook://AAUD panamá




Twitter:@AAUD_Panamá



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°



FACTURA POR DISPOSICIÓN DE Desechos

No. 868018

1,316,512

AUTORIDAD DE ASEO
R.U.C. 8-NT-2-17099 D.V. 57☐ CONTADO X☐ CRÉDITO

Fecha y Hora:

13-jul-2019 01:29 PM

Sitio de Disposición:

Permiso de Operación N°:

00

Operador:

REYNALDO RODRIGUEZ

Tipo de Desecho:

RESIDUOS INDUSTRIALES Y RE

Facturado a:

INGENIERIA LARA-

Nombre/céd./Firma del Conductor

Nombre del Funcionario en Pesas

Fecha y Firma de Revisado

R.U.C. No.:

699715

No. de Placa:

699715

Peso Vacio:

4.45

Peso Lleno:

6.94

Peso Neto:

2.49

Monto:

B/36.11



Facebook://AAUD panamá



Twitter:@AAUD_Panamá



Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Tels.: 506-1500 / 506-1501
Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD

N°


No todo se vir

16. Implementación de reciclaje

El campamento cuenta con tanques de reciclaje para materiales de cartón, metales, plástico, vidrio y desechos orgánicos y su contenido es retirado en bolsas separados como contribución al medio ambiente



Evidencia de clasificación y retiro de la basura del proyecto

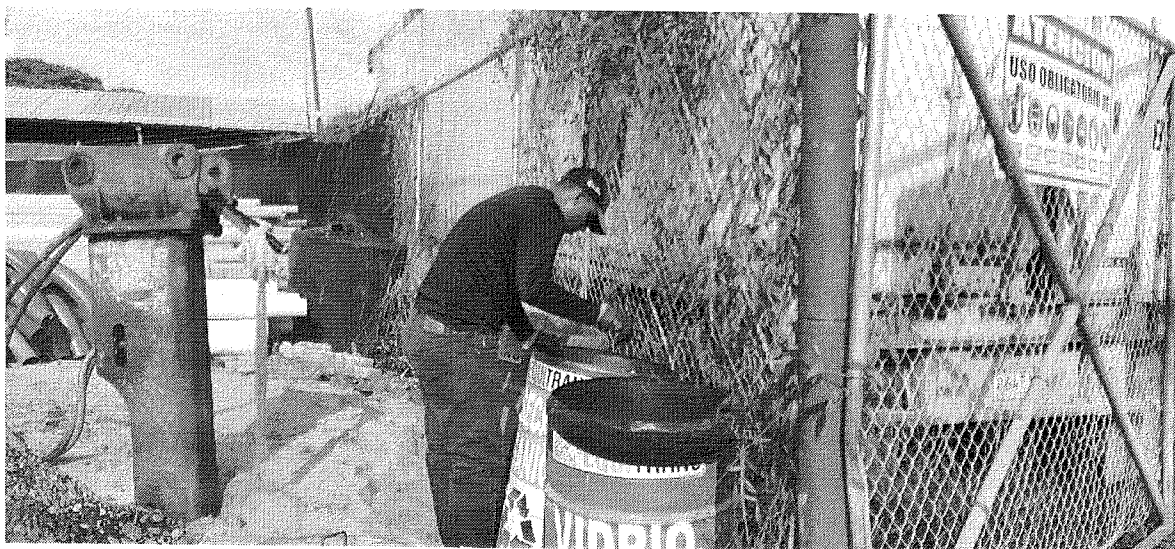



1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

9916223826989

051

J

Nombre:

Jose Alvaroz

Marbella, Edificio Royal Center,

Torre A, Piso 7, Panamá, Rep. de Panamá

Tels.: (507) 203-7102 • 203-7103

Celular: (507) 6415-6521



**PRODY
PANAMA S.A.**
PROYECTOS Y DISEÑOS

R.U.C. 2027396-1-744319 D.V. 17

RECIBO Nº 2866

Hemos recibido de:

13 mayo
Prody Panama S.A.

de 20 19

La suma de:

veinte con 00/100

B/. 20.00

En concepto de:

Producción basura



Efectivo B/.



Cheque No.


Banco

R.U.C. 8-488-147 D.V. 36 • TEL.: 6662-0474 • 6663-2474 • No. 2,801 - 3,100 • MAYO / 2019

J. Alvaroz

Firma

8-953-908



**PRODY
PANAMA S.A.**
PROYECTOS Y DISEÑOS

R.U.C. 2027396-1-744319 D.V. 17

Nombre:

Jose Alvaroz

Marbella, Edificio Royal Center,

Torre A, Piso 7, Panamá, Rep. de Panamá

Tels.: (507) 203-7102 • 203-7103

Celular: (507) 6415-6521

RECIBO Nº 2869

Hemos recibido de:

21 de mayo
Prody Panama S.A.

de 20 19

La suma de:

veinte con 00/100

B/. 20.00

En concepto de:

Producción de Basura



Efectivo B/.



Cheque No.

Banco

R.U.C. 8-488-147 D.V. 36 • TEL.: 6662-0474 • 6663-2474 • No. 2,801 - 3,100 • MAYO / 2019

J. Alvaroz

Firma

8-953-908

ANEXO 3.3. MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS



RUC. 244361-1-402185 D.V. 03
 Direcció: Panamá / Juan Díaz - Guayabito #2
 Teléfono: 394-7011 / 394-7012
 Fax: 220-02146

EQUIPO # 44

| INFORME | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Marca: Caterpillar | Tipo: Tractor | Modelo: D6K XL | Motor: C6E45957 | Año: 2013 | |
| serie FBH021757 | Long de Cuchilla: 16.3/4980mm | An. Trac. 7.6/2330mm | Alt. Superior/Cab. 9.7/2958mm | Long. Cad/ Trac. a suelo 8.7/2645mm | |
| Potencia: 125 hp/93kw | P. Desplazamiento: 2100rpm | N. Cilindros Oper. 6 | Desgarrador: 3 Dientes | Max. Vel. Hacia Adelante: 6.2mhp | |
| Max Vel. Hacia Atrás: 6.2 mhp | Pres. 5/el Suelo del Tren de Rod.: 6.2 | Cap. De Hoja: 3.5yd3/2.7m3 | Prof. De Corte: 18.6/473mm | | |
| MANTENIMIENTO | | | | | |
| Estado del Equipo: Activo | Fecha: 05-06-19 | MANT. ACT. 7842 | PROX. MANT. 8142 | Cambio: c/300 h | |
| ATF Motor 265 litros | ATF Caja: 757 litros | ATF Diferencial 379 litros | Dep. de Combustible: 4164 litros | Engrase: 11.20 l/m | |
| F. Aire 2 | F. Combustible F. Aceite 1 | Llantas delanteras 0 | Llantas Traseras 0 | Líquido Refrigerante: 7.57 litros | |
| Cambio de Pieza: | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| SEGURO DEL EQUIPO | | | | | |
| Póliza #: General | Vigencia de Póliza 15 DE JUNIO 2019 | | Vencimiento de Póliza: 15 DE JUNIO 2020 | | |
| Límite de Responsabilidad: B/. 22,970.00 | Teléfonos de la comp. de Seguro: 214-9493 | | Contacto: Vielka Domínguez | | |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO | | | | | |
| | | | PROYECTO: Marina buenaventura ENCARGADO: Audino Peña TOPOGRAFO: Cesar Anibal Perez Telefono: 6379-5360 | | |
| PERSONA ENCARGADA DE SUPERVISAR QUE LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES NECESARIAS DEL EQUIPO | | | | | |
| NOMBRE COMPLE RUBEN VALDESPINO | | cedula: 8-864-1937 | Firma: | | |
| | | Fecha: 03-01-19 | | | |



RUC: 344361-1-402185 D.V. 03
 Dirección: Panamá / Juan Díaz - Guayabito #2
 Teléfono: 394-7011 / 394-7012
 Fax: 220-02146

00.0024

INFORME

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|-----------|
| Marca: Caterpillar | Tipo: Reproductora | Serie: MPQ/2018 | Modelo: 410E | Motor: 61249403 | Año: 2014 |
| Potencia: 85 HP / 2200 RPM | Volts: 12 v | Alternador: 55 Amp. | Cocharon de carga: 1.25 cdt | Cocharon Puro: 24.0 g / 175 l/hrs | |
| Lantas Traseras: 18.5-24 / 17 lonas | Lantas delanteras: 12.5/80 / 10 lonas | Oruco: Estándar | | Profundidad de Escavación: 14 Pies 4 Pulg (4300mm) | |
| Acceso al Nivel del suelo: 22.000 | Sistema de Monitoreo: EMS | Tracción: 4 Ruedas | | Sistema: Monocaster en las ruedas traseras | |

MANTENIMIENTO

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------|--|
| Estado del Equipo: Activo | | Fecha: 05-06-2019 | | Hora Base: 6735.9 | | PROL/MANT: 7088.9 | | Cambio: nada/300h | |
| ATF Motor: 251 litros | | ATF Caja 757 litros | | ATF Diferencial 379 litros | | Depo. de Combustible: 37854 litros | | Engrase: 11.20 litros/hrs | |
| F. Aceite: 2 | | F. Combustible: 2 | | F. Aceite: 1 | | Lantas delanteras: d | | Lantas Traseras: d | |
| | | | | | | Líquido Refrigerante: 7.57 litros | | | |

Cambio de Piezas:

Motivo:

SEGURO DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| Póliza #: 10679571 | Vigencia de Póliza: 15 de junio del 2019 | Vencimiento de Póliza: 15 de junio del 2020 | |
| Límite de Responsabilidad: ASEGURADORA ASSA | Teléfonos de la comp. de Seguro: 214-9493 | | Contacto: Yulika Dominguez |

UBICACIÓN DEL PROYECTO



Proyecto: Remediación Río Mito
 Persona Responsable: Ing. Eduardo Berciano
 Teléfono: 62792460

PERSONA ENCARGADA DE SUPERVISAR QUE LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES NECESARIAS DEL EQUIPO

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Nombre Completo: Ruben Valdequinio | Cédula: 9-854-1937 |
| Firma del Jefe de Taller: | Fecha: |



asa Compañía de Seguros, S.A.

Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50)
Entre Calles 56 y 57
Edificio Asa, Cía de Seguros, S. A.

Teléfono 300-2772
Apartado 5371
Panamá 5, Panamá
Fax (507) 300-2729

R.U.C 3724-103-53659 D.V.43

CERTIFICADO INDIVIDUAL SEGURO DE AUTOMOVIL

PÓLIZA No. : 02B199432

FECHA: 19/08/2019

ASEGURADO:

VIGENCIA DE LA PÓLIZA: 15/08/2019 AL 15/08/2020

EQUITRANS PANAMA CORP.

VIGENCIA DEL CERTIFICADO: 15/08/2019 AL 15/08/2020

TITULAR: EQUITRANS PANAMA CORP.

AGENTE: CIRCULO DE SEGUROS, S.A.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN ASEGURADO

UNIDAD: 83
AÑO: 2016
MODELO: GU813E
V.I.N.: 1M2AX18C7GM033161
CAPACIDAD: 2
COLOR:
CONDUCTOR:

MARCA: MACK
NO. MOTOR: MP81108247A3H
PLACA: CE2762
USO: COMERCIAL
CHASIS: 1M2AX18C7GM033161

| COBERTURAS | LÍMITES DE RESPONSABILIDAD | DEDUCIBLE |
|---|----------------------------|-----------|
| LESIONES CORPORALES | 290,000.00 | |
| Por persona | 95,000.00 | |
| Por cada accidente | 290,000.00 | |
| DAÑOS A LA PROPIEDAD AJENA | 95,000.00 | |
| Por cada accidente | 95,000.00 | |
| COLISION O VUELCO | 112,566.78 | 6,500.00 |
| COMPENSIVO COMERCIAL | 112,566.78 | 2,600.00 |
| asamóvil 300-2424 | 0.00 | |
| LESIONES CORPORALES -SEGURO OBLIGATORIO | 10,000.00 | |
| Por persona | 5,000.00 | |
| Por cada accidente | 10,000.00 | |
| DAÑOS A LA PROPIEDAD AJENA-SEGURO OBLIGATORIO | 5,000.00 | 900.00 |
| Por cada accidente | 5,000.00 | |

Este Certificado se expide a solicitud de _____

Por este medio queda mutuamente entendido y convenido que este Certificado de Seguro es válido de acuerdo a los términos de la Póliza de Seguros de AUTOMOVIL emitida al Asegurado.

Este certificado es sólo una constancia y no alterará, ni modificará en forma alguna las Condiciones Particulares ni Generales de la Póliza.

Todos los demás Términos y Condiciones que forman parte de esta Póliza permanecen sin cambio.



Compañía de Seguros, S.A.

Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50)
Entre Calles 56 y 57
Edificio Assa, Cía de Seguros, S. A.

Teléfono 300-2772
Apartado 5371
Panamá 5, Panamá
Fax (507) 300-2729

R.U.C 3724-103-53659 D.V.43

CERTIFICADO INDIVIDUAL SEGURO DE AUTOMOVIL

PÓLIZA No. : 02B199432

FECHA: 19/06/2019

ASEGURADO:

VIGENCIA DE LA PÓLIZA: 15/06/2019 AL 15/06/2020

EQUITRANS PANAMA CORP.

VIGENCIA DEL CERTIFICADO: 15/06/2019 AL 15/06/2020

TITULAR: EQUITRANS PANAMA CORP.

AGENTE: CIRCULO DE SEGUROS, S.A.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN ASEGURADO

UNIDAD: 86

AÑO 2016

MARCA MACK

MODELO GU813E

NO. MOTOR MP81108281A3H

V.I.N. 1M2AX18C0GM033163

PLACA CE3150

CAPACIDAD 2

USO COMERCIAL

COLOR

CHASIS 1M2AX18C0GM033163

CONDUCTOR

COBERTURAS

LÍMITES DE RESPONSABILIDAD

DEDUCIBLE

LESIONES CORPORALES

290,000.00

Por persona 95,000.00

Por cada accidente 290,000.00

DAÑOS A LA PROPIEDAD AJENA

95,000.00

Por cada accidente 95,000.00

COLISION O VUELCO

114,909.58

6,500.00

COMPENSIVO COMERCIAL

114,909.58

2,600.00

asánóvil 300-2424

0.00

LESIONES CORPORALES -SEGURO OBLIGATORIO

10,000.00

Por persona 5,000.00

Por cada accidente 10,000.00

DAÑOS A LA PROPIEDAD AJENA-SEGURO OBLIGATORIO

5,000.00

900.00

Por cada accidente 5,000.00



asa Compañía de Seguros, S.A.

R.U.C 3724-103-53659 D.V.43

Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50)
Entre Calles 56 y 57
Edificio Asa, Cía de Seguros, S. A.

Teléfono 300-2772
Apartado 5371
Panamá 5, Panamá
Fax (507) 300-2729

CERTIFICADO INDIVIDUAL SEGURO DE AUTOMOVIL

PÓLIZA No. : 02B199432

FECHA: 19/08/2019

ASEGURADO:

VIGENCIA DE LA PÓLIZA: 15/08/2019 AL 15/08/2020

EQUITRANS PANAMA CORP.

VIGENCIA DEL CERTIFICADO: 15/08/2019 AL 15/08/2020

TITULAR: EQUITRANS PANAMA CORP.

AGENTE: CIRCULO DE SEGUROS, S.A.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN ASEGURADO

UNIDAD: 83
AÑO: 2016
MODELO: GU813E
V.I.N.: 1M2AX18C7GM033161
CAPACIDAD: 2
COLOR:
CONDUCTOR:

MARCA: MACK
NO. MOTOR: MP81108247A3H
PLACA: CE2762
USO: COMERCIAL
CHASIS: 1M2AX18C7GM033161

| COBERTURAS | LÍMITES DE RESPONSABILIDAD | DEDUCIBLE |
|---|----------------------------|-----------|
| LESIONES CORPORALES | 290,000.00 | |
| Por persona | 95,000.00 | |
| Por cada accidente | 290,000.00 | |
| DAÑOS A LA PROPIEDAD AJENA | 95,000.00 | |
| Por cada accidente | 95,000.00 | |
| COLISION O VUELCO | 112,566.78 | 6,500.00 |
| COMPENSIVO COMERCIAL | 112,566.78 | 2,600.00 |
| asamóvil 300-2424 | 0.00 | |
| LESIONES CORPORALES -SEGURO OBLIGATORIO | 10,000.00 | |
| Por persona | 5,000.00 | |
| Por cada accidente | 10,000.00 | |
| DAÑOS A LA PROPIEDAD AJENA-SEGURO OBLIGATORIO | 5,000.00 | 900.00 |
| Por cada accidente | 5,000.00 | |

Este Certificado se expide a solicitud de _____

Por este medio queda mutuamente entendido y convenido que este Certificado de Seguro es válido de acuerdo a los términos de la Póliza de Seguros de AUTOMOVIL emitida al Asegurado.

Este certificado es sólo una constancia y no alterará, ni modificará en forma alguna las Condiciones Particulares ni Generales de la Póliza.

Todos los demás Términos y Condiciones que forman parte de esta Póliza permanecen sin cambio.



RUC: 244365-5-402165 D.V. 83
 Dirección: Panamá / Juan Díaz - Guayabillo #2
 Teléfono: 394-7911 / 394-7912
 Fax: 328-62146

021/P2 # 89

| RECIBO | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Marca: | Caterpillar | Tipo: Retransmisionera | Serie: 18F32128 | Modelo: | 410T |
| Potencia: 88 HP / 2225 RPM | Voltios: 12 v | Altavoces: 18 Amp. | Cableado de carga: 1.25 vch | Cableado Retor: 14 ppg 175 Bore | #Bo: 2017 |
| Umbrales Troncos: 15.5-24 / 12 troncos | Umbrales delanteros: 12.5/08 / 32 troncos | Braco: Standard | Profundidad de excavación: 14 Pcs 4 Poly (6000mm) | | |
| Alcance al nivel del suelo: 22 pies | Sistema de Monitoreo: HMI | Través: 4 ruedas | Sistema: Biorreceptor en los ruidos (traces) | | |
| MANTENIMIENTO | | | | | |
| Estado del Equipo: | Activo | Fecha: 25-08-18 | MAINT ACT | 2018.2 | RECIBO MAINT: 2018.2 |
| ATV Motor: | 205 Bore | ATV Caja: 757 Bore | ATV Diferencial: 879 Bore | Depo. de Combustible: 87034 Bore | Ingreso: 11.20 Bore/linea |
| F. Aceite: 2 | F. Combustible | F. Aceite: 3 | Umbrales delanteros: si | Umbrales Troncos: si | Líquido Refrigerante: 7.57 Bore |
| Cambio de Pico: | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| MÓDULO DEL EQUIPO | | | | | |
| Póliza #: | 10879171 | Vigencia de Póliza: | 15 de Junio del 2018 | Vencimiento de Póliza: | 15 de Junio del 2019 |
| Línea de Responsabilidad: ASISTENCIA ASES | | Teléfono de la comp. de Seguro: 300-55-88 | | Contactar sobre seguro | |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO | | | | | |
| | | | Proprietor: Buenaventura Rio-Reto Persona Encargada: Aulino Pella Ingeniero: Eduardo Gonzalez | | |
| PERSONA ENCARGADA DE SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENSUALES DEL EQUIPO | | | | | |
| Nombre Completo: Ruben Valdespino | | | Celular: 8-864-1157 | | |
| Firma del jefe de Taller: | | | Fecha: | | |

EL EQUIPO DEL
PROGRESO

IIASA

TELEFONO: 275-9000
FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No.

V/Provisional No.

[illegible]

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo Código de Descripción

A- Roto, Rajada, Doblado
B- Rayado, Picado, Desgastado
C- Fugas o Filtraciones
D- Montaje o Proceso en Fábrica

E- El Grupo No Funciona
F- Dañado Durante el Transporte
G- Reparación General
Reacondicionamiento

H- Ajustar de Ser Necesario
I - Es Difícil Trabajar
en la pieza
J- Accidente o Abuso

¿Qué encontró mal?

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño: se cambió el tiempo de seguridad, se procedió a instalar una, clausura y pasadero, se arregló el cableado, se puso el cableado y se volvió a operar.

HORAS DE

[illegible]

EL EQUIPO DEL
PROGRESO

IIASA

CAT

TELÉFONO: 275-9000
FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No.

V/Provisional No.

| | | |
|---|--|--|
| Código del Distribuidor <i>POSO</i> | Orden de Trabajo No. <i>1163661</i> | Nombre del Cliente <i>Equitrans</i> |
| Fecha mes / día / año <i>3-18-19</i> | Empleado <i>2153 A RIVERA</i> | Ubicación del Equipo: <i>210 Holo</i> |
| Modelo Caterpillar <i>416F2</i> | Número de Serie Caterpillar <i>LBF01440</i> | Daño Reportado por el Cliente: <i>Motor</i> |
| Registro del Medidor de Servicio <i>3323</i> | Kilómetros | <i>PMI</i> |

| No. de la pieza que causó la falla | Código de Descripción | No. del Grupo que Contiene la Pieza | A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina | | Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios) |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| | <i>496</i> | <i>7501</i> | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | <i>PMI</i> |
| | | | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo Código de Descripción

A- Roto, Rajado, Doblado
B- Rayado, Picado, Desgastado
C- Fugas o Filtraciones
D- Montaje o Proceso en Fábrica

E- El Grupo No Funciona
F- Dañado Durante el Transporte
G- Reparación General
Reacondicionamiento

H- Ajustar de Ser Necesario
I- Es Difícil Trabajar en la pieza
J- Accidente o Abuso

¿Qué encontró mal? *Postillero de Freno de mano desgastado se recomienda cambiar.*

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño: *Se cambió aceite y filtro y se cambió filtro de combustible y se sacó filtro de admisión. Por último se limpió motor de aceite del motor se agregó el aceite se revisó nivel.*

HORAS DE:

| SEGMENTO | LLEGADA COMIENZO TRABAJO | TERMINO SALIDA TRABAJO | T Normal | T Extra | TOTAL Horas |
|----------|--------------------------|------------------------|----------|---------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NOMBRE DEL CLIENTE
Equitrans

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar.

¿Se tomó prueba de aceite?
SI ☒ NO ☐

¿De cuál compartimiento?

FIRMA DEL CLIENTE
Equitrans

TELEFONO: 275-9000
FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No.

V/Provisional No.

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| Código del Distribuidor | | Orden de Trabajo No. | | Nombre del Cliente | |
| POS0 | | IT63666 | | Equitome | |
| Fecha mes / día / año | | Empleado | | Ubicación del Equipo: | |
| 3/18/9 | | 2153 A. Riquelme | | Rio Hato | |
| Modelo Caterpillar | | Número de Serie Caterpillar | | Daño Reportado por el Cliente: | |
| D66 | | FBH02757 | | Mont. | |
| Registro del Medidor de Servicio | | Kilómetros | | | |
| 7480 | | | | PMI | |
| No. de la pieza que causó la falla | Código de Descripción | No. del Grupo que Contiene la Pieza | A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina | Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios) | |
| | 476 | 7501 | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | PMI | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | |
| Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo Código de Descripción | | | A- Roto, Rajada, Doblado B- Rayado, Picado, Desgastado C- Fugas o Filtraciones D- Montaje o Proceso en Fábrica E- El Grupo No Funciona F- Dañado Durante el Transporte G- Reparación General H- Ajustar de Ser Necesario I- Es Difícil Trabajar en la pieza J- Accidente o Abuso | | |

¿Qué encontró mal?

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño:

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño: Se Cambio aceite y filtro del motor, Filtro de combustible y se Replazo el Aceite primario de la camión se Tomo muestra de aceite del motor y se Revisó nueva, se Encargó el Equipo y se Trató de Computarizar para Revisar los Controles de Falla

HORAS DE:

[illegible]

EL EQUIPO DEL
PROGRESO

IIASA

CAT

TELEFONO: 275-9000
FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No.

V/Provisional No.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Código del Distribuidor POSO | Orden de Trabajo No. 1+63783 | Nombre del Cliente EQUITRANS | |
| Fecha mes / día / año 03/21/19 | Empleado 325/Silvino | Ubicación del Equipo: Rio Hato | |
| Modelo Caterpillar 416 F2 | Número de Serie Caterpillar LBFO2578 | Daño Reportado por el Cliente: MANEJO DEL EQUIPO PM-1 | |
| Registro del Medidor de Servicio 23 000.2 Hrs | Kilómetros — | | |
| No. de la pieza que causó la falla | Código de Descripción | No. del Grupo que Contiene la Pieza | A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina |
| | 49G | 7501 | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo Código de Descripción | | Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios) | |
| A- Roto, Rajada, Doblado B- Rayado, Picado, Desgastado C- Fugas o Filtraciones D- Montaje o Proceso en Fábrica | | E- El Grupo No Funciona F- Dañado Durante el Transporte G- Reparación General Reacondicionamiento | |
| | | H- Ajustar de Ser Necesario I - Es Difícil Trabajar en la pieza J- Accidente o Abuso | |

¿Qué encontró mal? *** FUGA DE ACEITE POR EL CUERPO DE VALVULAS DEL MOTOR**

*** REEMPLAZAR TACOS DEL FRENO DE MANO Y LUBRICAR AL CALIPRA**

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño: **SE CAMBIO EL ACEITE DEL MOTOR, FILTROS DEL COMBUSTIBLE, LIMPIEZA DEL FILTRO DEL AIRE, REGRASE DEL EQUIPO, REVISION DE LOS NIVELAS DE LOS FLUIDOS, REVISION GENERAL Y PRUEBA DEL EQUIPO**

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO

HORAS DE:

| SEGMENTO | LLEGADA COMIENZO TRABAJO | TERMINO SALIDA TRABAJO | T Normal | T Extra | TOTAL Horas |
|----------|--------------------------|------------------------|----------|---------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Audinio Peña
NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar.

¿Se tomó prueba de aceite?
SI ☒ NO ☐

¿De cuál compartimiento?

[Firma]
FIRMA DEL CLIENTE

Informe de Monitoreo de Condiciones CSAP-0591-19

Departamento CSA

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Fecha de envío de informe: | 7 de Marzo de 2019 | Modelo: | 320D2L |
| Fecha de mantenimiento: | 28 de Febrero de 2019 | Serie: | KHR00546 |
| Cliente: | SERVICIOS Y EXCAVACIONES NACIONALES, S.A. | Horómetro del equipo: | 7659 Horas |
| Ubicación del equipo: | Buena Aventura | O/T: | 1W63227 |
| PM realizado: | PM-1 | Técnico de Servicio: | Silvino Rodriguez |
| Estado de Informe: | MONITOREO | | |

Estimado cliente, la información presentada a continuación deberá ser revisada en su totalidad, esto le permitirá conocer el estado actual de su equipo.

Según visita de mantenimiento de la referencia, la cual se realizó el día 28-Febrero-19, a la EXCAVADORA Caterpillar, modelo: 320D2L, serie: KHR00546, le adjunto el siguiente detalle:

1. Informe de Mantenimiento CSA.
2. Novedades reportadas.
3. Reporte del sistema VisionLink.
4. Reporte de Análisis S.O.S.
5. Recomendaciones del equipo por horas de servicio.
6. Sugerencias.

1. INFORME DE MANTENIMIENTO CSA.

En esta visita se realizaron las actividades que el Manual de Operación y Mantenimiento sugiere considerando las horas de servicio de su equipo, entre las actividades principales detallamos lo siguiente:

| Reemplazo de Filtros | Si / No | Observación |
|-----------------------------------|---------|---------------------|
| Filtro de aceite de motor | Si | |
| Filtros de combustible | Si | |
| Filtro primario de aire del motor | No | Se realizó limpieza |
| Reemplazo de Aceites | Si / No | Observación |
| Aceite del motor | Si | |
| Otras actividades realizadas | Si / No | Observación |
| Toma de muestra | Si | |
| Engrase general del equipo | Si | |
| Revisión general del equipo | Si | Equipo operativo |

2. NOVEDADES REPORTADAS.

En la presente visita de mantenimiento el técnico de servicio reportó las siguientes novedades.

- a) Se encontró en mal estado la antena del ProductLink. Se recomienda monitorear esta condición.



RUC: 344381-1-402185 D.V. 03
Dirección: Panamá / Juan Díaz - Guayabito #2
Teléfono: 394-7011 / 394-7012
Fax: 220-02146

02.00021

INFORME

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------|
| Marcas: Caterpillar | Tipo: Retroexcavadora | Serie: M95C018 | Modelo: 410E | Motor: 6400945 | Año: 2014 |
| Potencia: 85 HP / 2200 RPM | Voltaje: 12v | Alternador: 55 Amp. | Cucharon de carga: 3.25 cúbic | Cucharon fondo: 24 cúbic / 175 ltr | |
| Llaves Troncos: 18.5-34 / 13 lonas | Llaves delanteras: 12.5/80 / 10 lonas | Brazo: Estándar | Profundidad de Excavación: 51 Pies 4 Pulg / 1560 mm | | |
| Alcance al final del brazo: 22 pies | Sistema de Monitoreo: DMS | Trazado: 4 Ruedas | Sistema: Hidráulico en las ruedas tracción | | |

MANTENIMIENTO

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Estado del Equipo: Activo | Fecha: 05-06-2019 | Hora Base: 6735.9 | PROX. MANT.: 7285.9 | Cambio: cada 200h |
| ATF Motor: 255 ltr | ATF Caja: 757 ltr | ATF Diferencial: 379 ltr | Óleo de Combustible: 3785 ltr | Engrase: 11.75 ltr / mes |
| F. Aire: 2 | F. Combustible: 2 | F. Aceite: 1 | Llaves del motor: el | Llaves Troncos: el |
| Líquido Refrigerante: 7.17 ltr | | | | |

Cambio de Piezas:

Motivo:

SEGURO DEL EQUIPO

| | | |
|---|--|---|
| Póliza #: 10673671 | Vigencia de Póliza: 15 de junio del 2019 | Vencimiento de Póliza: 15 de junio del 2020 |
| Límite de Responsabilidad: ASEGURADORA ASSA | | |
| Teléfonos de la comp. de Seguro: 214-0493 | | |
| Contacto: Vivika Dominguez | | |

UBICACIÓN DEL PROYECTO



Proyecto: Riessewara Rio Alto
Persona Encargada: Ing. Ricardo Morales
Teléfono:
Celular: 62742460

PERSONA ENCARGADA DE SUPERVISAR QUE LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES NECESARIAS DEL EQUIPO

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Nombre Completo: Ruben Valdespino | Cédula: 9-854-1937 |
| Firma del Jefe de Taller: | Fecha: |

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No.

V/Provisional No.

| | | |
|---|--|---|
| Código del Distribuidor P050 | Orden de Trabajo No. | Nombre del Cliente Equitron |
| Fecha mes/día/año 7/30/19 | Empleado 1848 | Ubicación del Equipo: Rio Hato |
| Modelo Caterpillar 336 D2 | Número de Serie Caterpillar ZCT01092 | Daño Reportado por el Cliente: Cambio de ingenieros |
| Registro del Medidor de Servicio 6048 | Kilómetros | |

| No. de la pieza que causó la falla | Código de Descripción | No. del Grupo que Contiene la Pieza | A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina | Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios) |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo Código de Descripción

A- Roto, Rajado, Doblado
B- Rayado, Picado, Desgastado
C- Fugas o Filtraciones
D- Montaje o Proceso en Fábrica

E- El Grupo No Funciona
F- Dañado Durante el Transporte
G- Reparación General
Reacondicionamiento

H- Ajustar de Ser Necesario
I - Es Difícil Trabajar en la pieza
J- Accidente o Abuso

¿Qué encontró mal? **Los ingenieros malos y antes de ingenieros y personal de la banda hidráulica.**

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño: **Se paró a demorar la zona de la zona para sacar los ingenieros y el cable de la zona de la zona para reemplazar el grupo, se sacó los ingenieros y se reemplazó el grupo, se sacó los ingenieros y se reemplazó el grupo, se sacó los ingenieros y se reemplazó el grupo.**

HORAS DE:

| SEGMENTO | LLEGADA COMIENZO TRABAJO | TERMINO SALIDA TRABAJO | T Normal | T Extra | TOTAL Horas |
|----------|--------------------------|------------------------|----------|---------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar.

¿Se tomó prueba de aceite?
SI ☐ NO ☐

¿De cuál compartimiento?

abdpawp

FIRMA DEL CLIENTE

TELEFONO: 275-9000
FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No

V/Provisional No.

| | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|--|---|
| Código del Distribuidor P050 | | Orden de Trabajo No. | | Nombre del Cliente Equitrans | |
| Fecha mes / día / año 7/30/19 | | Empleado 1848 | | Ubicación del Equipo: Rio Hato | |
| Modelo Caterpillar 336 D2 | | Número de Serie Caterpillar ZCT01092 | | Daño Reportado por el Cliente: Cambio de aceite | |
| Registro del Medidor de Servicio 6048 | | Kilómetros | | | |
| No. de la pieza que causó la falla | Código de Descripción | No. del Grupo que Contiene la Pieza | A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina | | Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios) |
| | | | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| | | | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo Código de Descripción | | A- Roto, Rajado, Doblado B- Rayado, Picado, Desgastado C- Fugas o Filtraciones D- Montaje o Proceso en Fábrica | | E- El Grupo No Funciona F- Dañado Durante el Transporte G- Reparación General Reacondicionamiento | |
| | | | | H- Ajustar de Ser Necesario I - Es Difícil Trabajar en la pieza J- Accidente o Abuso | |

¿Qué encontró mal? Las hojas molas y aires de ingelos y personal de la subo holicas.

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño: Se procedió a demorar las hojas validos para para las ingelos y el cable de las hojas validos para reemplazar el que, se reco las ingelos y se reemplazo el de la subo holicas, se reco las ingelos y el cable de la subo holicas.

HORAS DE:

[illegible]

EL EQUIPO DEL
PROGRESO

IIASA

CAT

TELEFONO: 275-9000
FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No.

V/Provisional No.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Código del Distribuidor POSO | Orden de Trabajo No. 1+63783 | Nombre del Cliente EQUITRANS | |
| Fecha mes / día / año 03/21/19 | Empleado 325/Silvino | Ubicación del Equipo: Rio Hato | |
| Modelo Caterpillar 416F2 | Número de Serie Caterpillar LBFO2578 | Daño Reportado por el Cliente: MANEJO DEL EQUIPO | |
| Registro del Medidor de Servicio 23 24.2 Hrs | Kilómetros — | EQUIPO PM-1 | |
| No. de la pieza que causó la falla | Código de Descripción | No. del Grupo que Contiene la Pieza | A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina |
| | 49G | 7501 | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| | | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo Código de Descripción | | Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios) | |
| A- Roto, Rajada, Doblado B- Rayado, Picado, Desgastado C- Fugas o Filtraciones D- Montaje o Proceso en Fábrica | | E- El Grupo No Funciona F- Dañado Durante el Transporte G- Reparación General Reacondicionamiento H- Ajustar de Ser Necesario I - Es Difícil Trabajar en la pieza J- Accidente o Abuso | |

¿Qué encontró mal? *** FUGA De Aceite Por el cuerpo de válvulas**
Del motor
*** Reemplazar Tacos del freno de mano y limpiar al caliper**

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño: **SE CAMBIO EL ACEITE DEL MOTOR, FILTROS DEL COMBUSTIBLE, LIMPIEZA DEL FILTRO DEL AIRE, REGRASE DEL EQUIPO, REVISIÓN DE LAS NIVELAS DE LOS FLUIDOS, INSPECCIÓN GENERAL Y PRUEBA DEL EQUIPO**
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO

HORAS DE:

| SEGMENTO | LLEGADA COMIENZO TRABAJO | TERMINO SALIDA TRABAJO | T Normal | T Extra | TOTAL Horas |
|----------|--------------------------|------------------------|----------|---------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Audino Peña
NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar.

¿Se tomó prueba de aceite?
SI ☐ NO ☐

¿De cuál compartimiento?

[Firma]
FIRMA DEL CLIENTE

Informe de Monitoreo de Condiciones CSAP-0591-19

Departamento CSA

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Fecha de envío de informe: | 7 de Marzo de 2019 | Modelo: | 320D2L |
| Fecha de mantenimiento: | 28 de Febrero de 2019 | Serie: | KHR00546 |
| Cliente: | SERVICIOS Y EXCAVACIONES NACIONALES, S.A. | Horómetro del equipo: | 7659 Horas |
| Ubicación del equipo: | Buena Aventura | O/T: | 1W63227 |
| PM realizado: | PM-1 | Técnico de Servicio: | Silvino Rodríguez |
| Estado de Informe: | MONITOREO | | |

Estimado cliente, la información presentada a continuación deberá ser revisada en su totalidad, esto le permitirá conocer el estado actual de su equipo.

Según visita de mantenimiento de la referencia, la cual se realizó el día 28-Febrero-19, a la EXCAVADORA Caterpillar, modelo: 320D2L, serie: KHR00546, le adjunto el siguiente detalle:

1. Informe de Mantenimiento CSA.
2. Novedades reportadas.
3. Reporte del sistema VisionLink.
4. Reporte de Análisis S.O.S.
5. Recomendaciones del equipo por horas de servicio.
6. Sugerencias.

1. INFORME DE MANTENIMIENTO CSA.

En esta visita se realizaron las actividades que el Manual de Operación y Mantenimiento sugiere considerando las horas de servicio de su equipo, entre las actividades principales detallamos lo siguiente:

| <u>Reemplazo de Filtros</u> | <u>Si / No</u> | <u>Observación</u> |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| Filtro de aceite de motor | Si | |
| Filtros de combustible | Si | |
| Filtro primario de aire del motor | No | Se realizó limpieza |
| <u>Reemplazo de Aceites</u> | <u>Si / No</u> | <u>Observación</u> |
| Aceite del motor | Si | |
| <u>Otras actividades realizadas</u> | <u>Si / No</u> | <u>Observación</u> |
| Toma de muestra | Si | |
| Engrase general del equipo | Si | |
| Revisión general del equipo | Si | Equipo operativo |

2. NOVEDADES REPORTADAS.

En la presente visita de mantenimiento el técnico de servicio reportó las siguientes novedades.

- a) Se encontró en mal estado la antena del ProductLink. Se recomienda monitorear esta condición.

ANEXO 3.4. MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

RESOLUCIÓN No. 2342
(De 18 de septiembre de 2018)

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que la **Constitución Política de Panamá** en su Artículo 109, señala que es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social,

Que el **Decreto Ejecutivo 40 de 26 de enero de 2010**, establece las actividades relacionadas con situaciones de alto riesgo público por sus implicaciones a la salud o al medio ambiente, y que por ello requieren de la obtención de **Permiso Sanitario de Operación**, por parte del Ministerio de Salud.

Que el **Decreto Ejecutivo 856 de 4 de agosto de 2015**, modifica el **Artículo 1 del Decreto Ejecutivo 40 de 2010** y establece en su numeral 14, que las actividades de extracción, transporte, tratamiento y/o disposición final de aguas residuales y lodos fecales procedentes de letrinas móviles, tanques sépticos y/o plantas de tratamiento, son de alto riesgo y por ende, **requieren de un Permiso Sanitario de Operación;**

Que la **Región Metropolitana de Salud** recibió la documentación concerniente a la solicitud incoada, por parte del establecimiento de interés sanitario denominado **ALUMA SYSTEMS PANAMA**, de propiedad de **ALUMA SYSTEMS PANAMA S.A.**, representada legalmente por el señor **CAMILO ERNESTO CEVILLE MANTOVANI**, con Poder General, inscrito en el Registro Público de Panamá el día 28 de julio de 2011, portador de la cédula de identidad personal 8-709-1714, ubicado en la Urbanización Llano Bonito, calle primera, edificio **ALUMA SYSTEMS**, corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá, provincia de Panamá, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados para dicha actividad, y una vez constatada, fue remitido a la Dirección General de Salud Pública;

Que con fundamento en todo lo antes esbozado, este despacho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso Sanitario de Operación al establecimiento de interés sanitario denominado **ALUMA SYSTEMS PANAMA**, de propiedad de **ALUMA SYSTEMS PANAMA S.A.**, representada legalmente por el señor **CAMILO ERNESTO CEVILLE MANTOVANI**, con Poder General inscrito en el Registro Público de Panamá el día 28 de julio de 2011, portador de la cédula de identidad personal 8-709-1714, ubicado en la Urbanización Llano Bonito, calle primera, edificio **ALUMA SYSTEMS**, corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá, provincia de Panamá, para que se dedique a la actividad de extracción de aguas residuales procedentes de letrinas móviles.

ARTÍCULO SEGUNDO: Indicar a la empresa que el Permiso Sanitario que se otorga en la presente Resolución, tendrá una vigencia de un (1) año.

ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la empresa que la renovación del Permiso Sanitario de Operación otorgado en la presente Resolución deberá ser solicitada con treinta (30) días de anticipación a su expiración. Se otorgará siempre que el establecimiento mantenga las condiciones sanitarias que motivaron su expedición inicial.


ARTÍCULO CUARTO: Indicar a la empresa que el Permiso Sanitario de Operación debe estar en un lugar visible al público.

ARTÍCULO QUINTO: Advertir que la autoridad sanitaria competente podrá retirar el Permiso otorgado, cuando compruebe, a través de inspección realizada por personal idóneo, que se están infringiendo las normas sanitarias vigentes de la actividad para la cual fue autorizada.

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución empezará a regir a partir de su notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Constitución Política de Panamá, Decreto Ejecutivo 40 de 26 de enero de 2010, modificado por el Decreto Ejecutivo 856 de 4 de agosto de 2015 y demás normas concordantes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


Dra. ITZA BARAHONA DE MOSCA
Directora General de Salud Pública





R.U.C. 1129851-1-566686 D.V. 10

SOLUCIONES TEMPORALES Constancia de Limpieza

Nº 31747

Teléfono Nivel Nacional 800-0450

Vía Tocumen, Entrada a Brisas del Golf

Tel.: (507) 266-7647 / 398-0450 • Fax: (507) 266-7607

RE Express, Cochez y Cía Ave. Balboa

Tel.: (507) 262-6680

Chorrera, Vía Interamericana, Salida antigua autopista

(507) 244-3347 / 48

Vía Interamericana, entrada Penonomé

Tel.: (507) 997-7506 / 997-7566

David, Vía Interamericana, San Pablo

Tel.: (507) 722-1141

FECHA: 17 / 4 / 19

CLIENTE:

West corporation

PROYECTO:

Buenaventura, marina

CONDUCTOR:

Javier

SANITARIO No.:

1

William Bustarife

RECIBIDO CONFORME:

Javier

OPERADOR



R.U.C. 1129851-1-566686 D.V. 10

SOLUCIONES TEMPORALES Constancia de Limpieza

Nº 31712

Teléfono Nivel Nacional 800-0450

Vía Tocumen, Entrada a Brisas del Golf
Tel.: (507) 266-7647 / 398-0450 • Fax: (507) 266-7607

RE Express, Cochez y Cía Ave. Balboa

Tel.: (507) 262-6680

Chorrera, Vía Interamericana, Salida antigua autopista
(507) 244-3347 / 48

Vía Interamericana, entrada Penonomé

Tel.: (507) 997-7506 / 997-7566

David, Vía Interamericana, San Pablo

Tel.: (507) 722-1141

FECHA: 3 / 48 / 19

CLIENTE:

West Corporation

PROYECTO:

Buenaventura

CONDUCTOR:

Savior

SANITARIO No.:

William Bustamante

RECIBIDO CONFORME:

Savior

OPERADOR



R.U.C. 1129851-1-566686 D.V. 10

SOLUCIONES TEMPORALES

Constancia de Limpieza

Nº 31642

Teléfono Nivel Nacional 800-0450

Vía Tocumen, Entrada a Brisas del Golf
Tel.: (507) 266-7647 / 398-0450 • Fax: (507) 266-7607
RE Express, Cochez y Cía Ave. Balboa
Tel.: (507) 262-6680
Chorrera, Vía Interamericana, Salida antigua autopista
(507) 244-3347 / 48
Vía Interamericana, entrada Penonomé
Tel.: (507) 997-7506 / 997-7566
David, Vía Interamericana, San Pablo
Tel.: (507) 722-1141

FECHA: 20 / 03 / 2019

CLIENTE:

Wirth Corporation

PROYECTO:

Buenaventura

CONDUCTOR:

Saverio

SANITARIO No.:

1

RECIBIDO CONFORME:

OPERADOR



R.U.C. 1129851-1-566686 D.V. 10

SOLUCIONES TEMPORALES Constancia de Limpieza

Nº 31636

FECHA: 14 / 3 / 19

Teléfono Nivel Nacional 800-0450

Vía Tocumen, Entrada a Brisas del Golf

Tel.: (507) 266-7647 / 398-0450 • Fax: (507) 266-7607

RE Express, Cochez y Cía Ave. Balboa

Tel.: (507) 262-6680

Chorrera, Vía Interamericana, Salida antigua autopista

(507) 244-3347 / 48

Vía Interamericana, entrada Penonomé

Tel.: (507) 997-7506 / 997-7566

David, Vía Interamericana, San Pablo

Tel.: (507) 722-1141

CLIENTE:

West Corporation

PROYECTO:

Buena orientación

CONDUCTOR:

Javier

UNITARIO No.:

RECIBIDO CONFORME:

OPERADOR



R.U.C. 1129851-1-566686 D.V. 10

SOLUCIONES TEMPORALES Constancia de Limpieza

Nº 30650

Teléfono Nivel Nacional 800-0450

Vía Tocumen, Entrada a Brisas del Golf

Tel.: (507) 266-7647 / 398-0450 • Fax: (507) 266-7607

RE Express, Cochez y Cía Ave. Balboa

Tel.: (507) 262-6680

Chorrera, Vía Interamericana, Salida antigua autopista

(507) 244-3347 / 48

Vía Interamericana, entrada Penonomé

Tel.: (507) 997-7506 / 997-7566

David, Vía Interamericana, San Pablo

Tel.: (507) 722-1141

FECHA:

27 / 4 / 19

CLIENTE:

West Cooperación

PROYECTO:

La Marina

CONDUCTOR:

Feliciano Gorrache

SANITARIO No.:

1 baño

RECIBIDO CONFORME:

William Buitrago


OPERADOR

Feliciano Gorrache

El proyecto cuenta con dos letrinas y son limpiadas una vez a la semana. Adjunto evidencia de la misma

11. Comprobante de limpieza de los baños:

El proyecto cuenta con tres baños portátiles, uno en calle 5ta. Otro en la Herradura hacia calle 5ta y otro en el campamento de los eléctricos en el área de Velamar. Los baños son limpiados los días martes y jueves de cada semana



R.U.C.: 8-703-671 D.V. 7
Panamá
Tel.: 340-1313
Cel.: 6701-2093 / 6678-5370
email: selepsa30@gmail.com

FACTURA NO.: 1029

| | | |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 15 | 7 | 2019 |

Cliente: Egentos Panama' Cap

Dirección: Buena Ventura - Marina

Teléfono: _____

CONDICIONES: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.U. | TOTAL |
|---|--|-------|-------|
| 3 | Alquiler y mantenimiento de Baño Ptl. | 125 - | 375 - |
| 18 | Mantenimiento adicional a 3 Baños Portátiles | 25 - | 450 - |
| | Periodo De Mantenimiento adicional del 20-6 al 25-7-2019 | | |
| <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;"> 882.75 </div> | | | |
| SUB-TOTAL: | | | 825 - |
| I.T.B.M.S.: | | | 57.25 |

SEMANA 4

Aluma SYSTEMS
BY SHAKO SAFARI

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO

CLIENTE: Constructora Niles 2019

PROYECTO: Veto mas

UBICACION: Barrio Jontu

ENCARGADO: _____ TEL: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | CANTIDAD | DESCRIPCION |
|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 1 | TRATAMIENTO DE MADERA | 21 | TRATAMIENTO DE MADERA |
| 1 | TRATAMIENTO DE MADERA | 1 | TRATAMIENTO DE MADERA |
| 1 | TRATAMIENTO DE MADERA | 1 | TRATAMIENTO DE MADERA |
| 1 | TRATAMIENTO DE MADERA | 1 | TRATAMIENTO DE MADERA |
| 1 | TRATAMIENTO DE MADERA | 1 | TRATAMIENTO DE MADERA |
| 1 | TRATAMIENTO DE MADERA | 1 | TRATAMIENTO DE MADERA |

FECHA: _____

POB ALUMA: _____

NOMBRE CLIENTE: Barrio Jontu

FECHA: E-8-9-9-9

NUMERO: 38927

7. Registro de control de fumigación vigente

MUNICIPIO DE ANTON
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN

A QUIEN CONCIERNE:

Yo CARLOS FIDEL ALVARADO HERNANDEZ
Cédula No. 81-8531440
Residente en: LAS GUAS ORIENTE, RIO HATO
TEL. 99313477/99312759/603018008

Hago Constatar:

Que el día 05 del mes de FEBRERO de 2019,
por nuestra empresa denominada: FUMI EXPRESS

el establecimiento CONSTRUCTORA AVANS, S.A.
construcción de RIO HATO

A fin de dar cumplimiento al artículo No. 6 del Reglamento No. 1996

Antón, 05 del mes de FEBRERO de 2019
AL 05 DE ABRIL DE 2019

Recibo: 9644 Firma: [Firma]

Aluma SYSTEMS

BY BRAND/SAFWAY

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO

- ☐ ENTREGA INICIAL
 ☒ LIMPIEZA REGULAR
☐ DEVOLUCIÓN
 ☐ LIMPIEZA ADICIONAL
☐ CAMBIO
 ☐ REPARACIÓN

CLIENTE: Prody Panama S.A.
 FECHA: 19.2.19
 PROYECTO: Maxim Village
 HORA: _____
 UBICACIÓN: B. Ventura
 O. C. #: _____
 ENCARGADO: _____
 TEL.: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|----------|-----------------------------------|----------|---|
| | SENCILLO (CONSTRUCCIÓN), COLOR | | VIP, POLLY JOHN |
| | MAXIN 2000 (CONSTRUCCIÓN) | 3 | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN |
| | ESPECIAL CON FLUSH (CONSTRUCCIÓN) | | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN VOLADO |
| | URINAL | | MAXIN 3000 VIP |
| | HOLDING TANK | | MAXIN 3000 SENCILLO EVENTOS |

OBSERVACIONES:

POR ALUMA: P.F.
 NOMBRE (CLIENTE): _____
 FIRMA (CLIENTE): [Firma] 37292

D007, REV. 04/10

Aluma SYSTEMS

BY BRAND/SAFWAY

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO

- ☐ ENTREGA INICIAL
 ☒ LIMPIEZA REGULAR
☐ DEVOLUCIÓN
 ☐ LIMPIEZA ADICIONAL
☐ CAMBIO
 ☐ REPARACIÓN

CLIENTE: Prody Panama S.A.
 FECHA: 12.2.19
 PROYECTO: Maxim Village
 HORA: _____
 UBICACIÓN: B. Ventura
 O. C. #: _____
 ENCARGADO: _____
 TEL.: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|----------|-----------------------------------|----------|---|
| | SENCILLO (CONSTRUCCIÓN), COLOR | | VIP, POLLY JOHN |
| | MAXIN 2000 (CONSTRUCCIÓN) | 3 | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN |
| | ESPECIAL CON FLUSH (CONSTRUCCIÓN) | | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN VOLADO |
| | URINAL | | MAXIN 3000 VIP |
| | HOLDING TANK | | MAXIN 3000 SENCILLO EVENTOS |

OBSERVACIONES:

POR ALUMA: P.F.
 NOMBRE (CLIENTE): [Firma]
 FIRMA (CLIENTE): [Firma] 37278

D007, REV. 04/10

Aluma SYSTEMS

BY BRAND/SAFWAY

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO☐ ENTREGA INICIAL☒ LIMPIEZA REGULAR☐ DEVOLUCIÓN☐ LIMPIEZA ADICIONAL☐ CAMBIO☐ REPARACIÓN

CLIENTE: Voddy Panam, S.A. FECHA: 5-2-19

PROYECTO: Mano Village HORA: _____

UBICACIÓN: Village O. C. #: _____

ENCARGADO: _____ TEL.: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|----------|-----------------------------------|----------|---|
| | SENCILLO (CONSTRUCCIÓN), COLOR | | VIP, POLLY JOHN |
| | MAXIN 2000 (CONSTRUCCIÓN) | <u>3</u> | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN |
| | ESPECIAL CON FLUSH (CONSTRUCCIÓN) | | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN VOLADO |
| | URINAL | | MAXIN 3000 VIP |
| | HOLDING TANK | | MAXIN 3000 SENCILLO EVENTOS |

OBSERVACIONES:

POR ALUMA

NOMBRE (CLIENTE)

FIRMA (CLIENTE)

37258

0007, REV. 04/10

Aluma SYSTEMS

BY BRAND/SAFWAY

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO☐ ENTREGA INICIAL☒ LIMPIEZA REGULAR☐ DEVOLUCIÓN☐ LIMPIEZA ADICIONAL☐ CAMBIO☐ REPARACIÓN

CLIENTE: Voddy Panam, S.A. FECHA: 26-7-19

PROYECTO: Mano Village HORA: _____

UBICACIÓN: B. Vertun O. C. #: _____

ENCARGADO: _____ TEL.: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|----------|-----------------------------------|----------|---|
| | SENCILLO (CONSTRUCCIÓN), COLOR | | VIP, POLLY JOHN |
| | MAXIN 2000 (CONSTRUCCIÓN) | <u>3</u> | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN |
| | ESPECIAL CON FLUSH (CONSTRUCCIÓN) | | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN VOLADO |
| | URINAL | | MAXIN 3000 VIP |
| | HOLDING TANK | | MAXIN 3000 SENCILLO EVENTOS |

OBSERVACIONES:

POR ALUMA

NOMBRE (CLIENTE)

FIRMA (CLIENTE)

40271

0007, REV. 04/10

6. Registro de limpieza de sanitarios portátiles - mes Diciembre

SEMANA 1

Aluma SYSTEMS
BY BRAND SASWAY

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO

CLIENTE: *Constructora Acon SA* 12 3 4
PROYECTO: *Udelmar*
UBICACION: *Buenaventura*

FECHA: 12/3/19

| CONTRATO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO |
|----------|-----------------------|--------|--------|
| 1 | RENOVACION DE PINTURA | 4 | |
| 2 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 3 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 4 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 5 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 6 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 7 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 8 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 9 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 10 | RENOVACION DE PINTURA | | |

38004

SEMANA 2

Aluma SYSTEMS
BY BRAND SASWAY

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO

CLIENTE: *Constructora Acon SA* 12 3 4
PROYECTO: *Udelmar*
UBICACION: *Buenaventura*

FECHA: 12/3/19

| CONTRATO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO |
|----------|-----------------------|--------|--------|
| 1 | RENOVACION DE PINTURA | 4 | |
| 2 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 3 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 4 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 5 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 6 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 7 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 8 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 9 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 10 | RENOVACION DE PINTURA | | |

37652

SEMANA 3

Aluma SYSTEMS
BY BRAND SASWAY

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO

CLIENTE: *Constructora Acon SA* 12 3 4
PROYECTO: *Udelmar*
UBICACION: *Buenaventura*

FECHA: 12/3/19

| CONTRATO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO |
|----------|-----------------------|--------|--------|
| 1 | RENOVACION DE PINTURA | 4 | |
| 2 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 3 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 4 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 5 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 6 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 7 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 8 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 9 | RENOVACION DE PINTURA | | |
| 10 | RENOVACION DE PINTURA | | |

37698

5. Registro de limpieza de sanitarios portátiles - mes MAYO

| Aluma SYSTEMS | | BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO | |
|---|--|---------------------------------|--|
| <p><i>Carat. Pura, S.A.</i> <i>Urb. La Victoria</i> <i>Barrio La Victoria</i></p> | | <p><i>21-5-79</i></p> | |
| <p><i>1</i></p> | | <p><i>39000</i></p> | |

| Aluma SYSTEMS | | BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO | |
|---|--|---------------------------------|--|
| <p><i>Carat. Pura, S.A.</i> <i>Urb. La Victoria</i> <i>Barrio La Victoria</i></p> | | <p><i>21-5-79</i></p> | |
| <p><i>1</i></p> | | <p><i>39005</i></p> | |

| Aluma SYSTEMS | | BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO | |
|---|--|---------------------------------|--|
| <p><i>Carat. Pura, S.A.</i> <i>Urb. La Victoria</i> <i>Barrio La Victoria</i></p> | | <p><i>21-5-79</i></p> | |
| <p><i>1</i></p> | | <p><i>39006</i></p> | |

Aluma SYSTEMS

BY BRAND/SAFWAY

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO☐ ENTREGA INICIAL☒ LIMPIEZA REGULAR☐ DEVOLUCIÓN☐ LIMPIEZA ADICIONAL☐ CAMBIO☐ REPARACIÓN

CLIENTE: Ing. Lara, S.A. FECHA: 19-7-19
PROYECTO: Melanie Village HORA: _____
UBICACIÓN: B. Ventun O. C. #: _____
ENCARGADO: _____ TEL.: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|----------|-----------------------------------|----------|---|
| | SENCILLO (CONSTRUCCIÓN), COLOR | | VIP, POLLY JOHN |
| | MAXIN 2000 (CONSTRUCCIÓN) | 3+1 | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN |
| | ESPECIAL CON FLUSH (CONSTRUCCIÓN) | | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN VOLADO |
| | URINAL | | MAXIN 3000 VIP |
| | HOLDING TANK | | MAXIN 3000 SENCILLO EVENTOS |

OBSERVACIONES:

1 Holding Tanks

0007, REV. 04/10

P.F.
POR ALUMA

NOMBRE (CLIENTE)

[Signature]
FIRMA (CLIENTE)

37290

Aluma SYSTEMS

BY BRAND/SAFWAY

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO☐ ENTREGA INICIAL☒ LIMPIEZA REGULAR☐ DEVOLUCIÓN☐ LIMPIEZA ADICIONAL☐ CAMBIO☐ REPARACIÓN

CLIENTE: Ing. Lara, S.A. FECHA: 26-7-19
PROYECTO: Melanie Village HORA: _____
UBICACIÓN: B. Ventun O. C. #: _____
ENCARGADO: _____ TEL.: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|----------|-----------------------------------|----------|---|
| | SENCILLO (CONSTRUCCIÓN), COLOR | | VIP, POLLY JOHN |
| | MAXIN 2000 (CONSTRUCCIÓN) | 3+1 | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN |
| | ESPECIAL CON FLUSH (CONSTRUCCIÓN) | | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN VOLADO |
| | URINAL | | MAXIN 3000 VIP |
| | HOLDING TANK | | MAXIN 3000 SENCILLO EVENTOS |

OBSERVACIONES:

1 Holding Tanks

0007, REV. 04/10

P.F.
POR ALUMA

NOMBRE (CLIENTE)

[Signature]
FIRMA (CLIENTE)

40269

Aluma SYSTEMS

BY BRAND/SAFWAY

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO☐ ENTREGA INICIAL☒ LIMPIEZA REGULAR☐ DEVOLUCIÓN☐ LIMPIEZA ADICIONAL☐ CAMBIO☐ REPARACIÓN

CLIENTE: Ing. Lara S.A. FECHA: 5-2-19

PROYECTO: Marina Village HORA: _____

UBICACIÓN: Cerro Ventura O. C. #: _____

ENCARGADO: _____ TEL.: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|----------|-----------------------------------|----------|---|
| | SENCILLO (CONSTRUCCIÓN), COLOR | | VIP, POLLY JOHN |
| | MAXIN 2000 (CONSTRUCCIÓN) | 3 | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN |
| | ESPECIAL CON FLUSH (CONSTRUCCIÓN) | | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN VOLADO |
| | URINAL | | MAXIN 3000 VIP |
| | HOLDING TANK | | MAXIN 3000 SENCILLO EVENTOS |

OBSERVACIONES:

1 Holding Tanks.P.F.

POR ALUMA

NOMBRE (CLIENTE)

[Signature]

FIRMA (CLIENTE)

37255

D007, REV. 04/10

Aluma SYSTEMS

BY BRAND/SAFWAY

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO☐ ENTREGA INICIAL☒ LIMPIEZA REGULAR☐ DEVOLUCIÓN☐ LIMPIEZA ADICIONAL☐ CAMBIO☐ REPARACIÓN

CLIENTE: Ing. Lara S.A. FECHA: 12-2-19

PROYECTO: Marina Village HORA: _____

UBICACIÓN: C. Ventura O. C. #: _____

ENCARGADO: _____ TEL.: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|----------|-----------------------------------|----------|---|
| | SENCILLO (CONSTRUCCIÓN), COLOR | | VIP, POLLY JOHN |
| | MAXIN 2000 (CONSTRUCCIÓN) | 3 | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN |
| | ESPECIAL CON FLUSH (CONSTRUCCIÓN) | | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN VOLADO |
| | URINAL | | MAXIN 3000 VIP |
| | HOLDING TANK | | MAXIN 3000 SENCILLO EVENTOS |

OBSERVACIONES:

1 Holding TanksP.F.

POR ALUMA

NOMBRE (CLIENTE)

[Signature]

FIRMA (CLIENTE)

37277

D007, REV. 04/10

Aluma SYSTEMS

BY BRAND/SAFWAY

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO

- ☐ ENTREGA INICIAL ☒ LIMPIEZA REGULAR
☐ DEVOLUCIÓN ☐ LIMPIEZA ADICIONAL
☐ CAMBIO ☐ REPARACIÓN

CLIENTE: Prody Parmanis, S.A. FECHA: 7-5-19
PROYECTO: Maxima Veloz HORA: _____
UBICACIÓN: Buenagente O. C. #: _____
ENCARGADO: _____ TEL.: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|----------|-----------------------------------|----------|---|
| | SENCILLO (CONSTRUCCIÓN), COLOR | | VIP, POLLY JOHN |
| | MAXIN 2000 (CONSTRUCCIÓN) | 3 | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN |
| | ESPECIAL CON FLUSH (CONSTRUCCIÓN) | | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN VOLADO |
| | URINAL | | MAXIN 3000 VIP |
| | HOLDING TANK | | MAXIN 3000 SENCILLO EVENTOS |

OBSERVACIONES: _____

POR ALUMA

NOMBRE (CLIENTE)

FIRMA (CLIENTE)

38283

Aluma SYSTEMS

BY BRAND/SAFWAY

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO

- ☐ ENTREGA INICIAL ☒ LIMPIEZA REGULAR
☐ DEVOLUCIÓN ☐ LIMPIEZA ADICIONAL
☐ CAMBIO ☐ REPARACIÓN

CLIENTE: Prody Parmanis, S.A. FECHA: 14-5-19
PROYECTO: Veloz HORA: _____
UBICACIÓN: Buenagente O. C. #: _____
ENCARGADO: _____ TEL.: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|----------|-----------------------------------|----------|---|
| | SENCILLO (CONSTRUCCIÓN), COLOR | | VIP, POLLY JOHN |
| | MAXIN 2000 (CONSTRUCCIÓN) | 3 | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN |
| | ESPECIAL CON FLUSH (CONSTRUCCIÓN) | | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN VOLADO |
| | URINAL | | MAXIN 3000 VIP |
| | HOLDING TANK | | MAXIN 3000 SENCILLO EVENTOS |

OBSERVACIONES: _____

POR ALUMA

NOMBRE (CLIENTE)

FIRMA (CLIENTE)

38293

Aluma SYSTEMS

BY BRAND/SAFWAY

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ENTREGA INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA REGULAR |
| <input type="checkbox"/> DEVOLUCIÓN | <input type="checkbox"/> LIMPIEZA ADICIONAL |
| <input type="checkbox"/> CAMBIO | <input type="checkbox"/> REPARACIÓN |

CLIENTE: Prody Paramo SA FECHA: 21-5-19

PROYECTO: Urbano HORA: _____

UBICACIÓN: Buenos Aires O. C. #: _____

ENCARGADO: _____ TEL.: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|----------|-----------------------------------|----------|---|
| | SENCILLO (CONSTRUCCIÓN), COLOR | | VIP, POLLY JOHN |
| | MAXIN 2000 (CONSTRUCCIÓN) | 3 | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN |
| | ESPECIAL CON FLUSH (CONSTRUCCIÓN) | | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN VOLADO |
| | URINAL | | MAXIN 3000 VIP |
| | HOLDING TANK | | MAXIN 3000 SENCILLO EVENTOS |

OBSERVACIONES:

D007, REV. 04/10

POR ALUMA

NOMBRE (CLIENTE)

FIRMA (CLIENTE)

39009

Aluma SYSTEMS

BY BRAND/SAFWAY

BOLETA DE MOVIMIENTO Y SERVICIO

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ENTREGA INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA REGULAR |
| <input type="checkbox"/> DEVOLUCIÓN | <input type="checkbox"/> LIMPIEZA ADICIONAL |
| <input type="checkbox"/> CAMBIO | <input type="checkbox"/> REPARACIÓN |

CLIENTE: Prody Paramo SA FECHA: 28-5-19

PROYECTO: Urbano HORA: _____

UBICACIÓN: Buenos Aires O. C. #: _____

ENCARGADO: _____ TEL.: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|----------|-----------------------------------|----------|---|
| | SENCILLO (CONSTRUCCIÓN), COLOR | | VIP, POLLY JOHN |
| | MAXIN 2000 (CONSTRUCCIÓN) | 3 | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN |
| | ESPECIAL CON FLUSH (CONSTRUCCIÓN) | | MAXIN 3000 SENCILLO CONSTRUCCIÓN VOLADO |
| | URINAL | | MAXIN 3000 VIP |
| | HOLDING TANK | | MAXIN 3000 SENCILLO EVENTOS |

OBSERVACIONES:

D007, REV. 04/10

POR ALUMA

NOMBRE (CLIENTE)

FIRMA (CLIENTE)

39008

ANEXO 3.5. ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Confianza de entrega de lentes

[illegible]

Ingeniería Lara, S.A.
Proyecto Marina Village

Contancia de entrega de guantes

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|--------|------------|
| 28 | Melquiades Mendoza | | | | | | | | | | |
| 29 | Milton Núñez | | | | | | | | | | |
| 30 | Nelson Reyes | | | | | | | | | | |
| 31 | Oliver Herrera | | Oliver H. | | | | | | | | |
| 32 | Oscar Trejos | | | | | | | | | | |
| 33 | Ovidio Aguilar | | | | | | | | | | |
| 34 | Pablo Guitierrez | 22/4/19 | por: n. | 2/5/19 | Pablo Guitierrez | 20/5/19 | Pablo Guitierrez | 29/5/19 | Pablo Guitierrez | | |
| 35 | Pedro Jaén | 22/4/19 | por: n. | 2/5/19 | Pedro Jaén | 20/5/19 | Pedro Jaén | 29/5/19 | Pedro Jaén | 3/6/19 | Pedro Jaén |
| 36 | Roberto Gill | | | | | 4/6/19 | Pedro Jaén | | | | |
| 37 | Roberto Perez | 24/4/19 | | 3/5/19 | | 29/5/19 | | | | | |
| 38 | Samuel Lorenzo | 24/4/19 | Samuel Lorenzo | 23/5/19 | Samuel Lorenzo | 30/5/19 | Samuel Lorenzo | | | | |
| 39 | Ulises Rodriguez | | | | | | | | | | |
| 40 | Vidal Bolivar | 4/6/19 | Ulises Rodriguez | | Ulises Rodriguez | 21/5/19 | Ulises Rodriguez | | | | |
| 41 | Wily Rivas | 10/5/19 | Wily Rivas | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------|--------------------|--------|-----------|--|--|---------|--|
| 28 | Melquiades Mendoza | 3/5/19 | Melquiades Mendoza | | | | | | |
| 29 | Milton Núñez | | | | | | | | |
| 30 | Nelson Reyes | 28/5/19 | Nelson Reyes | | | | | | |
| 31 | Oliver Herrera | 15/5/19 | Oliver Herrera | | | | | | |
| 32 | Oscar Trejos | | | | | | | | |
| 33 | Ovidio Aguilar | | | | | | | | |
| 34 | Pablo Gutiérrez | 10/5/19 | Pablo Gutiérrez | | | | | | |
| 35 | Pedro Jaén | | | | | | | | |
| 36 | Roberto Gill | 21/5/19 | Roberto Gill | | | | | | |
| 37 | Roberto Perez | 21/4/19 | Roberto Perez | 3/5/19 | 10/5/2019 | | | 25/5/19 | |
| 38 | Samuel Lorenzo | 23/5/19 | Samuel Lorenzo | | | | | | |
| 39 | Ulises Rodriguez | | Ulises Rodriguez | | | | | | |
| 40 | Vidal Bolivar | | | | | | | | |
| 41 | Wily Rivas | | | | | | | | |




















| EMPRESA: PRODY PANAMA | PROYECTO: MARINA VILLAGE | CHARLA SEMANAL DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| | | FECHA: | 29/07/2019 | | | |
| TEMA: SEGURIDAD GENERAL | | REALIZADO POR: JOSHUA PAEZ | | | | |
| SUPERVISOR / ENCARGADO / CAPATAZ: | | | CUADRILLA DE: | | | |
| ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA SEMANA | EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL A UTILIZAR | | | MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD COLECTIVA NECESARIA | | |
| | EPP | SI | NO | EPC | SI | NO |
| <ul style="list-style-type: none"> - COLGADO SANITARIO - COLGADO DE AGUA POTABLE - COLGADO DE S.C.I - PASES EN LOSA | CASCO DE SEGURIDAD | <input checked="" type="checkbox"/> | | BARANDA DE SEGURIDAD | | |
| | LENTES DE SEGURIDAD | <input checked="" type="checkbox"/> | | PLATAFORMA DE ANDAMIO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | MASCARILLAS | <input checked="" type="checkbox"/> | | ESCALERA DE ACCESO | | |
| | OREJERAS | <input checked="" type="checkbox"/> | | PASAMANOS | | |
| | GUANTES | <input checked="" type="checkbox"/> | | LINEAS DE VIDA | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | BOTAS DE SEGURIDAD/CAUCHO | <input checked="" type="checkbox"/> | | EXTINTOR | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | ARNES DE SEGURIDAD | <input checked="" type="checkbox"/> | | ORDEN Y LIMPIEZA | <input checked="" type="checkbox"/> | |

OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL NECESARIO (MENCIONE):

OTRAS MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD COLECTIVA (MENCIONE):

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA ESTA ACTIVIDAD

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD:

| NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 1.Freddy Gordillo |  | 11. Andrés Perez |  |
| 2.Eduardo Lorenzo |  | 12. Bartolo Santos |  |
| 3.Abdiel Espinoza |  | 13. Davy Gil |  |
| 4.Andres Espinoza |  | 14.Juan Monrroy |  |
| 5.Amilkar Espinoza |  | 15.Edwin Morales |  |
| 6. Roberti Gil |  | 16. Ismael Tejeira |  |
| 7. Eduardo A Lorenzo |  | 17. Gabriel Espinosa |  |
| 8. Elio Gomez |  | 18. Pedro Perez |  |
| 9.Jaime Vargas | | 19.Franklin Espinosa |  |
| 10. Andrés Padilla |  | 20. Kamir Murillo |  |

SYSO

ENCARGADO Ó CAPATAZ CAPATAZ



Equipo
REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

INGENERIO A : CARGO EVIN ARANDA
EMPRESA : COSISA CONSTRUCCIONES
Y SIMILARES S.A

RECIBIDO

| DATOS FUNCIONARIO | | ELEMENTOS DE PROTECCION | RECIBIDO | |
|-------------------|------------|-------------------------|-----------|-------|
| NOMBRE | CEDULA | BOTAS | FECHA | FIRMA |
| JOSHUA MOJICA | 8-806-1428 | Botas / solda, | 13-7-2019 | |
| JUAN SEGUNDO | 2-722-182 | 11 solda, | 13-7-2019 | |
| ROGELIO MACIAS | 8-841-759 | | | |
| ANTONIO GONZALES | 2-728-1265 | | | |
| MARCOS SANCHES | 2-107-85 | | | |
| FRANCO DE LA CRUZ | 2-721-564 | Botas solda, | 13-7-2019 | |
| TROYTHY HURTADO | 9-710-576 | Botas solda, | 13-7-2019 | |
| NOMBRE | CEDULA | CHALECO | FECHA | FIRMA |
| JOSHUA MOJICA | 8-806-1428 | | | |
| JUAN SEGUNDO | 2-722-182 | | | |
| ROGELIO MACIAS | 8-841-759 | | | |
| ANTONIO GONZALES | 2-728-1265 | | | |
| MARCOS SANCHEZ | 2-107-85 | | | |
| FRANCO DE LA CRUZ | 2-721-564 | | | |

15/07/2019 14:40



REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

INGENERIO A : CARGO EVIN ARANDA

EMPRESA : COSISA CONSTRUCCIONES Y
SIMILARES S.A

DATOS FUNCIONARIO

ELEMENTOS DE PROTECCION

RECIBIDO

NOMBRE

CEDULA

PANTALONES

FECHA

FIRMA

JOSHUA MOJICA

8-806-1428

Pantalón

9-7-2017

JUAN SEGUNDO

2-722-182

Pantalón

9-7-19

ROGELIO MACIAS

8-841-759

Pantalón

10/7/19

ANTONIO GONZALES

2-728-1265

Pantalón

10/7/19

MARCOS SANCHES

2-107-85

Pantalón

9-7-19

FRANCO DE LA CRUZ

2-721-564

NOMBRE

CEDULA

LENTES

FECHA

FIRMA

JOSHUA MOJICA

8-806-1428

JUAN SEGUNDO

2-722-182

ROGELIO MACIAS

8-841-759

ANTONIO GONZALES

2-728-1266

MARCOS SANCHEZ

2-107-85

FRANCO DE LA CRUZ

2-721-564

15/07/2019 14:39

ANEXO 3.6. RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN



LIONCIO L. PÉREZ

Celular: 6804-1991

Servicio de Acarreo, Alquiler de Retro
Tanque de Agua y Camión Volquete

FECHA: 18-7-2019

Nº **2893**

OPERADOR: ELIECER AGUILERA

HORA DE ENTRADA: _____ HORA DE SALIDA: _____

EQUIPO: CAMIÓN Volquete

O. INICIAL: _____ O. FINAL: _____

HORA TRAB.: _____ TARIFA POR HORA: _____

PROYECTO: _____

MATERIAL: (☐ TOSCA ☐ PIEDRA ☐ TIERRA ☐ LODO)

PRECIO: B/. 420.00

UBICACIÓN DEL PROYECTO: BUENAVENTURA

OBSERVACIÓN: DEJANDO BASURA

3 VÍAS

ACEPTADO POR: _____

ENCARGADO DE LA OBRA



R.U.C. 9-212-716 D.V. 38

Servicio de Acarreo / Celular: 6804-1991

| | | |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 22 | 07 | 2019 |

CLIENTE: Constructora Qvan S/A

DIRECCIÓN: Buena Ventura

CONDICIONES: ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.U. | TOTAL |
|-------|--|---------------|---------|
| 91 | horas trabajadas los días 8-9-10-11-12-13- 15-16-17-18-19-20 de julio 2019 en alquiler de Petroexcavadora a razón de \$ 30.00 por horas | | 2730 00 |
| 3 | Viajes de Basora | 140.00 % | 420 00 |
| | \$ 3,150.00 | | |
| | L.J. Pérez C. 212-716 | | |
| | | SUB-TOTAL | |
| | | I.T.B.M.S. 7% | |
| | | TOTAL > | 3150 00 |

Recibido Por:

Imp. Montreal: 253-4273 / R.U.C. 320936-001-413125 D.V. 03



LIONCIO L. PÉREZ

Celular: 6804-1991

Servicio de Acarreo, Alquiler de Retro
Tanque de Agua y Camión Volquete

FECHA: 24-7-2019 **Nº 2960**

OPERADOR: GLACER AGUIRRE

HORA DE ENTRADA: _____ HORA DE SALIDA: _____

EQUIPO: CAMIÓN Volquete

O. INICIAL: _____ O. FINAL: _____

HORA TRAB.: _____ TARIFA POR HORA: _____

PROYECTO: Vela mar

MATERIAL: (☐ TOSCA ☐ PIEDRA ☐ TIERRA ☐ LODO)

PRECIO: 560.00

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Buenaventura

OBSERVACIÓN: Volar 7 cajas

DE BASURA (Contratista

de mar azul carton)

para cargar

a mar azul.

ACEPTADO POR: _____

ENCARGADO DE LA OBRA



LIONCIO L. PÉREZ

R.U.C. 9-212-716 D.V. 38

Servicio de Acarreo / Celular: 6804-1991

FACTURA Nº 1804

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 05 | 08 | 2019 |

| | |
|--------------|---|
| CLIENTE: | Constructora Ovan S/A |
| DIRECCIÓN: | Buena Ventura Retro #1 |
| CONDICIONES: | <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> CONTADO |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.U. | TOTAL |
|---------------------------|---|-------|----------|
| 90.50 | horas trabajadas los días 22-23-24-25-26-27-29-30-31 de Julio 2019 y 1-2-3 de Agosto 2019 en Alquiler de Retroexcavadora a razón de B/ 30.00 por hora | | 2,715 00 |
| 4 | Viajes de Basura. | 40.00 | 160 00 |
| B/ 3,275.00 | | | |
| L. L. Pérez 9. 212-716 | | | |
| SUB-TOTAL | | | |
| I.T.B.M.S. 7% | | | |
| TOTAL > | | | 3,275 00 |

Recibido Por:

Imp. Montreal: 253-4273 / R.U.C. 320936-001-413125 D.V. 03



LIONCIO L. PÉREZ

Celular: 6804-1991

Servicio de Acarreo, Alquiler de Retro
Tanque de Agua y Camión Volquete

FECHA: 8/6/2019 N° 2707

OPERADOR: Eliezer Riquelme

HORA DE ENTRADA: _____ HORA DE SALIDA: _____

EQUIPO: Camión Volquete

O. INICIAL: _____ O. FINAL: _____

HORA TRAB.: _____ TARIFA POR HORA: _____

PROYECTO: Ucha mar

MATERIAL: (☐ TOSCA ☐ PIEDRA ☐ TIERRA ☒ LODO)

PRECIO: \$ 280.00

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Buena Ventura

OBSERVACIÓN: 2 viajes de
Basura

ACEPTADO POR: _____

ENCARGADO DE LA OBRA



LIONCIO L. PÉREZ

Celular: 6804-1991

Servicio de Acarreo, Alquiler de Retro
Tanque de Agua y Camión Volquete

FECHA: 30/5/19 N° 2705

OPERADOR: Eliezer Riquelme

HORA DE ENTRADA: _____ HORA DE SALIDA: _____

EQUIPO: Camión Volquete

O. INICIAL: _____ O. FINAL: _____

HORA TRAB.: _____ TARIFA POR HORA: _____

PROYECTO: Ucha mar

MATERIAL: (☐ TOSCA ☐ PIEDRA ☐ TIERRA ☒ LODO)

PRECIO: \$ 560.00

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Buena Ventura

OBSERVACIÓN: Acarreo de Basura
4 Viajes Volquete

ACEPTADO POR: _____

ENCARGADO DE LA OBRA



LIONCIO L. PÉREZ

R.U.C. 9-212-716 D.V. 38

Servicio de Acarreo / Celular: 6804-1991

FACTURA Nº 1585

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 10 | 06 | 2019 |

CLIENTE: Constructora Ovan S/A

DIRECCIÓN: Buena Ventura Reto #1

CONDICIONES: ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.U. | TOTAL |
|---------------------|---|------|----------|
| 90 | horas trabajadas los días 27-28-29-30-31 de mayo 2019 y 1-3-4-5 6-7-8 de junio de 2019 en alquiler de Retroexcavadora a razón de \$30.00 por hora | | 2,700 00 |
| 2 | Viaje de Orana | | 510 00 |
| 1 | Viaje de Piedra | | 220 00 |
| 6 | Viajes de Basura | | 840 00 |
| B/ 4,270.00 | | | |
| L. L. Pérez | | | |
| 9.212.716 | | | |
| SUB-TOTAL | | | |
| I.T.B.M.S. 7% | | | |
| TOTAL > | | | 4,270 00 |
| Recibido Por: _____ | | | |

Imp. Montreal 253-4273 / R.U.C. 320936-001-413125 D.V. 03



R.U.C. 9-212-716 D.V. 38

Servicio de Acarreo / Celular: 6804-1991

| | | |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 08 | 07 | 2019 |

CLIENTE: Constructora Ovan S/A
DIRECCIÓN: P...

DIRECCIÓN: Buena Ventura

CONDICIONES: ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.U. | TOTAL |
|-------|---|---------------|---------|
| ✓ 82 | horas Trabajados los días 24-25-26-27-28 de junio 2019 y 2-3-4-5-6 de julio 2019 en Olsoala & Retroexcavadora a razón de \$ 30.00 por hora. | | 2460 00 |
| ✓ 2 | Viaje de Búsqueda | | 280 00 |
| | \$ 2,740.00 | | |
| | L. J. Peris 9.912.746 | | |
| | | SUB-TOTAL | |
| | | I.T.B.M.S. 7% | |
| | | TOTAL > | 2740 00 |

Recibido Por: _____

Imp. Montreal; 253-4273 / R.U.C. 320936-001 A13125 D.V. 03

Imp. Montreal: 253-4273 / R.U.C. 320936-001-413125 D.V. 03



LIONCIO L. PÉREZ

Celular: 6804-1991

**Servicio de Acarreo, Alquiler de Retro
Tanque de Agua y Camión Volquete**

FECHA: ⁴~~3~~ - 7 - 2019 **Nº 2941**

OPERADOR: Elicer Acuña

HORA DE ENTRADA: _____ HORA DE SALIDA: _____

EQUIPO: Camión Volquete

O. INICIAL: _____ O. FINAL: _____

HORA TRAB.: _____ TARIFA POR HORA: _____

PROYECTO: Uda mal

MATERIAL: (☐ TOSCA ☐ PIEDRA ☐ TIERRA ☐ LODO)

PRECIO: B/ 280.00

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Buenaventura

OBSERVACIÓN: Votar Boscos

2 viajes nulos
de gente de corrección

ACEPTADO POR: _____

ENCARGADO DE LA OBRA

ANEXO 3.7. EVIDENCIA DE FUMIGACIÓN

6. Registro de control de fumigación vigente

MUNICIPIO DE ANTÓN
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN

A QUIEN CONCIERNE:

Yo CARLOS FIDEL ALVARADO HERNANDEZ
Con Cédula No. 814953141440
Residente en: LAS GUIAS ORIENTE, RIO HATO
TEL. 99313477/99312759/603018008

Hago Constar:

Que el día 09 del mes de ABRIL del 2019 fue fumigado
por nuestra empresa denominada FUMI EXPRESS

el establecimiento CONSTRUCTORA AVAN, S.A
corregimiento de RIO HATO

A fin de dar cumplimiento al decreto No. 6 del 24 de mayo de 1996

Antón, 09 del mes de ABRIL de 2019.
AL 09 DE JUNIO DE 2019.

Recibo: _____ No. 9791 firma: [Firma]

MUNICIPIO DE ANTÓN
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN

A QUIEN CONCIERNE:

Yo
Con Cédula No.
Residente en:

RILDO DELGUE
8-222-2224
Dulce

Hago Consto:

Que el día 02 del mes de FEBRERO del 2019 fue fumigado
por nuestra empresa denominada TRABAJO NOVENO

el establecimiento

Playa Blanca

Corregimiento de

Playa Blanca 02/05/2019

A fin de dar cumplimiento al decreto No. 6 del 24 de mayo de 1996

Antón, 02 del mes de

FEBRERO

de 2019

Recibo:

No. 9602

Firma:

[Firma]

14. Fumigación:

Se realiza fumigación de control de plaga correspondiente al trimestre de julio, el 08 de julio de 2019. La misma fue realizada por la empresa Fumi Express y las áreas cubiertas fueron el Campamento de Equitrans, Almacén, depósito, vestidores y alrededor del campamento

MUNICIPIO DE ANTÓN
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN

A QUIEN CONCIERNE:

Yo CARLOS FIDEL ALVARADO HERNANDEZ
Con Cédula No. 8148531440
Residente en: LAS GUIAS ORIENTE, RIO HATO
TEL. 99313477/99312759/603018008

Hago Constar:

Que el día 08 del mes de JULIO del 2019 *Fum fue fumigado*
por nuestra empresa denominada FUMI EXPRESS
el establecimiento EQUITRANS PANAMA CORP.
Corregimiento de RIO HATO

Manejo integrado de plagas
993 3477

A fin de dar cumplimiento al decreto No. 6 del 24 de mayo de 1996

Antón, 08 del mes de JULIO de 2019
AL 08 DE OCTUBRE DE 2019.

Recibo: No. 9957 Firma: *[Firma]*

Evidencias de la fumigación



MUNICIPIO DE ANTON
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN

A QUIEN CONCIERNE

Yo
Con Cédula No.
Residente en:

CARLOS FIDEL ALVARADO HERNANDEZ
8148531440
LAS GUIAS ORIENTE, RIO HATO
TEL. 99313477/99312759/603018008



Hago Constare

Que el día 23 del mes de FEBRERO del 2019 fue fumigado
por nuestra empresa denominada FUMI EXPRESS

el establecimiento INGENIERIA LARA (AREA DE OFICINA Y DEPOSITOS)
Corregimiento de RIO HATO

A fin de dar cumplimiento al decreto No. 6 del 2 de mayo de 1996

Antón, 23 del mes de FEBRERO de 2019

AL 23 DE ABRIL DE 2019

Recibo: No. 9666

Firma:

Fumi Express

Manejo Integrado de Plagas

R.U.C. 8-853-1440 D.V. 98

Las Guías Oriente, Río Hato
cocleyplayas@fumiexpress.net

Tel: 993-3477 / 396-6041
Celular: 6030-8008 / 6980-6016

Constancia de fumigación

N° 1918

Establecimiento: Ingeniería Lora
Dirección: Buena Aventura Río Hato
Fecha: 23/2/2019 Técnico Responsable: Marcos Buitrago
Hora de inicio: _____ Hora de fin: _____
Encargado de Supervisar: Luis Salazar cédula: _____

Tratamiento:

Producto utilizado: lipemolina Dosis: 200 ml por 9 gl
Áreas tratadas: Toda Área Perimetral

Producto utilizado: Bifentrina Dosis: 40 ml por 9 gl
Áreas tratadas: Cocinas, vestidores, busa de 100 l
debajo de contenedores, Área perimetral

Producto utilizado: _____ Dosis: _____
Áreas tratadas: _____

Producto utilizado: _____ Dosis: _____
Áreas tratadas: _____

Trabajo realizado: nebulización, Termonebulización

Recomendaciones o sugerencias: _____

[Firma]
Recibido por

[Firma]
Técnico responsable de
FUMI EXPRESS

ANEXO 3.8 INFORME DE EXPOSICIÓN VIBRACIÓN-RUIDO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Informe de Vibración y Mantenimiento de los Equipos

Ing. Melissa Herrera

12/08/2019

1. Cuadro de Exposición de vibración y ruido generado por las compactadoras en periodos alternados a los trabajadores

| CUADRO DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE VIBRACIÓN Y RUIDO DE LOS TRABAJADORES | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--|
| HERRAMIENTA | CANTIDAD DE PERSONAS | TIEMPO DE EXPOSICION | Total de horas/mes | ACTIVIDAD |
| Compactadores de Impacto (Sapos) | 6 | 3 horas diarias | 72 | Compactación de terrenos de las excavaciones producto de las infra actividades |

2. Cuadro de Mantenimiento de Equipos Amarillos desde Enero- Agosto 2019

| Descripción de Equipo | Marca | Modelo | N de Equipo | Operador | Ultimo Mant. |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| Pala Hidráulica | Caterpillar | 336DL2 | 67 | Obed Ponce | 22-02-19 12-04-19 24-07-2019 |
| Pala Hidráulica | Caterpillar | 318DI | 65 | Luis Herrera | 19-01-10 18-04-19 10-06-19 |
| Pala Brazo Largo | Caterpillar | 220DI | 13 | Juan Pablo | 21-02-19 08-06-19 |
| Retroexcavadora | Caterpillar | 416F | 89 | Dario Arrocha | 21-03-19 11-06-19 |
| Retroexcavadora | Caterpillar | 416F | 84 | Emilio Bonilla | 18-03-19 12-06-19 |
| Retroexcavadora | Caterpillar | 310G | 25 | Edwin Avila | 18-03-19 12-06-19 |
| Retroexcavadora | Caterpillar | 310G | 24 | Augusto Rodríguez | 03-01-19 05-06-19 07-08-19 |

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El registro de horas de uso de equipos amarillos, se debe llevar por medio de horas hombres, registradas en planilla de asistencia, llevadas por el almacenista

Cuadro de Horas hombres Trabajadas 2da bisemana de Julio

| Equipo | Modelo | N de Equipo | Operador | horas | Fecha |
|------------------|--------|-------------|-------------------|-------|--------------------------------|
| Pala Hidráulica | 336DL2 | 67 | Obed Ponce | 90.5 | Del 18 al 31 de julio del 2019 |
| Pala Hidráulica | 318DI | 65 | Luis Herrera | 84 | |
| Pala Brazo Largo | 220DI | 13 | Juan Pablo | 90 | |
| Retroexcavadora | 416F | 89 | Darío Arrocha | 93 | |
| Retroexcavadora | 416F | 84 | Emilio Bonilla | 90 | |
| Retroexcavadora | 310G | 25 | Edwin Avila | 91.4 | |
| Retroexcavadora | 310G | 24 | Augusto Rodríguez | 90 | |

Cuadro de Horas hombres trabajadas en la primera Bisemana- Agosto

| Equipo | Modelo | N de Equipo | Operador | horas | Fecha |
|------------------|--------|-------------|-------------------|-------|---------------------------|
| Pala Hidráulica | 336DL2 | 67 | Obed Ponce | 90 | 31 de julio a Agosto 2019 |
| Pala Hidráulica | 318DI | 65 | Luis Herrera | 90 | |
| Pala Brazo Largo | 220DI | 13 | Juan Pablo | 90 | |
| Retroexcavadora | 416F | 89 | Darío Arrocha | 93 | |
| Retroexcavadora | 416F | 84 | Emilio Bonilla | 90 | |
| Retroexcavadora | 310G | 25 | Edwin Avila | 90 | |
| Retroexcavadora | 310G | 24 | Augusto Rodríguez | 90 | |

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Registros de ajustes realizados por los mecánicos a los equipos amarillos para mantenimiento preventivo y fallas mecánicas. Los mantenimientos son programados cada 350 horas

MANTENIMIENTO

| | |
|--|-------------------------------|
| ATF Diferencial | Liquido Refrigerante |
| ATF Motor | Llantas Traseras y delanteras |
| ATF Caja | Dep de combustible |
| Cambio de filtros de Aire | Liquido refrigerante |
| Cambio de filtro de combustible | Llantas traseras y delanteras |
| Cambio de filtro de Aceite | Engrase |

ANEXO 3.9. EVIDENCIA DE ARBORIZACIÓN

Cliente:
Agro Playa Blanca, S.A.

Proyecto: 2523 - Infraestructura Agro Fase II

Suministro de materiales e Instalación de Sistema de Riego y Paisajismo Calle 5ta. Cot. 656

FECHA DE CREACIÓN: 14/05/2019

COMPañÍA DEL CONTRATO: Agroindustrial Coclesana, S.A.
Coclé
Phone: 61401195

CREADO POR: Angélica Carrión (Mar Azul)
Calle 50, Edificio BMW Plaza, Piso 7, Unit B
Panama City, Panamá 1098

ESTATUS DEL CONTRATO: Aprobado

EJECUTADO: No

FECHA DE INICIO:

FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA:

FECHA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO FIRMADO:

FECHA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO FIRMADO:

DESCRIPCIÓN:
Suministro de materiales e Instalación de Sistema de Riego y Paisajismo Calle 5ta. Cot. 656

INCLUSIONES:

EXCLUSIONES:

ANEXOS:
[Agico_2523_cot.656.pdf](#)

| # | CÓDIGO DE COSTOS | DESCRIPCIÓN | TIPO | MONTO |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 320000-328000 - Irrigación | Sistema de Riego Calle 5ta | Subcontrato | \$ 38,095.85 |
| 2 | 320000-329000 - Paisajismo en General | Paisajismo Calle 5ta | Subcontrato | \$ 26,972.23 |
| Gran Total: | | | | \$ 65,068.08 |

Cliente:

Agroindustrial Coclesana, S.A.
Coclé

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA



AGROINDUSTRIAL COCLESANA, S.A.

RUC. 547805-1-442879 D.V. 58

Galera de Mantenimiento- Buenaventura- Río Hato- Cocle

Cel. 6140-1195 Correo: compras@agico.com.pa

2513
Paisajismo 26,972.23
Riego 38,095.85
65,068.08

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 30 | 5 | 2019 |

Cot. 656

Cliente: Agro Playa Blanca
Dirección: Buenaventura, Río Hato, Cocle.
Cel.
Email:

Proyecto: Calle 5ta

| Descripción | Cantidad | Precio unitario/ Riego Istmo | Total |
|---|----------|---------------------------------|-----------|
| Tubo de 6", SDR21, C/E | 160 | 87.82 | 14,051.52 |
| Tubo de 4", SDR21, C/E | 2 | 41.77 | 83.54 |
| Tubo de 3" SDR21, C/E | 30 | 27.44 | 823.10 |
| Tubo de 2" SDR26, C/E | 100 | 8.17 | 816.90 |
| Tubo de 1 1/2" SDR26, C/E | 120 | 5.76 | 691.74 |
| Tubo de 1" SDR26, C/C | 86 | 2.96 | 254.65 |
| Codo metalico de 6x11 con junta mecanica | 12 | 85.31 | 1,023.75 |
| Codo metalico de 6 x 22 con junta mecanica | 2 | 78.75 | 157.50 |
| Codo metalico de 6 x 45 con junta mecanica | 6 | 82.69 | 496.13 |
| Codo metalico de 6 x 90 con junta mecanica | | 177.19 | - |
| Codo metalico de 4 x 45 con junta mecanica | 2 | 52.50 | 105.00 |
| Codo de 2" x 90, SCH40 | 25 | 0.86 | 21.53 |
| Codo de 2" x 45, SCH40 | 10 | 0.89 | 8.93 |
| Codo de 1- 1/2" x 90, SCH40 | 50 | 0.60 | 29.93 |
| Codo de 1- 1/2" x 45, SCH40 | 20 | 0.63 | 12.60 |
| Codo de 1" x 90, SCH40 | 25 | 0.34 | 8.40 |
| Codo de 1" x 45, SCH40 | 10 | 0.34 | 3.36 |
| Te metalico de 6"*6"*6", con junta metalica | 7 | 229.69 | 1,607.81 |
| Te de 2", SCH40 | 30 | 1.28 | 38.43 |
| Te de 1-1/2, SCH40 | 100 | 0.81 | 80.85 |
| Te de 1", SCH40 | 80 | 0.39 | 31.08 |
| Reduccion metalica 6" x 4" con junta metalica | 2 | 262.50 | 525.00 |
| Reduccion metalica 6" x 3" con junta metalica | 2 | 229.69 | 459.38 |
| Reduccion de 2" x 1-1/2", SCH40 | 20 | 0.53 | 10.50 |
| Reducción de 1-1/2" x 1" SCH40 | 15 | 0.41 | 6.14 |
| Reducción de 1-1/2" x 1/2", c/r SCH40 | 100 | 1.58 | 157.50 |
| Reducción de 1" x 1/2, c/r, SCH40 | 75 | 0.61 | 45.68 |
| Collarin metalico de 6" x 2" | 18 | 59.06 | 1,063.13 |
| Adapter macho de 2", SCH40 | 36 | 0.61 | 21.92 |
| Adapter macho de 1-1/2", SCH40 | 10 | 0.47 | 4.73 |
| Adapter macho de 4", SCH40 | 4 | 3.29 | 13.15 |
| Aspesores PopUp, 3504 Rain Bird | 170 | 16.28 | 2,766.75 |
| Swing Joint 1/2" | 170 | 3.36 | 571.20 |
| Valvula hierro 6", c/cuadrante y junta mecanica | 10 | 551.25 | 5,512.50 |

Handwritten signature

| | | | |
|---|------|--------|-----------|
| Valvula de compuerta de bronce de 4" | 2 | 172.08 | 344.17 |
| Valvula de compuerta de bronce de 2" | 18 | 37.36 | 672.46 |
| Valvula de compuerta de bronce de 1-1/2" | 10 | 24.55 | 245.49 |
| Valvula de aire, de doble proposito | 4 | 72.19 | 288.75 |
| Cubre valvula de 6", para valvula euadrante | 45 | 9.85 | 443.21 |
| Cubre valvula de 10", para valvula mediana | 10 | 15.75 | 157.50 |
| Lubricante para tuberia c/empaque (gal) | 6 | 20.65 | 123.92 |
| Hoja de segueta | 20 | 1.49 | 29.82 |
| Teflon 3/4, Rollo | 15 | 0.66 | 9.92 |
| Pegamento PVC azul, (caja de pintas) | 2 | 152.78 | 305.55 |
| Niple galvanizado 2" x 1m, roscado | 18 | 65.63 | 1,181.25 |
| Codo galvanizado 2"x 90 | 18 | 6.56 | 118.13 |
| Tapón liso de 6" hembra | 2 | 5.91 | 11.82 |
| Unión de reparación de 6" | 3 | 32.94 | 98.82 |
| Unión de reparación de 4" | 3 | 22.84 | 68.51 |
| Bolsas de Cemento | 30 | 9.98 | 299.40 |
| Piedras (yda³) | 15 | 29.40 | 441.00 |
| Mano de Obra | 2000 | 3.50 | 7,000.00 |
| Maquinaria (Zanjeadora) | 250 | 30.00 | 7,500.00 |
| Arbol de Caoba Instalado | 90 | 118.50 | 10,665.00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Sub-total | 61,509.00 |
| Exento | 10,665.00 |
| ITBMS | 3,559.08 |
| Total a cobrar | 65,068.08 |

Aprobado por:





AGROINDUSTRIAL COCLESANA, S.A.

RUC. 547805-1-442879 D.V. 58

Galera de Mantenimiento- Buenaventura- Río Hato- Coclé

Cel. 6140-1195 Correo: compras@agico.com.pa

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 30 | 5 | 2019 |

Cot. 656

Cliente: Agro Playa Blanca
Dirección: Buenaventura, Río Hato, Coclé.
Cel.
Email:

Proyecto: Calle 5ta

| Descripción | Cantidad | Precio unitario/ Riego Istmo | Total |
|---|----------|---------------------------------|-----------|
| Tubo de 6", SDR21, C/E | 160 | 87.82 | 14,051.52 |
| Tubo de 4", SDR21, C/E | 2 | 41.77 | 83.54 |
| Tubo de 3" SDR21, C/E | 30 | 27.44 | 823.10 |
| Tubo de 2" SDR26, C/E | 100 | 8.17 | 816.90 |
| Tubo de 1 1/2" SDR26, C/E | 120 | 5.76 | 691.74 |
| Tubo de 1" SDR26, C/C | 86 | 2.96 | 254.65 |
| Codo metalico de 6x11 con junta mecanica | 12 | 85.31 | 1,023.75 |
| Codo metalico de 6 x 22 con junta mecanica | 2 | 78.75 | 157.50 |
| Codo metalico de 6 x 45 con junta mecanica | 6 | 82.69 | 496.13 |
| Codo metalico de 6 x 90 con junta mecanica | | 177.19 | - |
| Codo metalico de 4 x 45 con junta mecanica | 2 | 52.50 | 105.00 |
| Codo de 2" x 90, SCH40 | 25 | 0.86 | 21.53 |
| Codo de 2" x 45, SCH40 | 10 | 0.89 | 8.93 |
| Codo de 1- 1/2" x 90, SCH40 | 50 | 0.60 | 29.93 |
| Codo de 1- 1/2" x 45, SCH40 | 20 | 0.63 | 12.60 |
| Codo de 1" x 90, SCH40 | 25 | 0.34 | 8.40 |
| Codo de 1" x 45, SCH40 | 10 | 0.34 | 3.36 |
| Te metalico de 6"x6"x6", con junta metalica | 7 | 229.69 | 1,607.81 |
| Te de 2", SCH40 | 30 | 1.28 | 38.43 |
| Te de 1-1/2, SCH40 | 100 | 0.81 | 80.85 |
| Te de 1", SCH40 | 80 | 0.39 | 31.08 |
| Reduccion metalica 6" x 4" con junta metalica | 2 | 262.50 | 525.00 |
| Reduccion metalica 6" x 3" con junta metalica | 2 | 229.69 | 459.38 |
| Reduccion de 2" x 1-1/2", SCH40 | 20 | 0.53 | 10.50 |
| Reducción de 1-1/2" x 1" SCH40 | 15 | 0.41 | 6.14 |
| Reducción de 1-1/2" x 1/2", c/r SCH40 | 100 | 1.58 | 157.50 |
| Reducción de 1" x 1/2, c/r, SCH40 | 75 | 0.61 | 45.68 |
| Collarin metalico de 6" x 2" | 18 | 59.06 | 1,063.13 |
| Adapter macho de 2", SCH40 | 36 | 0.61 | 21.92 |
| Adapter macho de 1-1/2", SCH40 | 10 | 0.47 | 4.73 |
| Adapter macho de 4", SCH40 | 4 | 3.29 | 13.15 |
| Aspesores PopUp, 3504 Rain Bird | 170 | 16.28 | 2,766.75 |
| Swing Joint 1/2" | 170 | 3.36 | 571.20 |
| Valvula hierro 6", c/cuadrante y junta mecanica | 10 | 551.25 | 5,512.50 |

20

| | | | |
|---|----|--------|----------|
| Valvula de compuerta de bronce de 4" | 2 | 172.08 | 344.17 |
| Valvula de compuerta de bronce de 2" | 18 | 37.36 | 672.46 |
| Valvula de compuerta de bronce de 1-1/2" | 10 | 24.55 | 245.49 |
| Valvula de aire, de doble proposito | 4 | 72.19 | 288.75 |
| Cubre valvula de 6", para valvula cuadrante | 45 | 9.85 | 443.21 |
| Cubre valvula de 10", para valvula mediana | 10 | 15.75 | 157.50 |
| Lubricante para tubería e/empaque (gal) | 6 | 20.65 | 123.92 |
| Hoja de segueta | 20 | 1.49 | 29.82 |
| Teflon 3/4, Rollo | 15 | 0.66 | 9.92 |
| Pegamento PVC azul, (caja de pintas) | 2 | 152.78 | 305.55 |
| Niple galvanizado 2" x 1m, roscado | 18 | 65.63 | 1,181.25 |
| Codo galvanizado 2"x 90 | 18 | 6.56 | 118.13 |
| Tapón liso de 6" hembra | 2 | 5.91 | 11.82 |
| Unión de reparación de 6" | 3 | 32.94 | 98.82 |
| Unión de reparación de 4" | 3 | 22.84 | 68.51 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Sub-total | 35,603.60 |
| Exento | |
| ITBMS | 2,492.25 |
| Total a cobrar | 38,095.85 |

Aprobado por:

Cliente:
Agro Playa Blanca, S.A.

Proyecto: 2524 - Infraestructura Marina Village
Buenaventura
Coclé

Suministro de materiales e Instalación de Sistema de Riego y Paisajismo de Calle 5ta A y Torres 100-400. Cot.657

FECHA DE CREACIÓN: 14/05/2019

COMPañÍA DEL CONTRATO: Agroindustrial Coclesana, S.A. **CREADO POR:** Angélica Carrión (Mar Azul)
Coclé Calle 50, Edificio BMW Plaza, Piso
Phone: 61401195 7, Unit B
Panama City, Panamá 1098

ESTATUS DEL CONTRATO: Aprobado **EJECUTADO:** No

FECHA DE INICIO: **FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA:**

FECHA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO FIRMADO: **FECHA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO FIRMADO:**

DESCRIPCIÓN:
Suministro de materiales e Instalación de Sistema de Riego y Paisajismo de Calle 5ta A y Torres 100-400. Cot.657

INCLUSIONES:

EXCLUSIONES:

ANEXOS:
Agico_2524_0001_SR.pdf

| # | CÓDIGO DE COSTOS | DESCRIPCIÓN | TIPO | MONTO |
|-------------|---------------------------------------|--|-------------|---------------|
| 1 | 320000-328000 - Irrigación | Suministro de materiales e Instalación de Sistema de Riego de Calle 5ta A y Torres 100-400 | Subcontrato | \$ 49,141.79 |
| 2 | 320000-329000 - Paisajismo en General | Paisajismo de Calle 5ta A y Torres 100-400 | Subcontrato | \$ 148,975.14 |
| Gran Total: | | | | \$ 198,116.93 |

Cliente:

Agroindustrial Coclesana, S.A.
Coclé

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA



AGROINDUSTRIAL COCLESANA, S.A.

RUC. 547805-1-442879 D.V. 58

Galera de Mantenimiento- Buenaventura- Río Hato- Coclé

Cel. 6140-1195 Correo: compras@agico.com.pa

2524
Paisajismo 148,975.15
Riego 49,141.79
198,116.93

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 30 | 5 | 2019 |

Cot. 657

Cliente: Agro Playa Blanca
Dirección: Buenaventura, Río Hato, Coclé.
Cel.
Email:

Proyecto: Calle 5ta A y Marina Village (Torres 100 - 400)

| Descripción | Cantidad | Precio unitario/ Riego Istmo | Total |
|---|----------|---------------------------------|-----------|
| Tubo de 6", SDR21, C/E | 200 | 87.82 | 17,564.40 |
| Tubo de 4", SDR21, C/E | 4 | 41.77 | 167.08 |
| Tubo de 2" SDR26, C/C | 60 | 8.17 | 490.14 |
| Tubo de 1 1/2" SDR26, C/C | 145 | 5.76 | 835.85 |
| Tubo de 1" SDR26, C/C | 80 | 2.96 | 236.88 |
| Codo metalico de 6x11 con junta mecanica | 7 | 85.31 | 597.19 |
| Codo metalico de 6 x 22 con junta mecanica | 7 | 78.75 | 551.25 |
| Codo metalico de 6 x 45 con junta mecanica | 6 | 82.69 | 496.13 |
| Codo metalico de 6 x 90 con junta mecanica | 4 | 177.19 | 708.75 |
| Codo metalico de 6 x 45 con junta mecanica | 6 | 85.31 | 511.88 |
| Codo de 2" x 90, SCH40 | 45 | 0.86 | 38.75 |
| Codo de 2" x 45, SCH40 | 10 | 0.89 | 8.93 |
| Codo de 1- 1/2" x 90, SCH40 | 25 | 0.60 | 14.96 |
| Codo de 1- 1/2" x 45, SCH40 | 15 | 0.63 | 9.45 |
| Codo de 1" x 90, SCH40 | 25 | 0.34 | 8.40 |
| Codo de 1" x 45, SCH40 | 10 | 0.34 | 3.36 |
| Te metalico de 6"*6"*6", con junta metalica | 5 | 229.69 | 1,148.44 |
| Te de 2", SCH40 | 20 | 1.28 | 25.62 |
| Te de 1-1/2, SCH40 | 80 | 0.81 | 64.68 |
| Te de 1", SCH40 | 65 | 0.39 | 25.25 |
| Reduccion metalica 6" x 4" con junta metalica | 6 | 255.94 | 1,535.63 |
| Reduccion de 2" x 1-1/2", SCH40 | 18 | 0.53 | 9.45 |
| Reducción de 1-1/2" x 1" SCH40 | 18 | 0.41 | 7.37 |
| Reducción de 1-1/2" x 1/2", c/r SCH40 | 80 | 1.58 | 126.00 |
| Reducción de 1" x 1/2, c/r, SCH40 | 65 | 0.61 | 39.59 |
| Collarin metalico de 6" x 2" | 59 | 59.06 | 3,484.69 |
| Adapter macho de 2", SCH40 | 60 | 0.61 | 36.54 |
| Adapter macho de 1-1/2", SCH40 | 30 | 0.47 | 14.18 |
| Adapter macho de 4", SCH40 | 6 | 3.29 | 19.72 |
| Aspesores PopUp, 3504 Rain Bird | 200 | 16.28 | 3,255.00 |
| Swing Joint 1/2" | 200 | 3.36 | 672.00 |
| Valvula hierro 6", c/cuadrante y junta mecanica | 6 | 551.25 | 3,307.50 |
| Valvula de compuerta de bronce de 4" | 2 | 172.08 | 344.17 |
| Valvula de compuerta de bronce de 2" | 50 | 37.36 | 1,867.95 |

| | | | |
|---|------|-----------|-----------|
| Valvula de compuerta de bronce de 1-1/2" | 15 | 24.55 | 368.24 |
| Valvula de aire, de doble proposito | 9 | 72.19 | 649.69 |
| Cubre valvula de 6", para valvula cuadrante | 36 | 9.85 | 354.56 |
| Cubre valvula de 10", para valvula mediana | 65 | 15.75 | 1,023.75 |
| Lubricante para tuberia e/empaque (gal) | 8 | 20.65 | 165.23 |
| Hoja de segueta | 25 | 1.49 | 37.28 |
| Teflon 3/4, Rollo | 200 | 0.66 | 132.30 |
| Pegamento PVC azul, (caja de pintas) | 3 | 152.78 | 458.33 |
| Niple galvanizado 2" x 1m, roscado | 60 | 65.63 | 3,937.50 |
| Codo galvanizado 2"x 90 | 60 | 6.56 | 393.75 |
| Tapón liso de 6" hembra | 2 | 5.91 | 11.82 |
| Unión de reparación de 6" | 3 | 32.94 | 98.82 |
| Unión de reparación de 4" | 3 | 22.84 | 68.51 |
| Mano de Obra (Calle 5A) | 1500 | 3.50 | 5,250.00 |
| Mano de Obra (Torre 100 - 400) | 1875 | 3.50 | 6,562.50 |
| Paisajismo | 1 | 96,328.77 | 96,328.77 |
| Maquinaria (Zanjeadora) | 70 | 30.00 | 2,100.00 |
| Gramina (Marina Village) | 1 | 33,660.00 | 33,660.00 |
| Sustrato para Suelo (Marina Village) | 1000 | 4.10 | 4,100.00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Sub-total | 193,928.18 |
| Exento | 134,088.77 |
| ITBMS | 4,188.76 |
| Total a cobrar | 198,116.93 |

Aprobado por:



AGROINDUSTRIAL COCLESANA, S.A.

RUC. 547805-1-442879 D.V. 58

Galera de Mantenimiento- Buenaventura- Río Hato- Coclé

Cel. 6140-1195 Correo: compras@agico.com.pa

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 30 | 5 | 2019 |

Cot. 657

Cliente: Agro Playa Blanca
Dirección: Buenaventura, Río Hato, Coclé.
Cel.
Email:

Proyecto: Calle 5ta A y Marina Village (Torres 100 - 400)

| Descripción | Cantidad | Precio unitario/ Riego Istmo | Total |
|---|----------|---------------------------------|-----------|
| Tubo de 6", SDR21, C/E | 200 | 87.82 | 17,564.40 |
| Tubo de 4", SDR21, C/E | 4 | 41.77 | 167.08 |
| Tubo de 2" SDR26, C/C | 60 | 8.17 | 490.14 |
| Tubo de 1 1/2" SDR26, C/C | 145 | 5.76 | 835.85 |
| Tubo de 1" SDR26, C/C | 80 | 2.96 | 236.88 |
| Codo metalico de 6x11 con junta mecanica | 7 | 85.31 | 597.19 |
| Codo metalico de 6 x 22 con junta mecanica | 7 | 78.75 | 551.25 |
| Codo metalico de 6 x 45 con junta mecanica | 6 | 82.69 | 496.13 |
| Codo metalico de 6 x 90 con junta mecanica | 4 | 177.19 | 708.75 |
| Codo metalico de 6 x 45 con junta mecanica | 6 | 85.31 | 511.88 |
| Codo de 2" x 90, SCH40 | 45 | 0.86 | 38.75 |
| Codo de 2" x 45, SCH40 | 10 | 0.89 | 8.93 |
| Codo de 1- 1/2" x 90, SCH40 | 25 | 0.60 | 14.96 |
| Codo de 1- 1/2" x 45, SCH40 | 15 | 0.63 | 9.45 |
| Codo de 1" x 90, SCH40 | 25 | 0.34 | 8.40 |
| Codo de 1" x 45, SCH40 | 10 | 0.34 | 3.36 |
| Te metalico de 6"x6"x6", con junta metalica | 5 | 229.69 | 1,148.44 |
| Te de 2", SCH40 | 20 | 1.28 | 25.62 |
| Te de 1-1/2, SCH40 | 80 | 0.81 | 64.68 |
| Te de 1", SCH40 | 65 | 0.39 | 25.25 |
| Reduccion metalica 6" x 4" con junta metalica | 6 | 255.94 | 1,535.63 |
| Reduccion de 2" x 1-1/2", SCH40 | 18 | 0.53 | 9.45 |
| Reducción de 1-1/2" x 1" SCH40 | 18 | 0.41 | 7.37 |
| Reducción de 1-1/2" x 1/2", c/r SCH40 | 80 | 1.58 | 126.00 |
| Reducción de 1" x 1/2, c/r, SCH40 | 65 | 0.61 | 39.59 |
| Collarin metalico de 6" x 2" | 59 | 59.06 | 3,484.69 |
| Adapter macho de 2", SCH40 | 60 | 0.61 | 36.54 |
| Adapter macho de 1-1/2", SCH40 | 30 | 0.47 | 14.18 |
| Adapter macho de 4", SCH40 | 6 | 3.29 | 19.72 |
| Aspesores PopUp, 3504 Rain Bird | 200 | 16.28 | 3,255.00 |
| Swing Joint 1/2" | 200 | 3.36 | 672.00 |
| Valvula hierro 6", c/cuadrante y junta mecanica | 6 | 551.25 | 3,307.50 |
| Valvula de compuerta de bronce de 4" | 2 | 172.08 | 344.17 |
| Valvula de compuerta de bronce de 2" | 50 | 37.36 | 1,867.95 |

| | | | |
|---|-----|--------|----------|
| Valvula de compuerta de bronce de 1-1/2" | 15 | 24.55 | 368.24 |
| Valvula de aire, de doble proposito | 9 | 72.19 | 649.69 |
| Cubre valvula de 6", para valvula cuadrante | 36 | 9.85 | 354.56 |
| Cubre valvula de 10", para valvula mediana | 65 | 15.75 | 1,023.75 |
| Lubricante para tuberia c/empaque (gal) | 8 | 20.65 | 165.23 |
| Hoja de segueta | 25 | 1.49 | 37.28 |
| Teflon 3/4, Rollo | 200 | 0.66 | 132.30 |
| Pegamento PVC azul, (caja de pintas) | 3 | 152.78 | 458.33 |
| Niple galvanizado 2" x 1m, roscado | 60 | 65.63 | 3,937.50 |
| Codo galvanizado 2"x 90 | 60 | 6.56 | 393.75 |
| Tapón liso de 6" hembra | 2 | 5.91 | 11.82 |
| Unión de reparación de 6" | 3 | 32.94 | 98.82 |
| Unión de reparación de 4" | 3 | 22.84 | 68.51 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Sub-total | 45,926.91 |
| Exento | |
| ITBMS | 3,214.88 |
| Total a cobrar | 49,141.79 |

Aprobado por:



ANEXO 3.10. FUERZA LABORAL Y PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

| | |
|--|------------|
| FUERZA LABORAL: VELAMAR | 55 |
| FUERZA LABORAL: MARINA VILLAGE | 119 |
| FUERZA LABORAL: INFRAESTRUCTURA | 46 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| AVANCE DE OBRA MARINA VILLAGE | 65% |
| AVANCE DE OBRA VELAMAR | 55% |
| AVANCE DE OBRA INFRAESTRUCT. | 85% |

**ANEXO 3.11. ACUSE DE ENTREGA ANTE MINISTERIO DE AMBIENTE DEL QUINTO INFORME DE
SEGUIMIENTO**




SC-CER139957



Panamá, 26 de marzo de 2019
CODESA GG-042-2019

Ingeniera
Iris Barrios
Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental
Ministerio de Ambiente
E. S. D.



Respetada Ing. Barrios:

La presente es para hacerle entrega formal del Quinto Informe de Seguimiento a la aplicación y eficiencia de las medidas de prevención y mitigación del proyecto "Agro Playa Blanca Fase II", ubicado en el sector de Buenaventura, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé; de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III y en la Resolución DIEORA-IA-132-16.

Adjunto encontrará lo siguiente:

- Un (1) original y tres (3) CD'S del Informe de Seguimiento.

Agradeciendo la atención prestada, se despide de usted,

Cordialmente,

Karina Guillén
Gerente General

Quinto Informe de Seguimiento sobre la Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación
del Plan de Manejo Ambiental y la Resolución DIEORA-IA-132-16

Proyecto
"Agro Playa Blanca Fase II"

Sector de Buenaventura, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé

Preparado para:
Agro Playa Blanca, S.A.

Elaborado por:
CODESA
CORPORACION DE DESARROLLO AMBIENTAL, S.A.




N° SC-CER139957



MINISTERIO DE
AMBIENTE
DIPROCA - SEDE CENTRAL

Recibido Por: *[Signature]*
Fecha: *24/12/19*
Hora: *1:57*
Número de Control: _____

Agosto, 2018 – Enero, 2019

| | | | |
|--|--|---|--|
|  CORPORACION DE DESARROLLO AMBIENTAL, S.A. | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| | <i>[Signature]</i> Responsable Ivette Herrera DIPROCA-AA-035-2016/ Act. 2018 | <i>[Signature]</i> Control de Calidad Roy Quintero DIPROCA-AA-031-2013/ Act. 2017 | <i>[Signature]</i> Gerencia Karina Guillén |
| Idoneidad DIVEDA-003-2012/ Act. 2018 | | | |

**ANEXO 3.12. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN AI ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL, CATEGORIA III DEL PROYECTO AGRO PLAYA BLANCA FASE II**

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE AMBIENTE
RESOLUCIÓN DE IA IA-M-015-2019
De 10 de mayo de 2019.

Por la cual se aprueba la solicitud de modificación al Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, del proyecto, denominado **AGRO PLAYA BLANCA FASE II**, cuyo promotor es la sociedad **AGRO PLAYA BLANCA S.A.**

El suscrito Ministro de Ambiente, en uso de sus facultades legales, y

C O N S I D E R A N D O:

Que el día 13 de septiembre de 2018, la sociedad **AGRO PLAYA BLANCA S.A.**, persona jurídica inscrita en el Registro Público, a folio 571050, a través de su Apoderada Especial, la señora **AIXA NORIEGA**, con cédula de identidad personal No. 8-424-959, presentó ante el Ministerio de Ambiente, la solicitud de modificación al Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, del proyecto denominado **AGRO PLAYA BLANCA FASE II**, aprobado mediante Resolución **DIEORA IA-132-16**, del 04 de agosto de 2016.

Que mediante Resolución **DIEORA IA-132-16**, del 04 de agosto de 2016, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, correspondiente al proyecto denominado **AGRO PLAYA BLANCA FASE II**, promovido por la sociedad **AGRO PLAYA BLANCA S.A.**, el cual consiste en el desarrollo de un complejo residencial turístico sobre el litoral Pacífico, con el objetivo de contribuir al desarrollo de esta región del país. Contará con los siguientes componentes: 11 lotes para uso residencial, 24 residencias unifamiliares tipo villa, 30 residencias unifamiliares adosadas, 64 apartamentos de mediana densidad, 98 apartamentos de alta densidad, 234 residencias marina village, club de playa residencial con piscina, bar y restaurante, zonas verdes, caminos, y veredas, hotel con 614 habitaciones con facilidades como restaurantes y bares, spa, gimnasio, guardería y locales comerciales, marina con facilidades como; zona de arribo, apartamentos, estación de servicio de combustible, plaza con locales comerciales para venta de productos y servicios ligados a actividades náuticas, muelle para embarcaciones para los residentes, huéspedes y otros usuarios, planta de tratamiento de aguas residuales, así como el resto de infraestructuras necesarias, como calles de acceso, acueducto, alcantarillado y todos los servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones, internet, cable, tv y otros. En una superficie de 24 ha + 5110.48 m² aproximadamente (foja 484 a la 490 del expediente administrativo correspondiente).

Que la referida solicitud de modificación presentada consiste en realizar ajustes al diseño del proyecto al excluir del EsIA, el desvío de la quebrada Aguas Blancas (Aguas Claras), así como los impactos y medidas de mitigación propuestas para la ejecución del mismo; y se instalará una tubería pluvial, paralelamente al borde Este y canal a la entrada de la marina (foja 491 del expediente administrativo correspondiente).

En consecuencia, a lo anterior, la solicitud de modificación al Estudio de Impacto Ambiental, consiste en excluir del EsIA aprobado, mediante Resolución **DIEORA IA-132-16**, del 04 de agosto de 2016, el desvío de la quebrada Aguas Blancas (Aguas Claras), el cual se efectuará aguas arriba de la obra propuesta, como parte de las actividades relacionadas al proyecto, Categoría II, denominado "Agro Playa Blanca, S.A.", aprobado mediante resolución **DIEORA-IA-129-2013** de 18 de julio de 2013, para el cual se ingresó al mismo tiempo solicitud de modificación al EsIA.

Siendo así, para la construcción de la marina, no será necesario el desvío de la quebrada Aguas Blancas, sin embargo, se instalará una tubería pluvial cuyo diámetro oscila entre 600 mm @ 1 500 mm y colocará paralelamente al borde Este y canal a la entrada de la marina (f. 529 del Exp.) y la tubería pluvial (1) tendrá una longitud de **273.057 m** y pluvial 2 con una longitud de **243. 48 m** aproximadamente; ambas dentro del polígono aprobado (f. 745 del Exp.).

Tabla de coordenadas UTM WGS84 del alineamiento de la tubería pluvial



| Pluvial 1 | Coordenadas | |
|------------------------------|-------------|-----------|
| | X | Y |
| Punto de descarga a Río Hato | 592101.23 | 921979.17 |
| 1 | 592119.94 | 922034.25 |
| 2 | 592133.06 | 922065.04 |
| 3 | 592158.00 | 922065.34 |
| 4 | 592203.83 | 922073.41 |
| 5 | 592222.71 | 922080.47 |
| 6 | 592251.51 | 922097.19 |
| 7 | 592284.09 | 922120.12 |
| Hacia ramales pluviales | 592297.05 | 922130.56 |
| Pluvial 2 | Coordenadas | |
| | X | Y |
| Punto de descarga a Río Hato | 592106.31 | 921977.45 |
| 1 | 592118.54 | 922009.87 |
| 2 | 592151.36 | 922020.13 |
| 3 | 592189.00 | 922028.11 |
| 4 | 592221.80 | 922034.81 |
| 5 | 592221.65 | 922032.11 |
| 6 | 592227.05 | 922027.01 |
| 7 | 592228.16 | 922024.55 |
| 8 | 592246.19 | 922033.64 |
| 9 | 592279.00 | 922049.23 |
| Hacia ramales pluviales | 592307.76 | 922065.71 |

Que en cuanto al Plan de Manejo Ambiental, de igual forma se excluyen del Estudio de Impacto Ambiental, todos los componentes, impactos y medidas de mitigación, relacionados al desvío de la quebrada Aguas Blancas (Aguas Claras), citados en el EsIA aprobado (f. 526 del Exp.).

Que en respuesta a la nota de consulta **DEIA-DEEIA-NC-0257-2609-18**, recibida el 31 de octubre del presente año (f. 729 del Exp.), el promotor presenta en la siguiente tabla los impactos específicos, que se eliminan del Plan de Manejo Ambiental:

Impactos Ambientales presentados en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado y que serán eliminados por la Modificación a realizar



| Medio | Efecto | Impactos potenciales identificados y establecidos en el EsIA aprobado a eliminar. |
|-----------------------------|--|---|
| FASE DE CONSTRUCCIÓN | | |
| Físico | Dragado, adecuación de la marina y desvío de la quebrada Aguas Blancas (Aguas Claras). | Transformación de la desembocadura de la quebrada Aguas Blancas (Aguas Claras). |
| Biológico | Modificación de la desembocadura de la quebrada Aguas Blancas (Aguas Claras). | Disminución de hábitat. |
| | | Corta de árboles de mangle. |
| | Desvío de la quebrada Aguas Blancas (Aguas Claras). | Disminución de hábitat. |
| | | Corta de árboles de mangle. |
| | | Desplazamiento de fauna. |
| | | Eliminación del ecosistema existente en la desembocadura de la quebrada Aguas Blancas (Aguas Claras). |

Medidas de mitigación a eliminar del Plan de Manejo Ambiental del EsIA aprobado

| Impacto | Medidas de mitigación del EsIA aprobado a eliminar. |
|---|--|
| | Realizar aporte técnico o apoyo en insumos, para el desarrollo de la Alianza por el Millón de Hectáreas. |
| Corta de árboles de mangle | Elaborar y ejecutar un Plan de Rescate y Reubicación, de los propágulos de mangle y juveniles, que se encuentran en el área a ser intervenida. |
| Desplazamiento de fauna | Elaborar y ejecutar un Plan de Rescate y Reubicación de fauna acuática; cuando se realice el desvío de la quebrada. |
| Eliminación del ecosistema existente en la desembocadura de la quebrada Aguas Blancas (aguas Claras). | Restaurar el ecosistema existente aguas arriba del proyecto, con la plantación y seguimiento de 1 ha de plantones de mangle en las riberas del Río Hato. |

Que mediante nota **DEIA-DEEIA-NC-0257-2609-18**, de 26 de septiembre de 2018, se solicitó al promotor presentar las coordenadas con su respectivo DATUM del alineamiento pluvial e indicar los impactos y medidas de mitigación que serán excluidos del EsIA aprobado, con la solicitud de modificación propuesta (foja 721 del expediente administrativo correspondiente).

Que mediante **MEMORANDO-DEIA-0789-1710-18**, de 17 de octubre de 2018, se solicitó a la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (**DIVEDA**), indicar si el Estudio de Impacto Ambiental, se encuentra vigente, para dar continuidad con el trámite de modificación (foja 723 del expediente administrativo correspondiente). Que mediante **MEMORANDO-DIVEDA-DCVCA-220-2018**, recibido el 29 de octubre de 2018, **DIVEDA**, señala que mediante Informe Técnico N° 082-2018, de inspección de oficio al proyecto, el día 2 de agosto de 2018, la Dirección Regional de Coclé, observó el desarrollo de la obra civil con un avance del 5% de lo propuesto, por lo que la Resolución **DIEORA IA-132-16**, por lo que se encuentra vigente (foja 724 del expediente administrativo correspondiente).

Re

Que mediante nota **sin número**, recibida el 31 de octubre de 2018, el promotor hace entrega de la información complementaria solicitada mediante nota **DEIA-DEEIA-NC-0257-2609-18**, de 26 de octubre de 2018 (foja 725 a 734 del expediente administrativo correspondiente).

Que mediante **MEMORANDO-DEIA-0853-0611-18**, de 06 de noviembre de 2018, se solicitó a **DIAM**, generar el polígono aprobado del EsIA, y sobre el mismo el alineamiento pluvial a incluir en la modificación (foja 736 del expediente administrativo correspondiente).

Que mediante **MEMORANDO-DIAM-1214-2018**, recibido el 16 de noviembre de 2018, **DIAM**, generó un polígono de **24 ha + 9, 838.85 m²**, y el alineamiento pluvial 1 posee una longitud de 273.057 metros y pluvial 2 con una longitud de 243.485 metros; sin embargo, en el mapa ambos alineamientos se identifican fuera del polígono aprobado (foja 737 a 739 del expediente administrativo correspondiente).

Que mediante **MEMORANDO-DEIA-0931-3011-18**, de 30 de noviembre de 2018, se solicitó a **DIAM**, generar el polígono del EsIA aprobado y sobre el mismo el alineamiento pluvial a incluir en la modificación y corregir el DATUM del polígono aprobado de NAD-27 a WGS-84 (foja 740 del expediente administrativo correspondiente).

Que mediante nota **sin número**, recibida el 7 de diciembre de 2018, el promotor solicita **corregir** el DATUM de las coordenadas del polígono aprobado, mediante Resolución DIFORA-IA-132-16 de 4 de agosto de 2016 y en el Estudio de Impacto Ambiental de referencia, dado que el mismo corresponde a DATUM WGS84 y no DATUM NAD27 (foja 741 y 742 del expediente administrativo correspondiente).

Que mediante **MEMORANDO-DIAM-1290-2018**, recibido el 10 de diciembre de 2018, **DIAM**, generó un polígono de **24 ha + 9, 831 m²**, y el alineamiento pluvial 1 posee una longitud de **273.057 m** y pluvial 2 con una longitud de **243. 48 m** (quedando dentro del polígono aprobado) y se define fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (foja 743 a 745 del expediente administrativo correspondiente).

Que la empresa LUZ BLANCA HOLDING, S.A., inscrita en el Registro Público a folio 568438, cuyo representante legal es la señora AMARILIS DEL CARMEN FRANCO SAAVEDRA, a través de apoderada legal presentó a través de memorial oposición a la solicitud de modificación en estudio la cual fue rechazada a través de Providencia DM-006-2019 de 19 de febrero de 2019 y confirmada a través de Resolución DM-0117-2019 de 10 de abril de 2019.

En virtud de lo establecido en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 975 de 23 de agosto de 2012, que modifica el artículo 20 del Decreto Ejecutivo 123 de 14 de agosto de 2009, se procedió a realizar una revisión de la solicitud de modificación para determinar si los cambios implican impactos ambientales que excedan la norma ambiental que los regula o que no hayan sido contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado. Además de evaluar si la modificación propuesta por sí sola constituye una nueva obra o actividad contenida en la lista taxativa.

Que a través de informe técnico de 15 de abril de 2019, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental señala que de acuerdo a la solicitud de modificación presentada, no se identifican nuevos impactos negativos y se eliminan los impactos, medidas de mitigación y condiciones referentes a la exclusión del desvío de la quebrada Aguas Blancas (Aguas Claras) y se mantiene el resto de impactos y medidas de mitigación contemplados en el Plan de Manejo Ambiental, por lo que dan continuidad a la viabilidad ambiental.

Que luego de efectuar la revisión integral de la solicitud de modificación presentada al Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, aprobado, correspondiente al proyecto denominado **AGRO PLAYA BLANCA FASE II**, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente, a través del referido Informe Técnico que consta en el expediente correspondiente, recomienda su aprobación, fundamentándose en que la mencionada solicitud de modificación al Estudio de Impacto Ambiental aprobado, cumple con los requisitos dispuestos en el Decreto Ejecutivo No. 123 del 14 de agosto de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 975 de 23 de



agosto del 2012, y que la modificación propuesta no constituye una nueva obra o actividad contenida en la lista taxativa, mediante Resolución **DIEORA IA-132-16**, del 04 de agosto de 2016.

RE S U E L V E:

Artículo 1. APROBAR la solicitud de modificación del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, denominado **AGRO PLAYA BLANCA FASE II**, promovido por la sociedad **AGRO PLAYA BLANCA S.A.**, y modificar el DATUM, que aparece en la Resolución **DIEORA-IA-132-16** de 4 de agosto de 2016 y en el Estudio de Impacto Ambiental de referencia, dado que las mismas corresponden a DATUM WGS84 y no a DATUM NAD 27 aprobado mediante la referida resolución.

Artículo 2. MANTENER en todas sus partes, el resto del contenido de la Resolución **DIEORA IA-132-16**, del 04 de agosto de 2016.

Artículo 3. ADVERTIR al promotor que deberá presentar ante el Ministerio de Ambiente, cualquier modificación, adición o cambio de las técnicas, actividad, obra o proyecto, y/o medidas que no estén contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, con el fin de verificar si se precisa la aplicación de las normas establecidas y contempladas en el Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009; modificado por el Decreto Ejecutivo No. 975 de 23 de agosto del 2012.

Artículo 4. NOTIFICAR a la sociedad **AGRO PLAYA BLANCA S.A.**, del contenido de la presente resolución.

Artículo 5. ADVERTIR a la sociedad **AGRO PLAYA BLANCA S.A.**, que podrá interponer Recurso de Reconsideración, en contra a la presente Resolución dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su notificación.


FUNDAMENTO DE DERECHO. Texto Único de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, Ley 8 de 25 de marzo de 2015, Decreto Ejecutivo No. 123, de 14 de agosto de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 155 del 05 de agosto de 2011, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 975 del 23 de agosto de 2012 y demás normas complementarias y concordantes.

Dada en la ciudad de Panamá, a los diez (10) días, del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019).



NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,


EMILIO SEMPRIS
Ministro de Ambiente




MALÚ RAMOS
Directora de Evaluación de Impacto Ambiental.

MIAMBIENTE

Hoy 13 de mayo de 2019
Siendo las 11:32 de la tarde
notifique personalmente a Aixa
Yahaira Noriega de la presente
documentación Resol. de Modificación
 
Notificador Notificado

