DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VIA ATALAYA - MARIATO - QUEBRO - LAS FLORES Y EL MEJORAMIENTO DEL RAMAL A VARADERO. PROVINCIA DE VERAGUAS.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**CONTRATO AL-1-34-19 "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REHABILITACION DE LA VIA ATALAYA - MARIATO - QUEBRO - LAS FLORES Y MEJORAMIENTO DEL RAMAL A VARADERO"**	**1827 días**	**vie 29/11/19**	**jue 28/11/24**	
2		ORDEN DE PROCEDER	0 días	vie 29/11/19	vie 29/11/19	
3		CONSTRUCCION	730 días	vie 29/11/19	sáb 27/11/21	2
4		MANTENIMIENTO	1097 días	dom 28/11/2	jue 28/11/24	3
5		FIN DE CONTRATO	0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24	4
6		**CANTERA MARIATO-ATALAYA**	**1445 días**	**mar 1/12/20**	**jue 14/11/24**	
7		LIMPIEZA Y DESBROCE	90 días	mar 1/12/20	dom 28/2/21	
8		MOVILIZACION	30 días	lun 1/3/21	mar 30/3/21	7
9		DESCAPOTE Y LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL	30 días	mié 31/3/21	jue 29/4/21	8
10		PERFORACION Y VOLADURAS DE LIMPIEZA	15 días	vie 30/4/21	vie 14/5/21	9
11		PERIODO DE VOLADURAS (2 POR MES)	1150 días	lun 14/6/21	mar 6/8/24	10FC+30 días
12		EXTRACCION	1180 días	jue 24/6/21	dom 15/9/24	11CC+10 días
13		DESMOVILIZACION	30 días	lun 16/9/24	mar 15/10/2	12
14		ADECUACION DE TERRENO	60 días	lun 16/9/24	jue 14/11/24	13CC

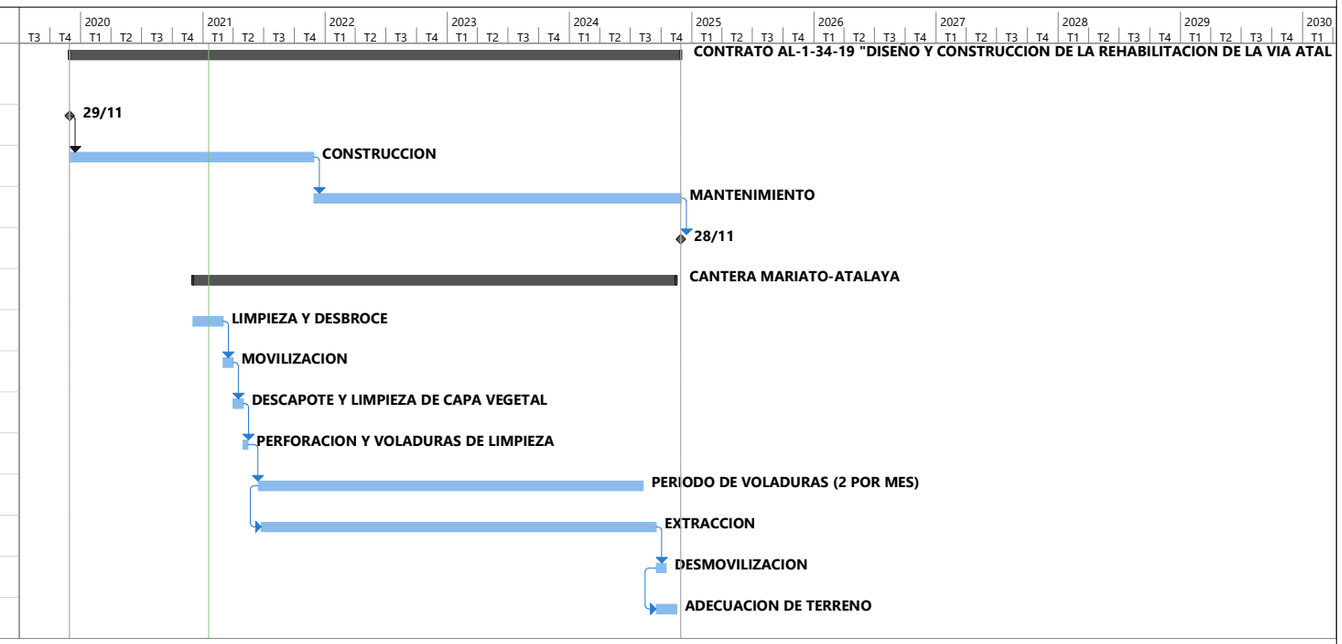

Proyecto: cRONOGRAMA CANT
Fecha: lun 18/1/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual			
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite					
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso					
