Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede
1							
2			**Proyecto**	**80 días**	**lun 08/03/20**	**jue 10/22/20**	
3			***HERRERA***	**80 días**	**lun 08/03/20**	**jue 10/22/20**	
4			***PUENTE SOBRE EL RÍO ESQUIGUITA (PEÑAS PIETRAS)***	**80 días**	**lun 08/03/20**	**jue 10/22/20**	
5			LIMPIEZA Y DESARRAIGUE / DESMONTE	2 días	lun 08/03/20	mié 08/05/20	
6			EXCAVACIÓN	9 días	mié 08/05/20	vie 08/14/20	5
7			EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS	3 días	vie 08/14/20	lun 08/17/20	6
8			CANALES O CUNETAS PAVIMENTADAS	3 días	lun 10/26/20	jue 10/29/20	11
9			ESTRUCTURAS DE HORMIGON	30 días	lun 08/17/20	mié 09/16/20	7
10			ZAMPEADO	30 días	mié 10/21/20	vie 11/20/20	16
11			MATERIAL SELECTO O SUBBASE	3 días	vie 10/23/20	lun 10/26/20	18
12			BASE DE AGREGADO PETREO	3 días	lun 10/26/20	jue 10/29/20	11
13			RIEGO DE IMPRIMACION	3 días	jue 10/29/20	dom 11/01/20	12
14			TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO	3 días	dom 11/01/20	mié 11/04/20	13
15			BARRERAS DE PROTECCION O RESGUARDO	4 días	mié 11/04/20	dom 11/08/20	14
16			PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND	6 días	jue 10/15/20	mié 10/21/20	20
17			LINEAS Y MARCAS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO	2 días	dom 11/08/20	mar 11/10/20	15
18			CONFORMACION DE CALZADA	2 días	mié 10/21/20	vie 10/23/20	16
19			TRASLADO DE PUENTE MODULAR AL SITIO DE LA OBRA	5 días	mié 09/16/20	lun 09/21/20	9
20			INSTALACION DE PUENTE MODULAR	24 días	lun 09/21/20	jue 10/15/20	19

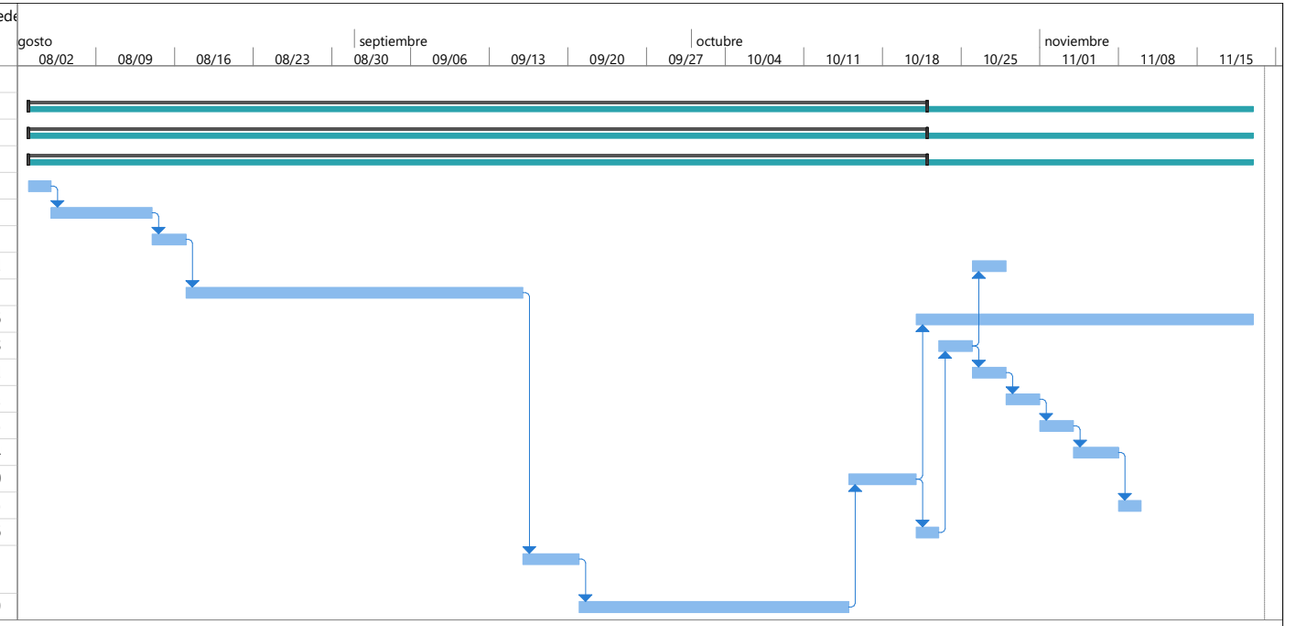

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS E INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES
GRUPO II

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
